




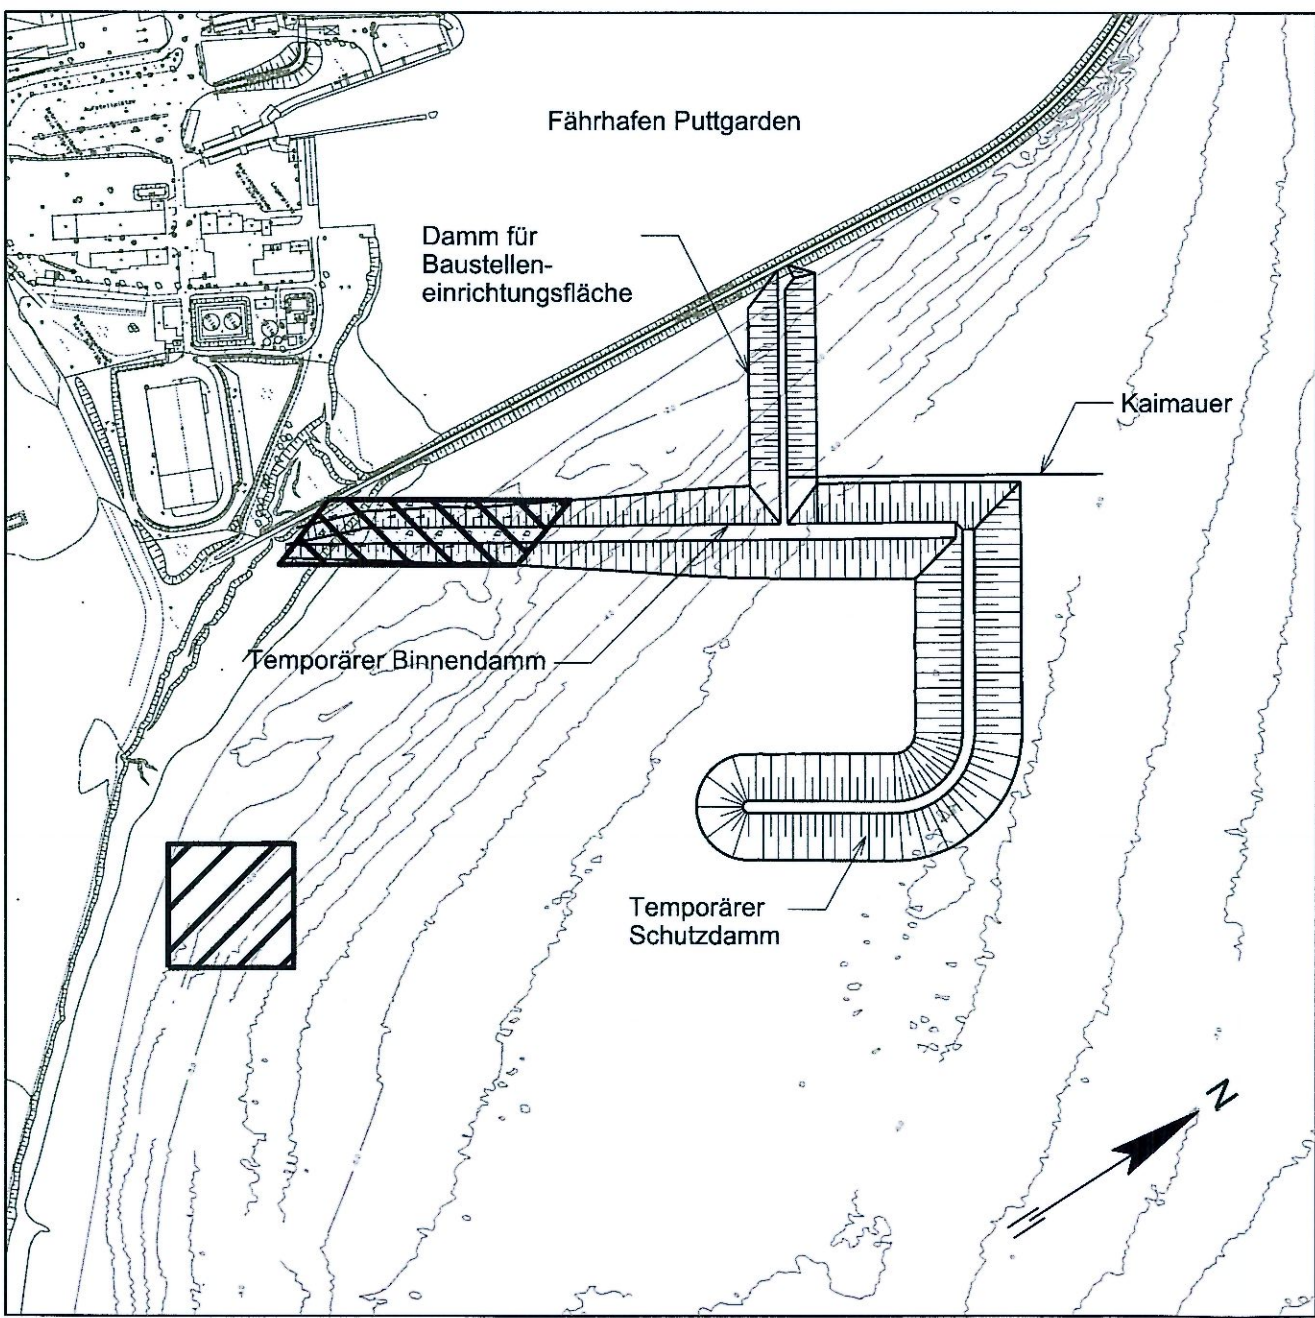


Bauphase 1
Bau temporärer Arbeitshafen, Schutzdamm, Binnendamm und Damm für Baustelleneinrichtungsfläche
(Beginn in Monat 0, siehe Anlage 27.2, Blatt 3)

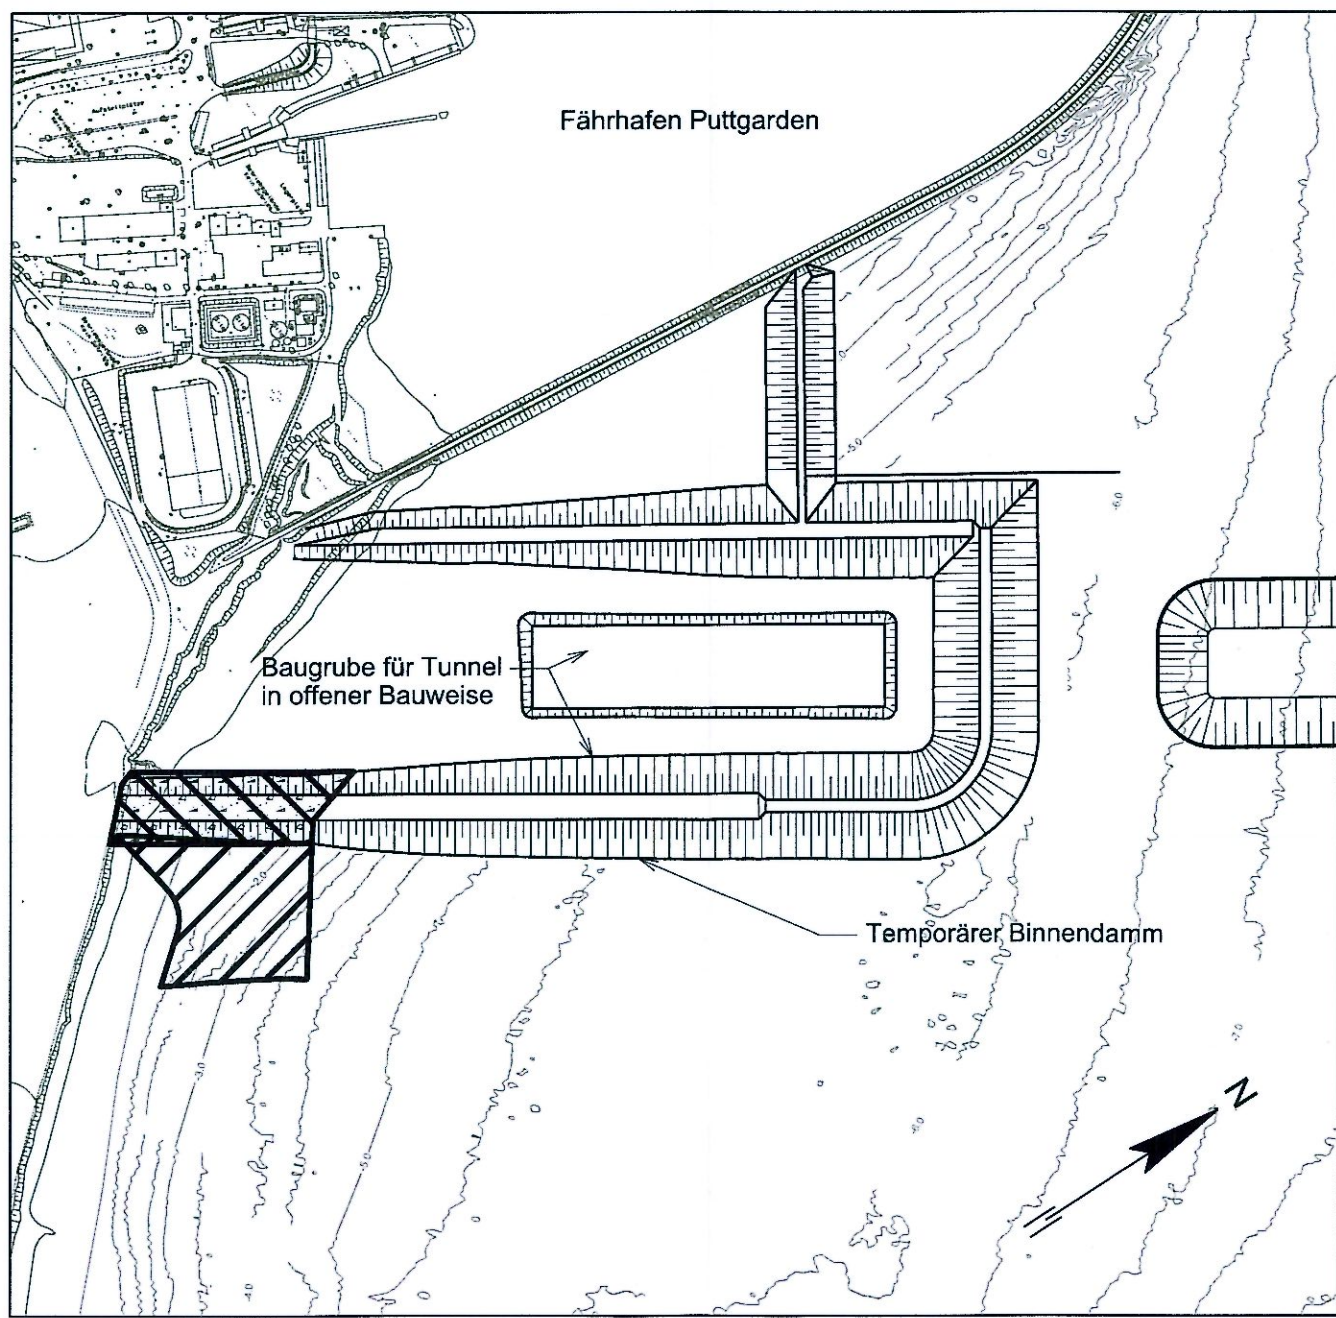


Bauphase 2
Fertigstellung Baugrube für Tunnel in offener Bauweise
(bis Monat 2)

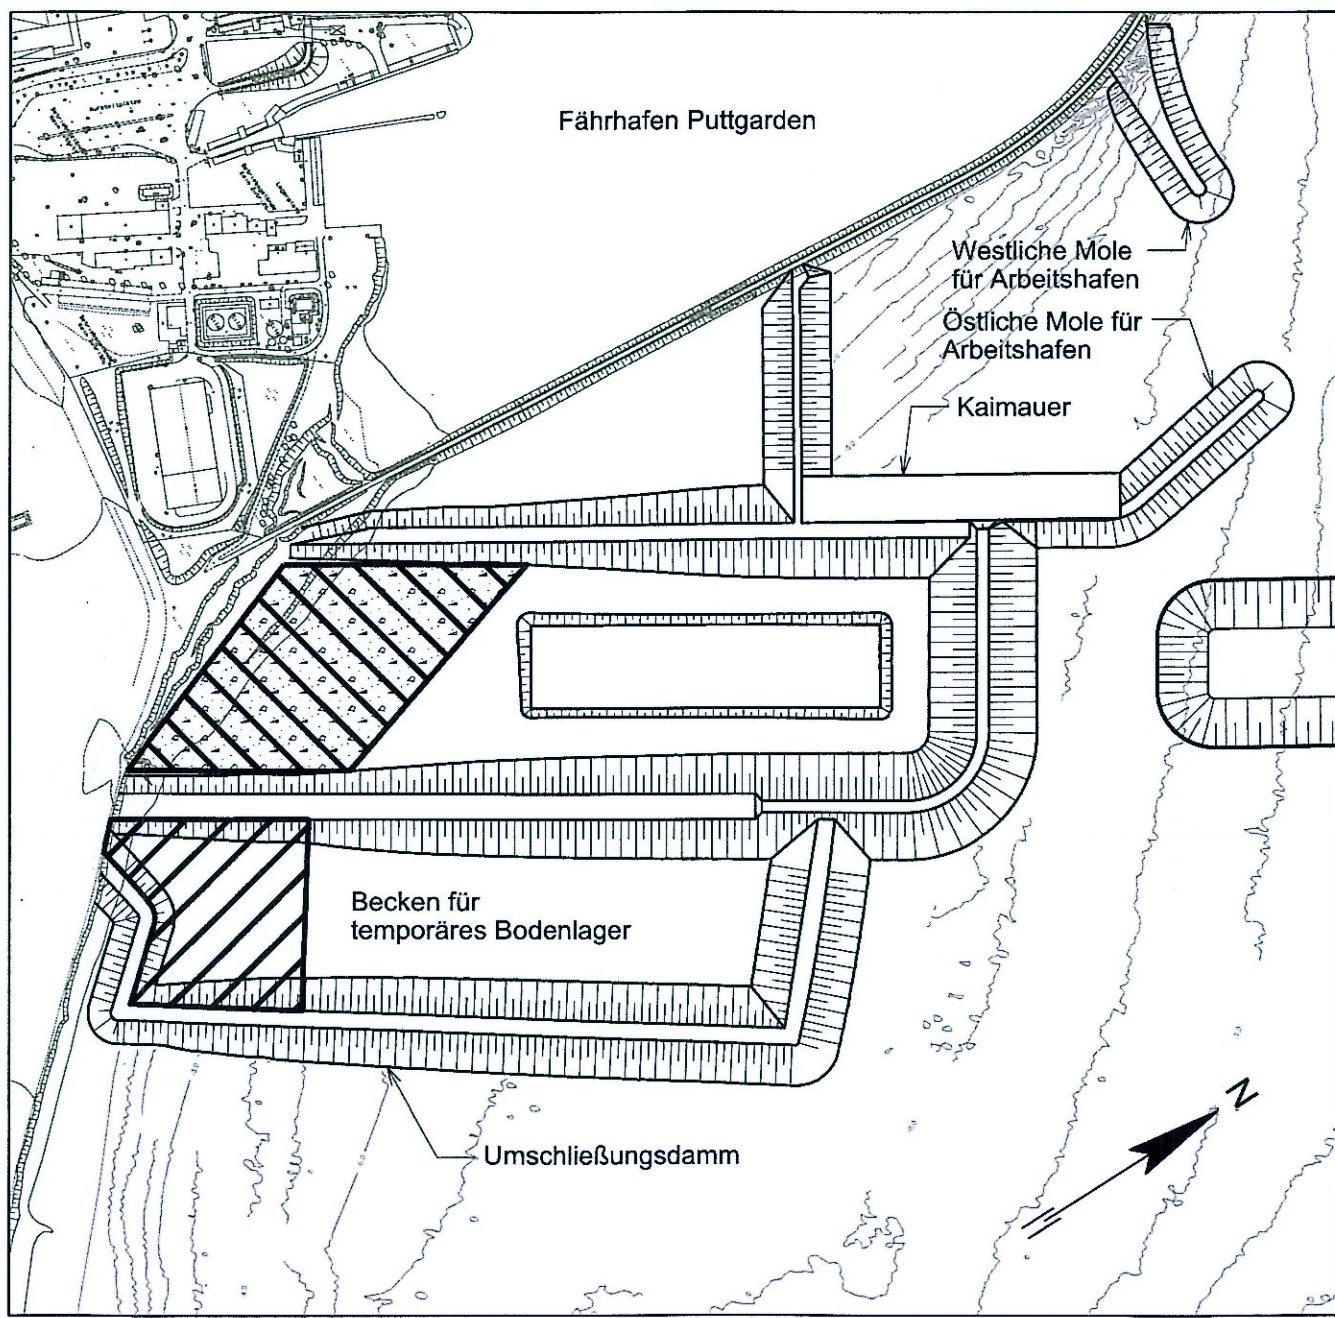


Bauphase 3
Fertigstellung der marinen Haupttätigkeiten
(bis Monat 4)

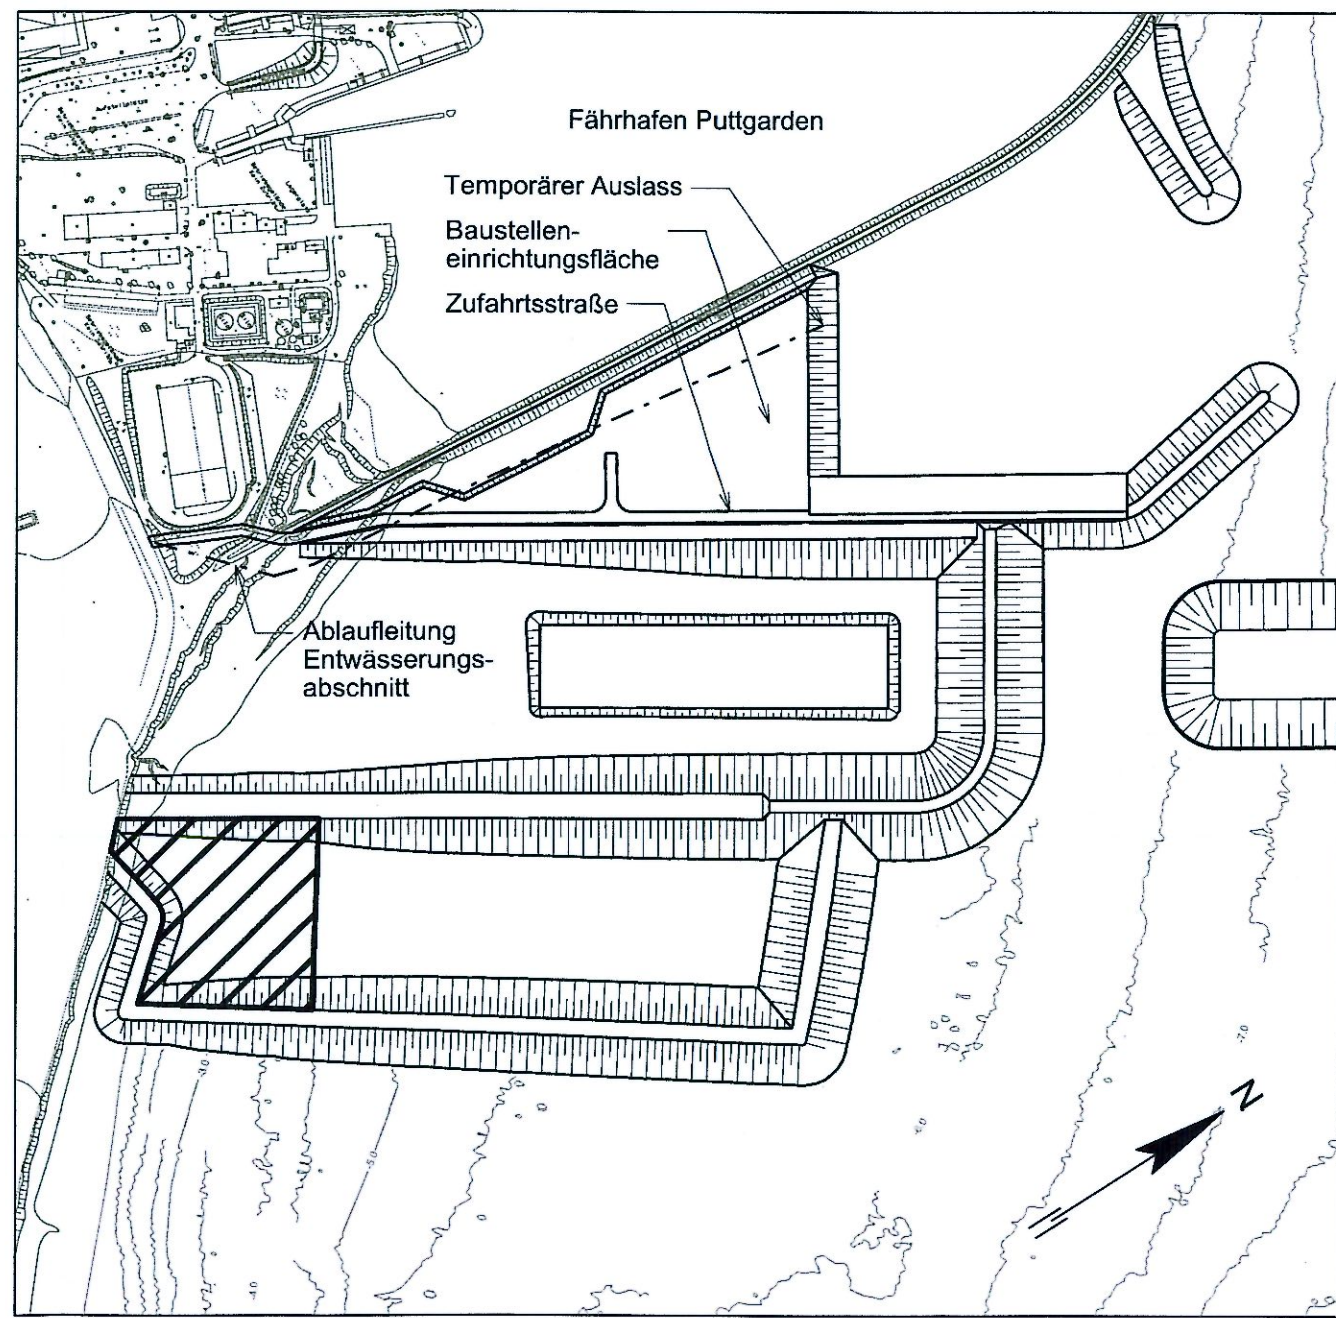


Bauphase 4
Fertigstellung Arbeitshafen
(bis Monat 8)

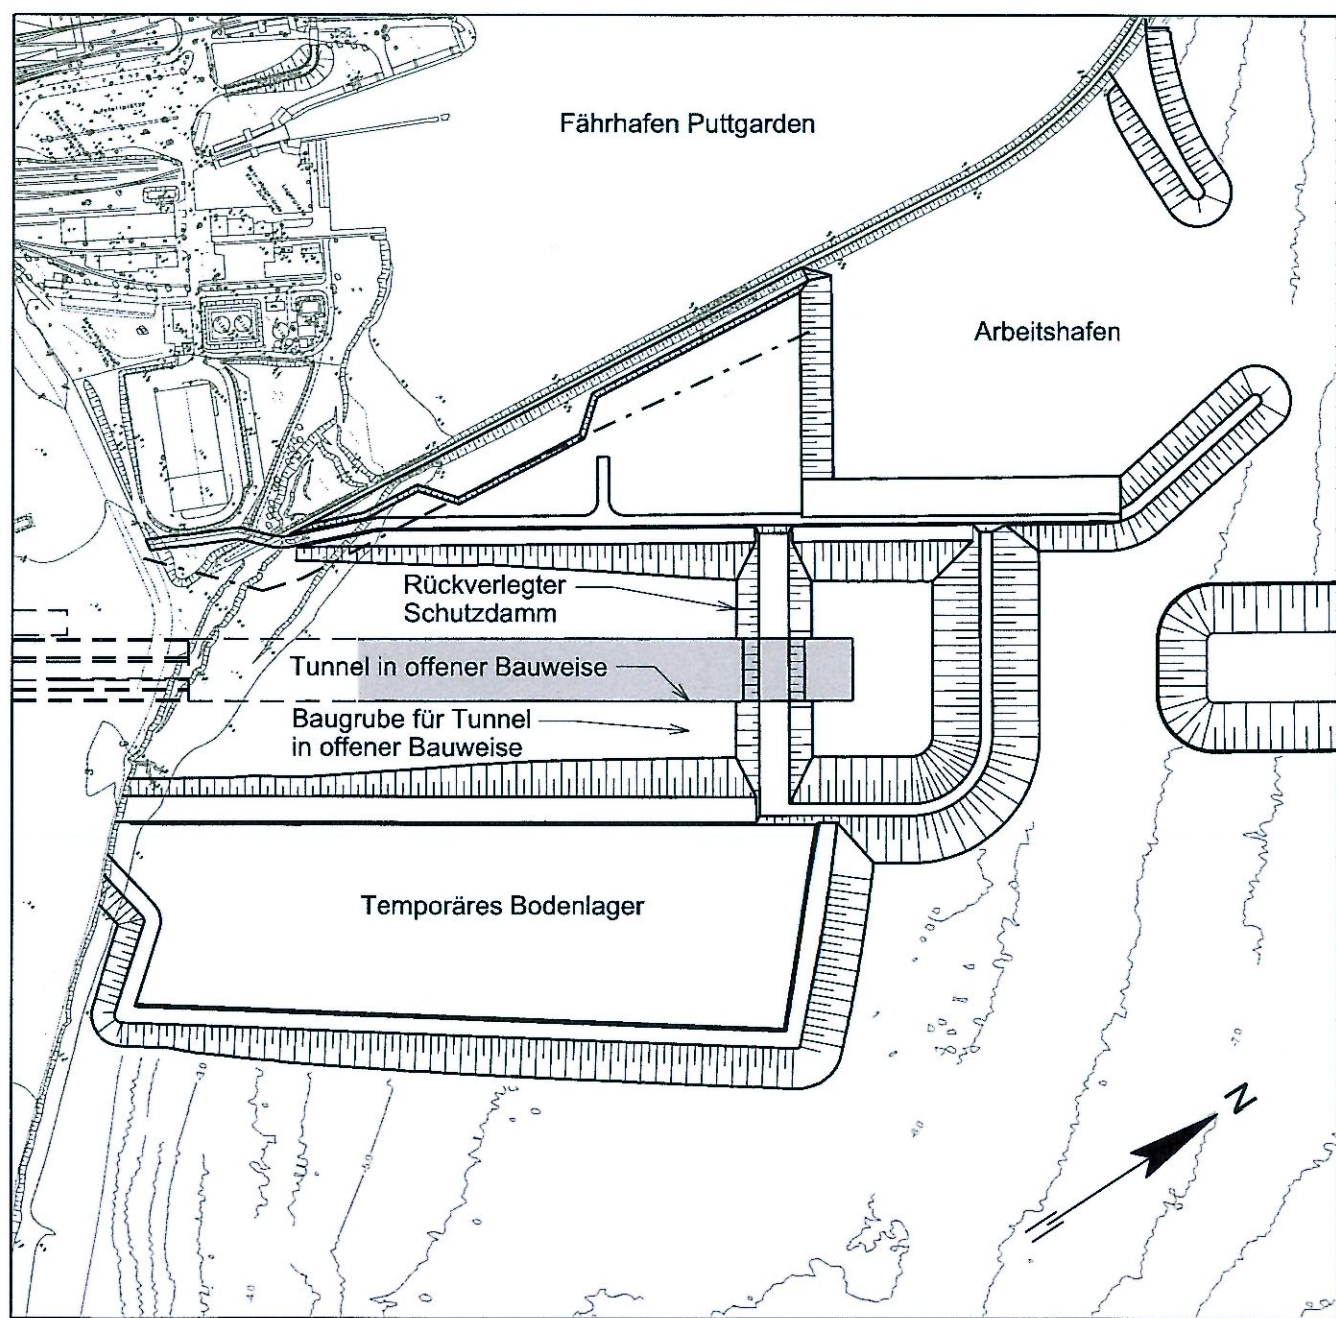


Bauphase 5
Bau Tunnel in offener Bauweise
Fertigstellung rückverlegter Schutzdamm
(bis Monat 16)

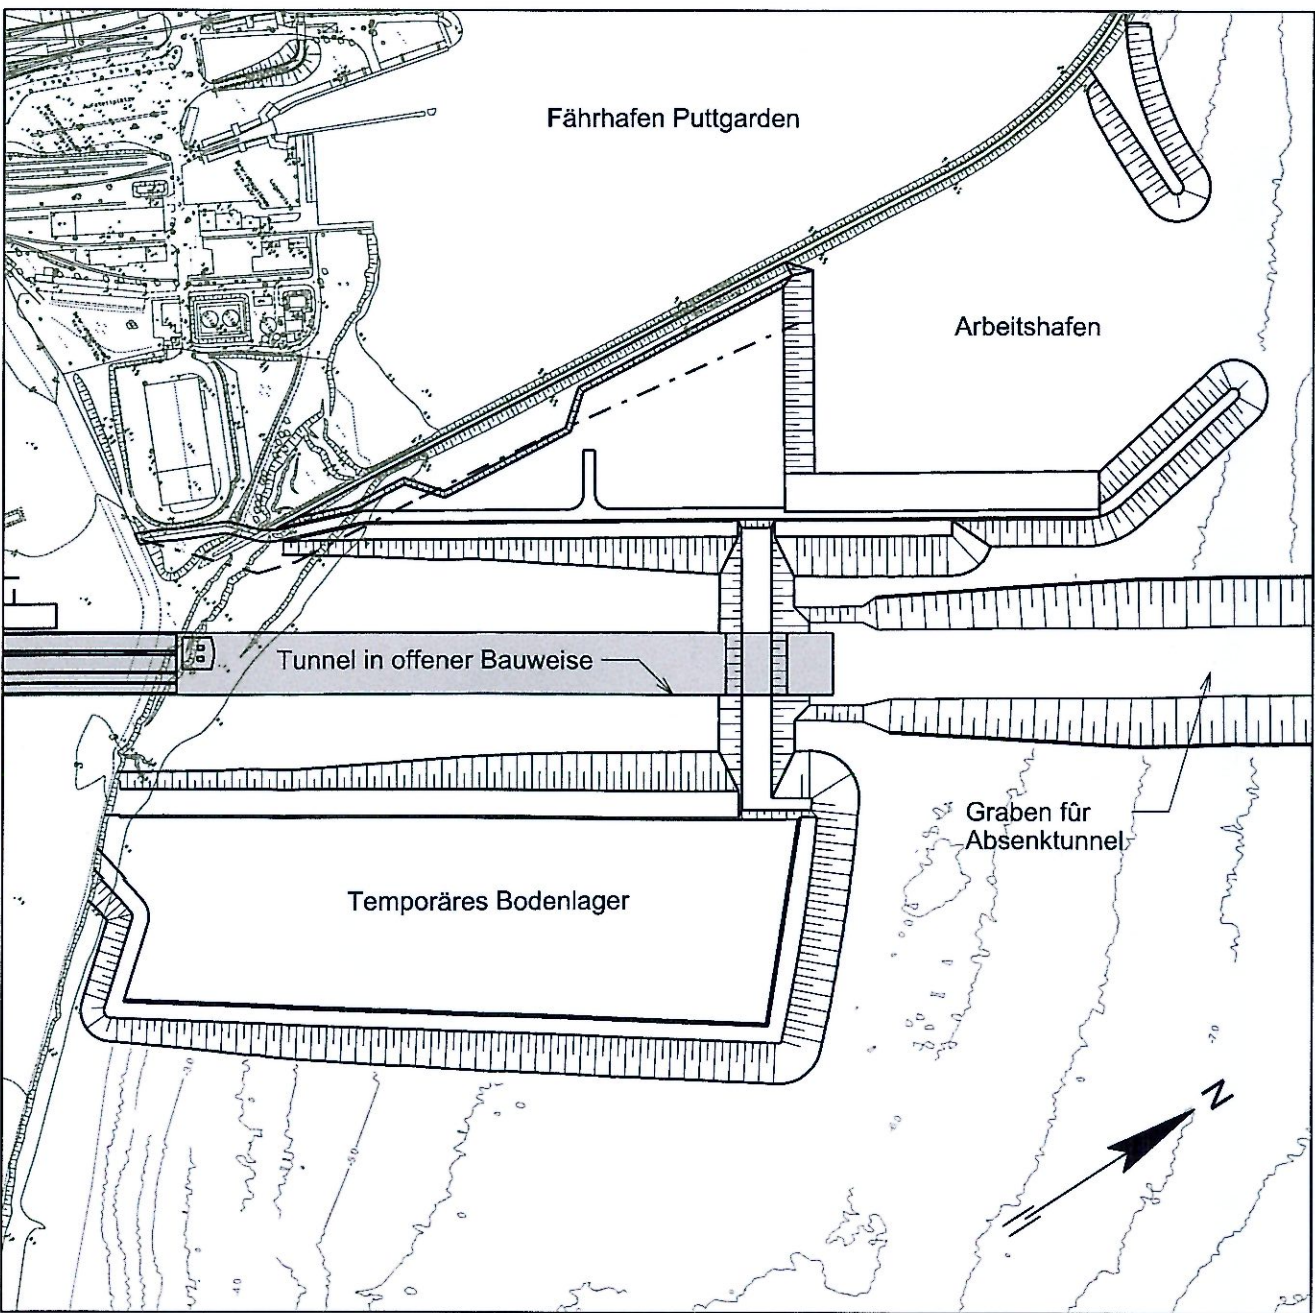


Bauphase 6
Rückbau temporärer Schutzdamm und Grabenaushub für erstes Absenktunnelelement
(bis Monat 18)

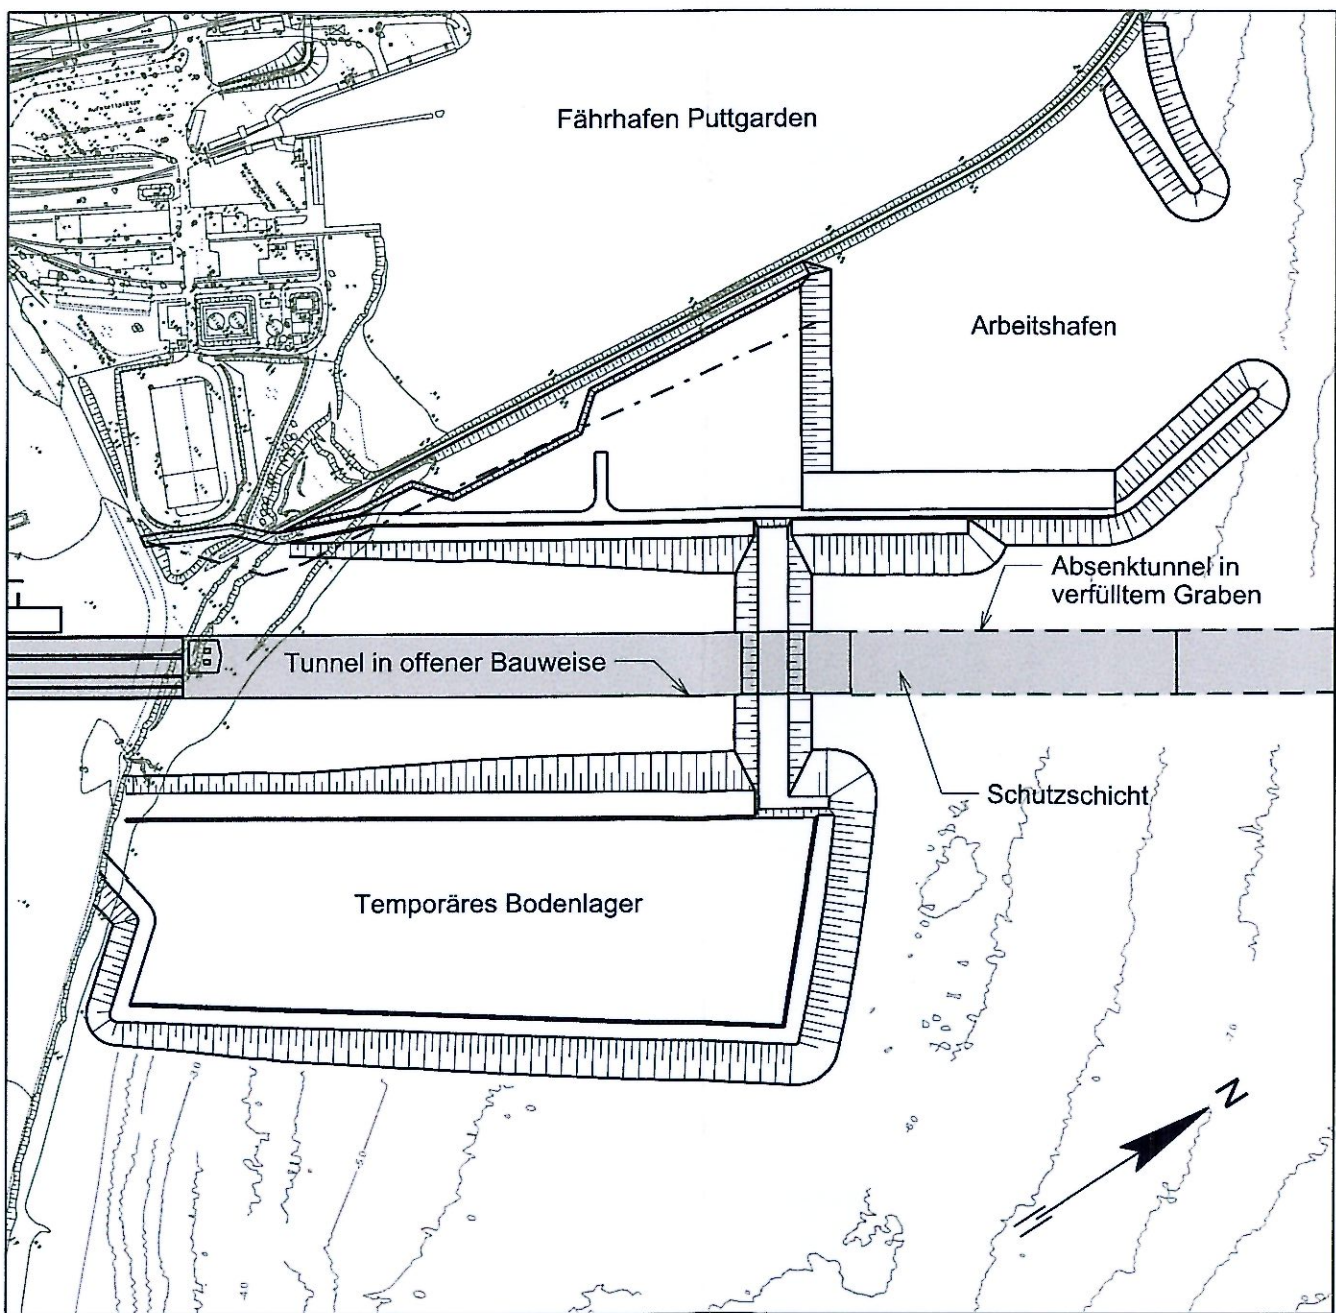


Bauphase 7
Grabenverfüllung
Fertigstellung Schutzschicht
(bis Monat 30)

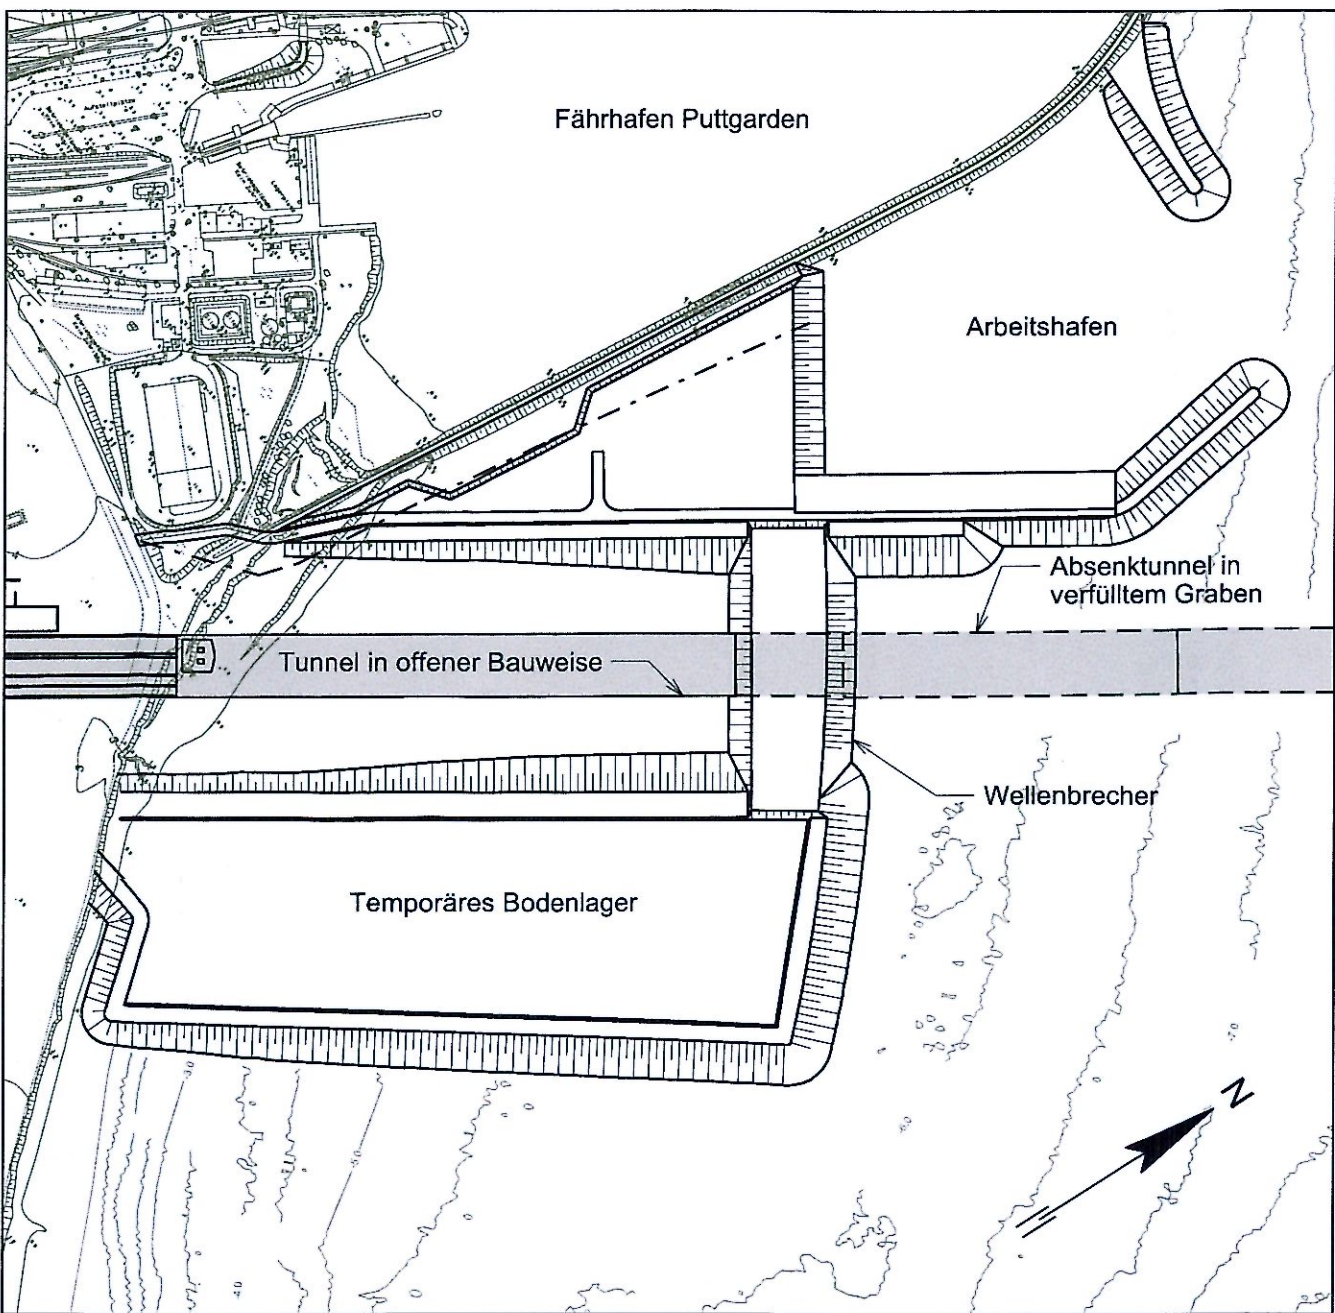

Bauphase 8
Bau Wellenbrecher vor Baugrube Tunnel in offener Bauweise

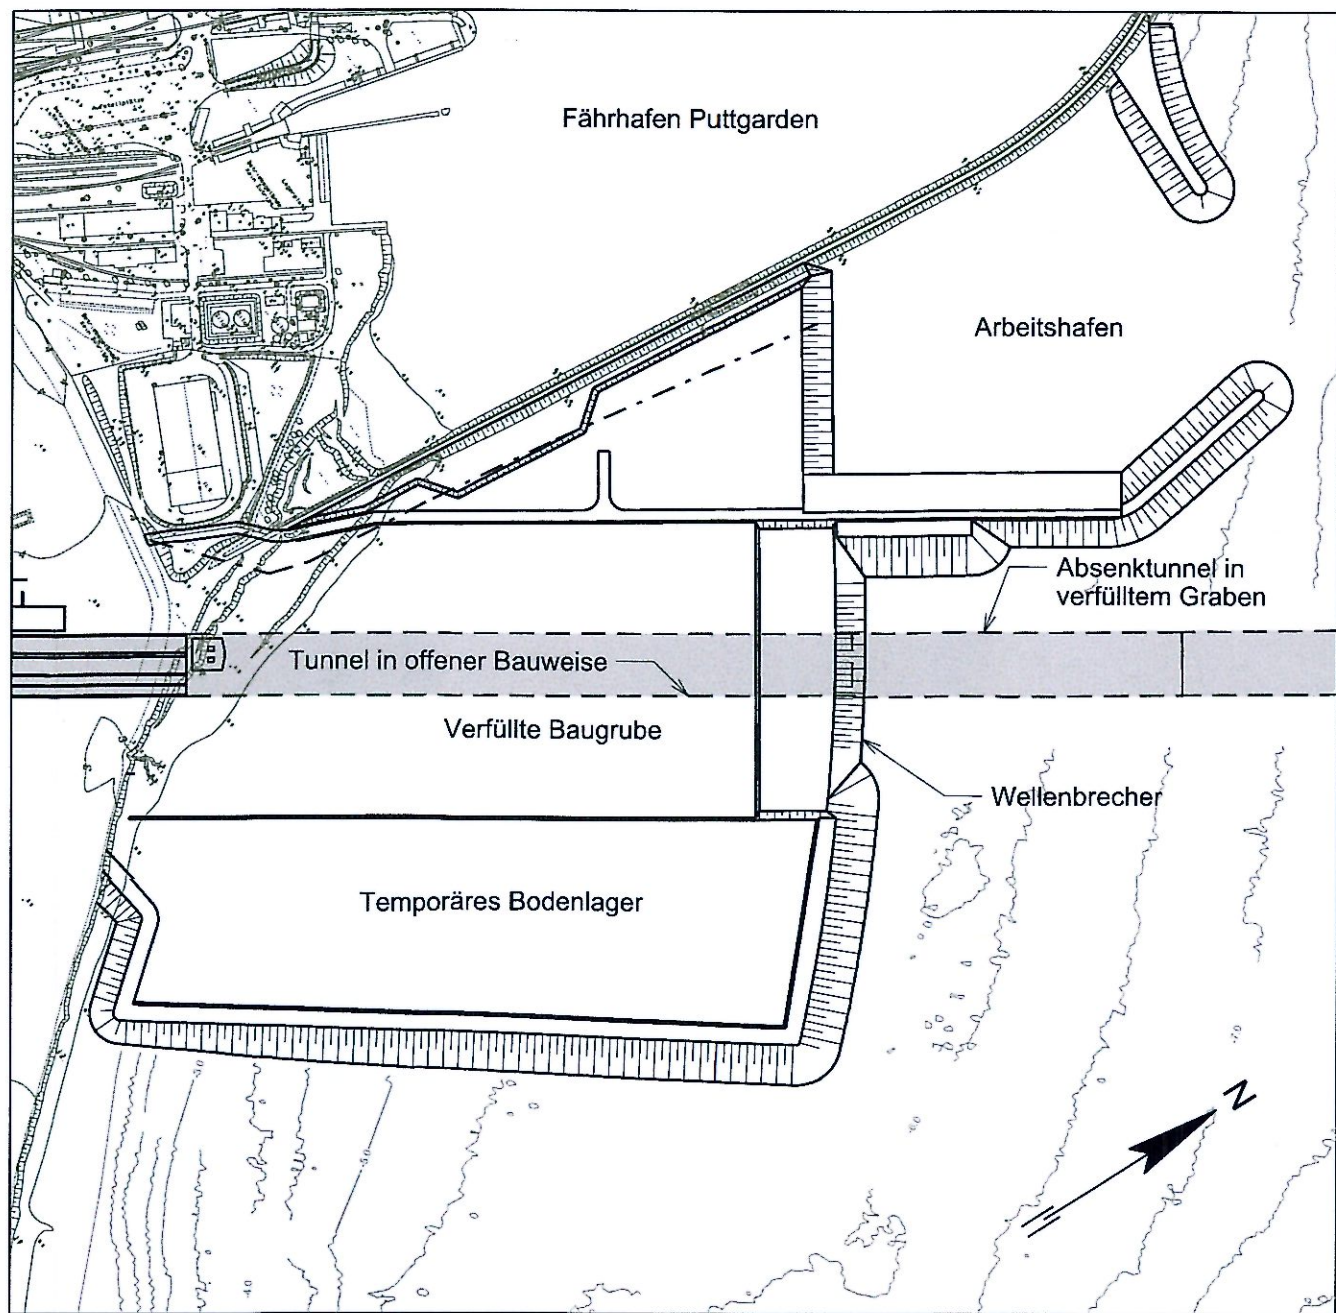

Bauphase 9
Fertigstellung Verfüllung Baugrube für Tunnel in offener Bauweise
(bis Monat 63)

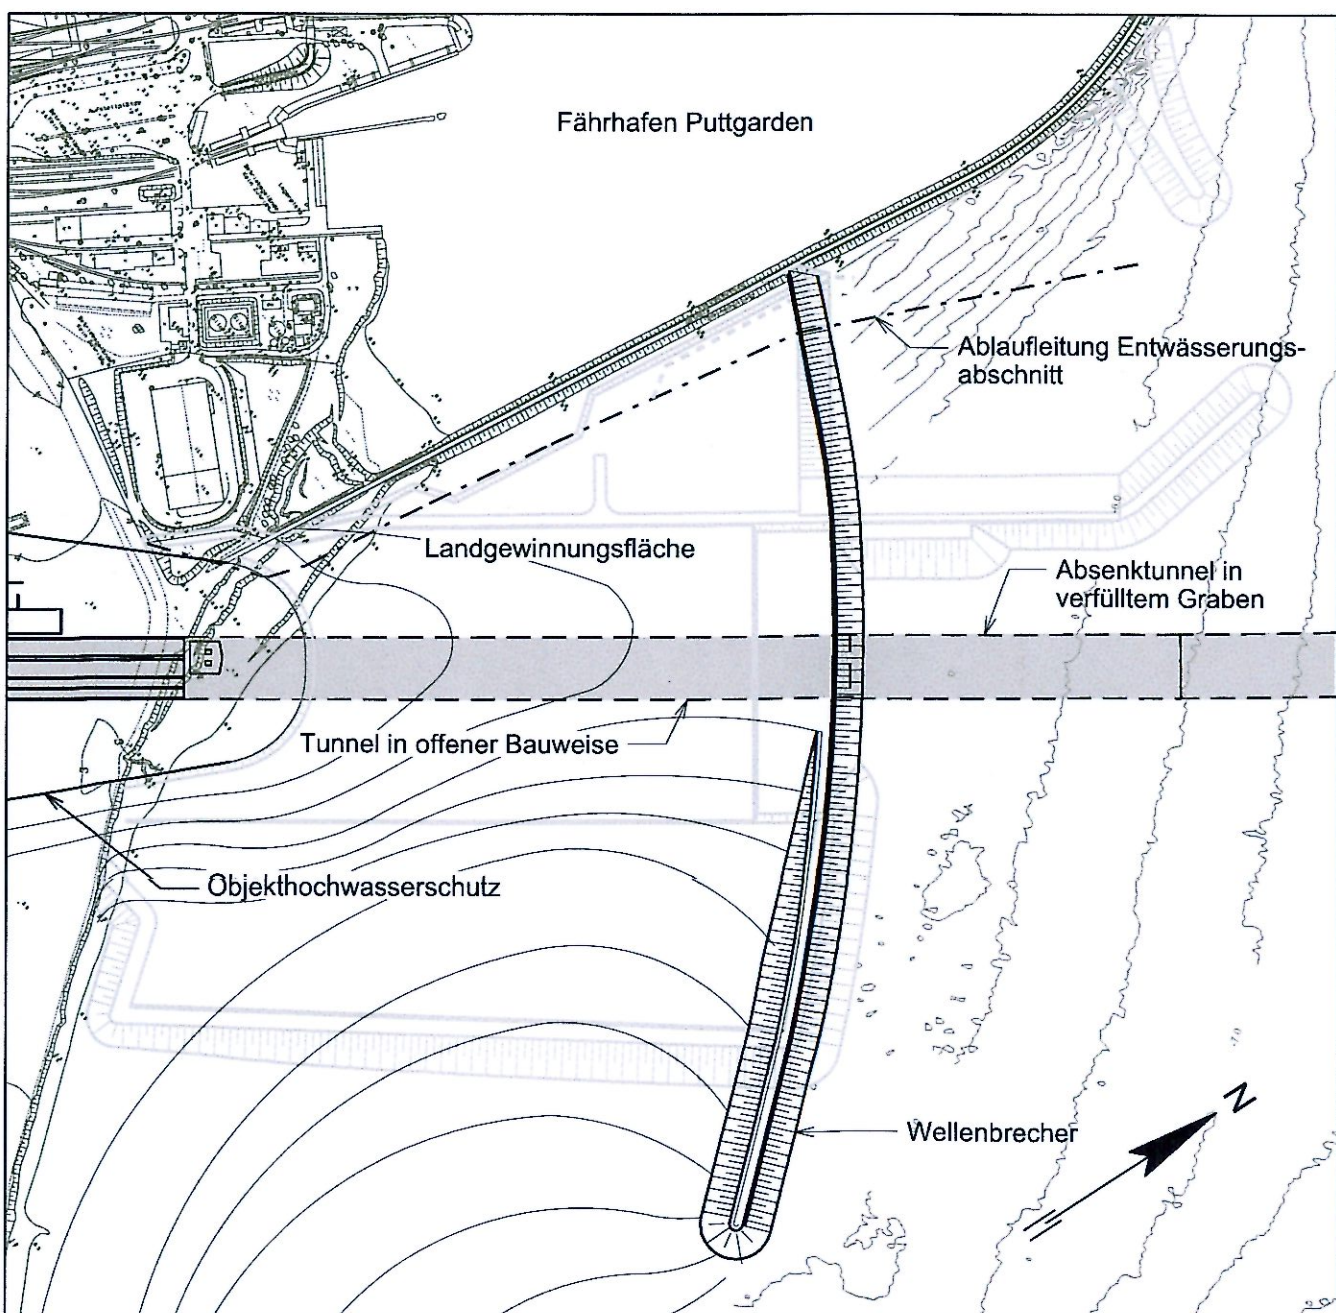

Bauphase 10
Fertigstellung Wellenbrecher und Landgewinnungsfläche
(bis Monat 75)

ZEICHENERKLÄRUNG




BEMERKUNGEN:

Höhen über NNH
Baublauf Grabenherstellung siehe Anlage 27.2, Blatt 3
Baublauf Absenkvorgang und Verfüllung siehe Anlage 27.2, Blatt 4-5

Nachrichtlich

Planfeststellungsunterlage
Anlage 27.2, Blatt 6
Lagepläne
Wasserbau
Baublauf küstennahe Flächen

DECKBLATT

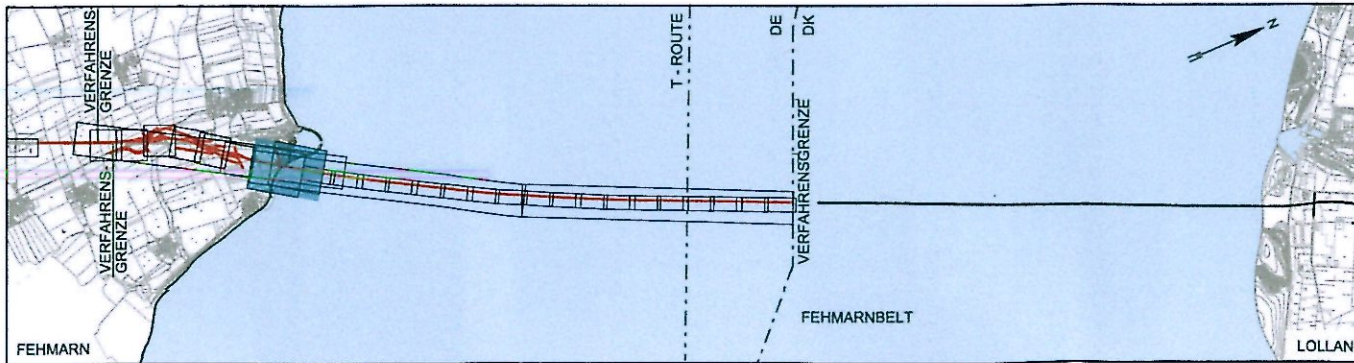

Index	Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Art der Änderung
7	2016-06-03	AHY/BXR	HIL	SKP	Datum geä.
2016-05-03					Bauphase 1: Spundwand erg.
6	2016-05-03	AHY/PVI	HIL	SKP	Nordpfeil erg., Datum geä., Phasenbezeichnung korr.
5	2016-02-29	AHY/PVI	HIL	SKP	Sandstrandlager, Bauphasen angepasst, Aktual. Bathymetrie

Fehmarnbelt Fixed Link
Plan Approval Document

Feste Fehmarnbeltquerung
Planfeststellungsunterlage

Femern
Sund & Belt

Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein
Niederlassung Lübeck

gez. Claus Dynesen, 03.06.2016
gez. Torsten Conradt, 03.06.2016

Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Rambøll
2014-02-14	HIL/HNSV	AHY	gez. S. Pedersen	ARUP
Projekt Nr.	Maßstab	Format	Index Datum	C/o
9594004	1:5000	A1 lang	2016-06-03	Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Lagepläne	Bau-km (Bahn)
Wasserbau	Bau-km (Straße)
Baublauf küstennahe Flächen	Plan-Nr. RAT-N-X11-2725
	Index 7
