




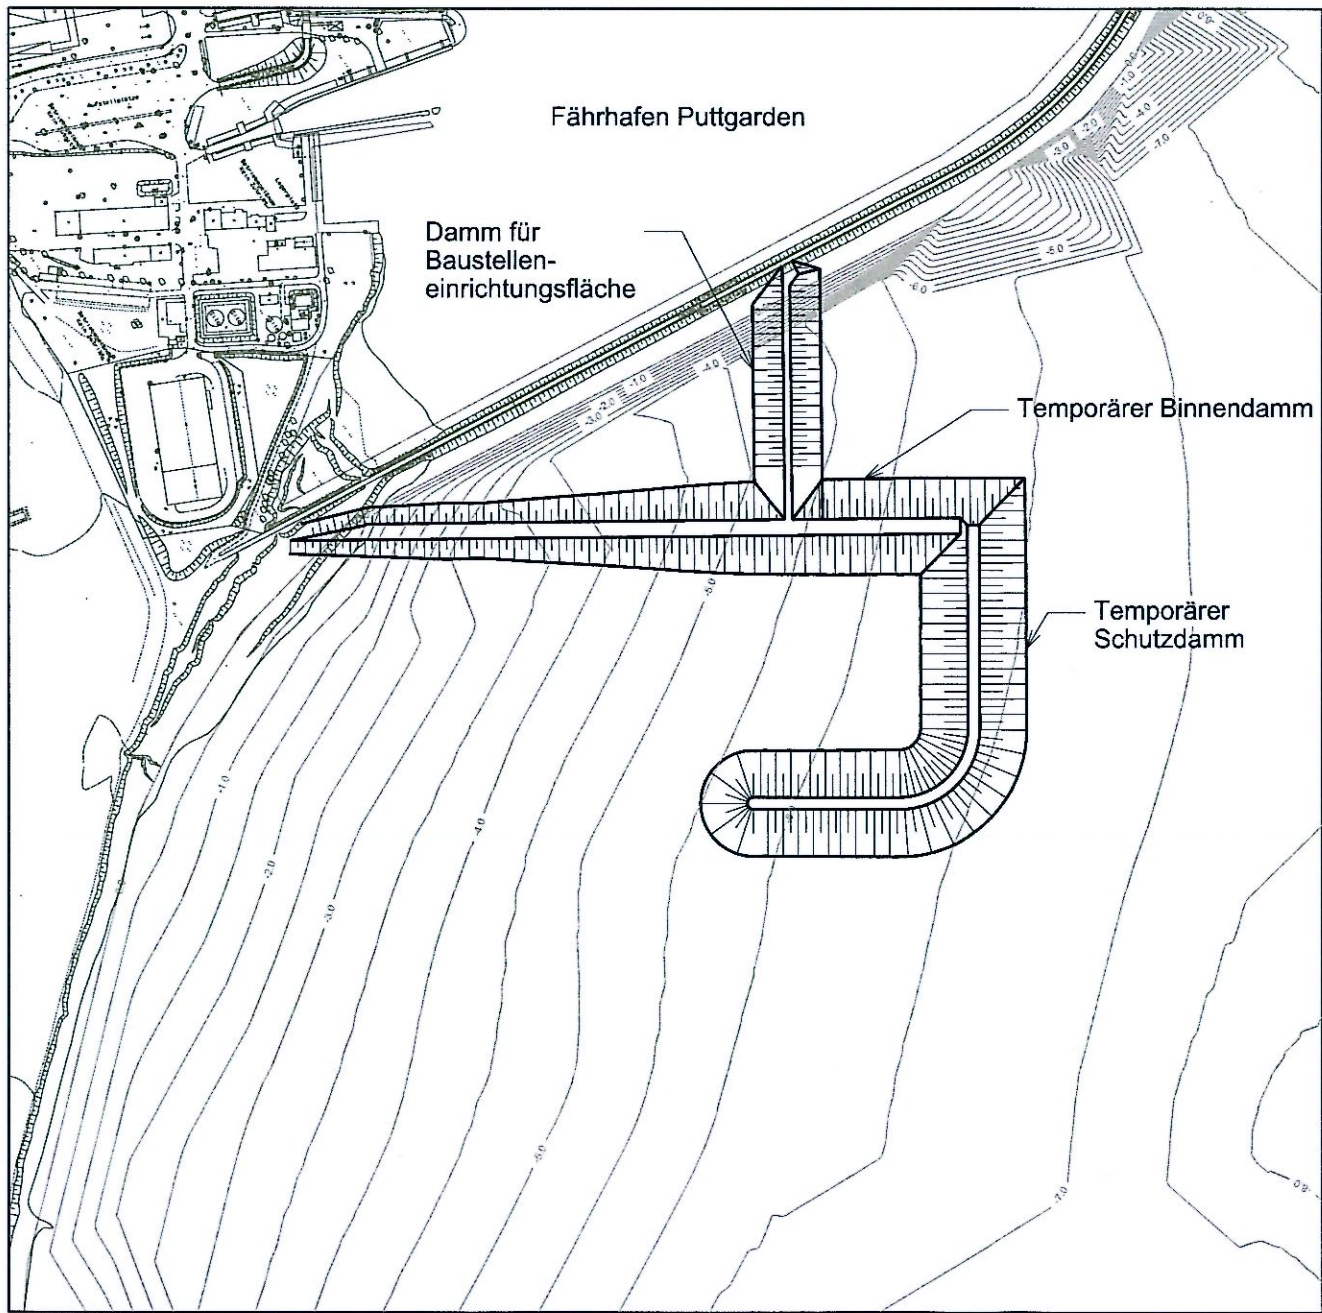


Bauphase 1
Bau temporärer Schutzdamm, Binnendamm und Damm für Baustelleneinrichtungsfläche
(Beginn in Woche 1, 26 Wochen vor Beginn Grabenaushub, siehe Anlage 27.2, Blatt 3)

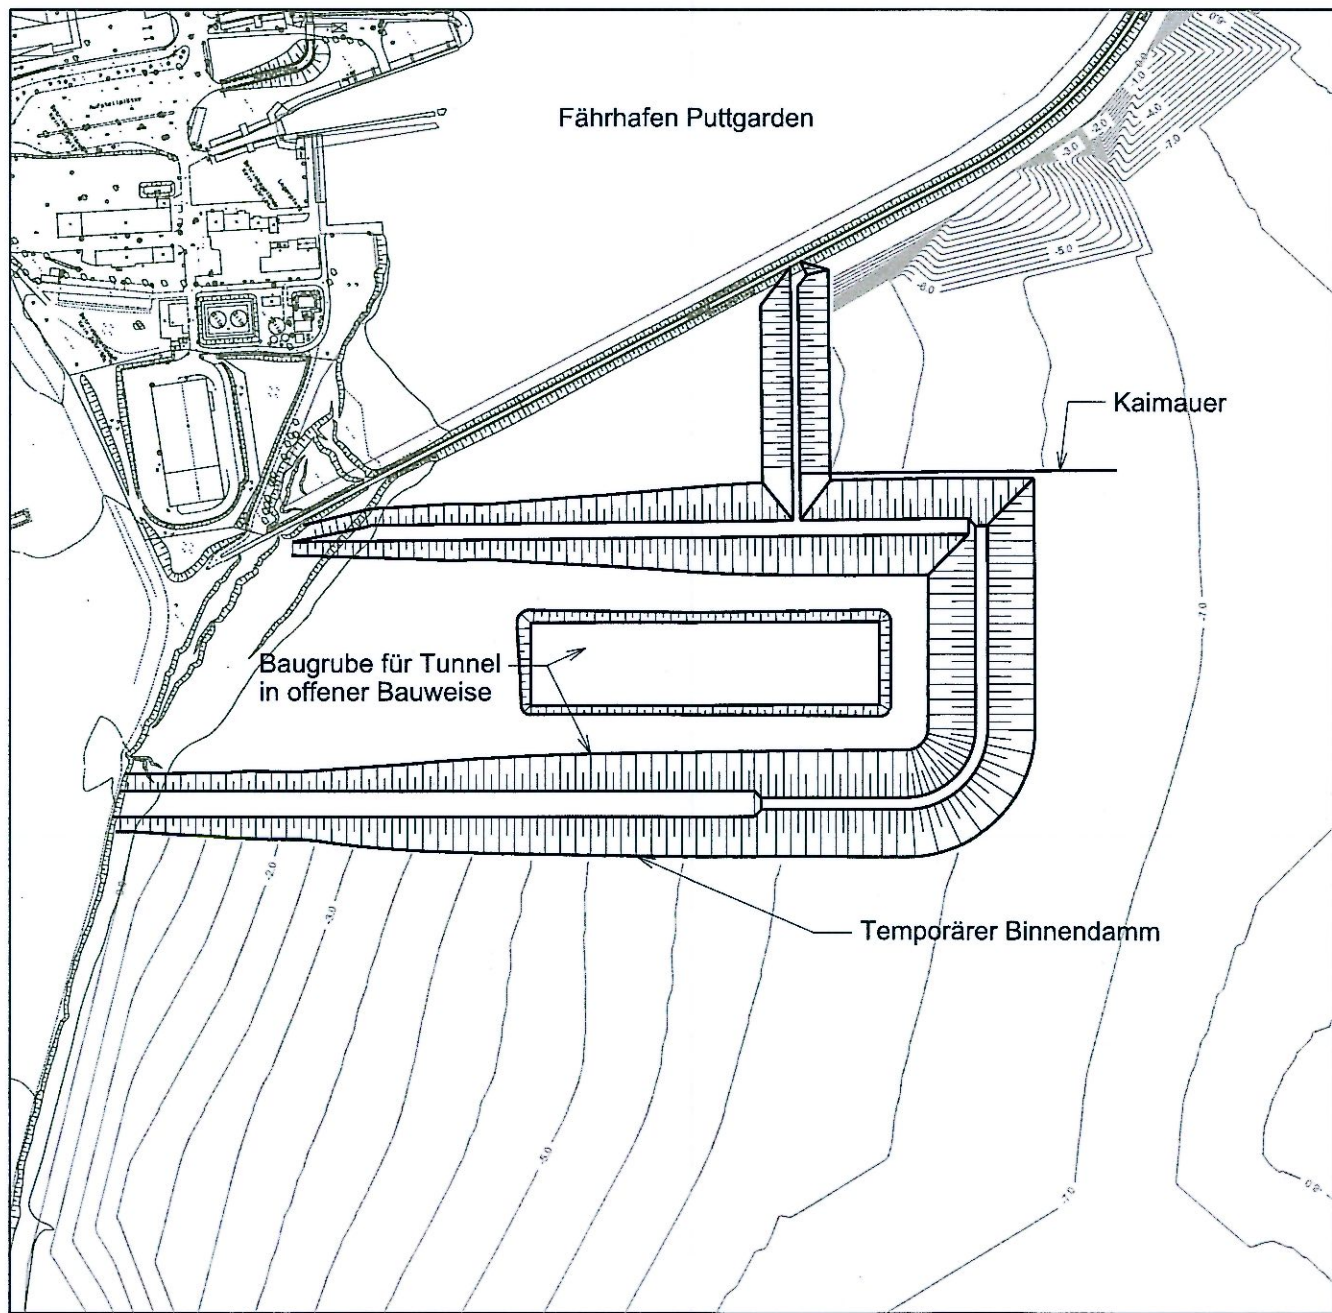


Bauphase 2
Fertigstellung Baugrube für Tunnel in offener Bauweise
(bis Woche 17)

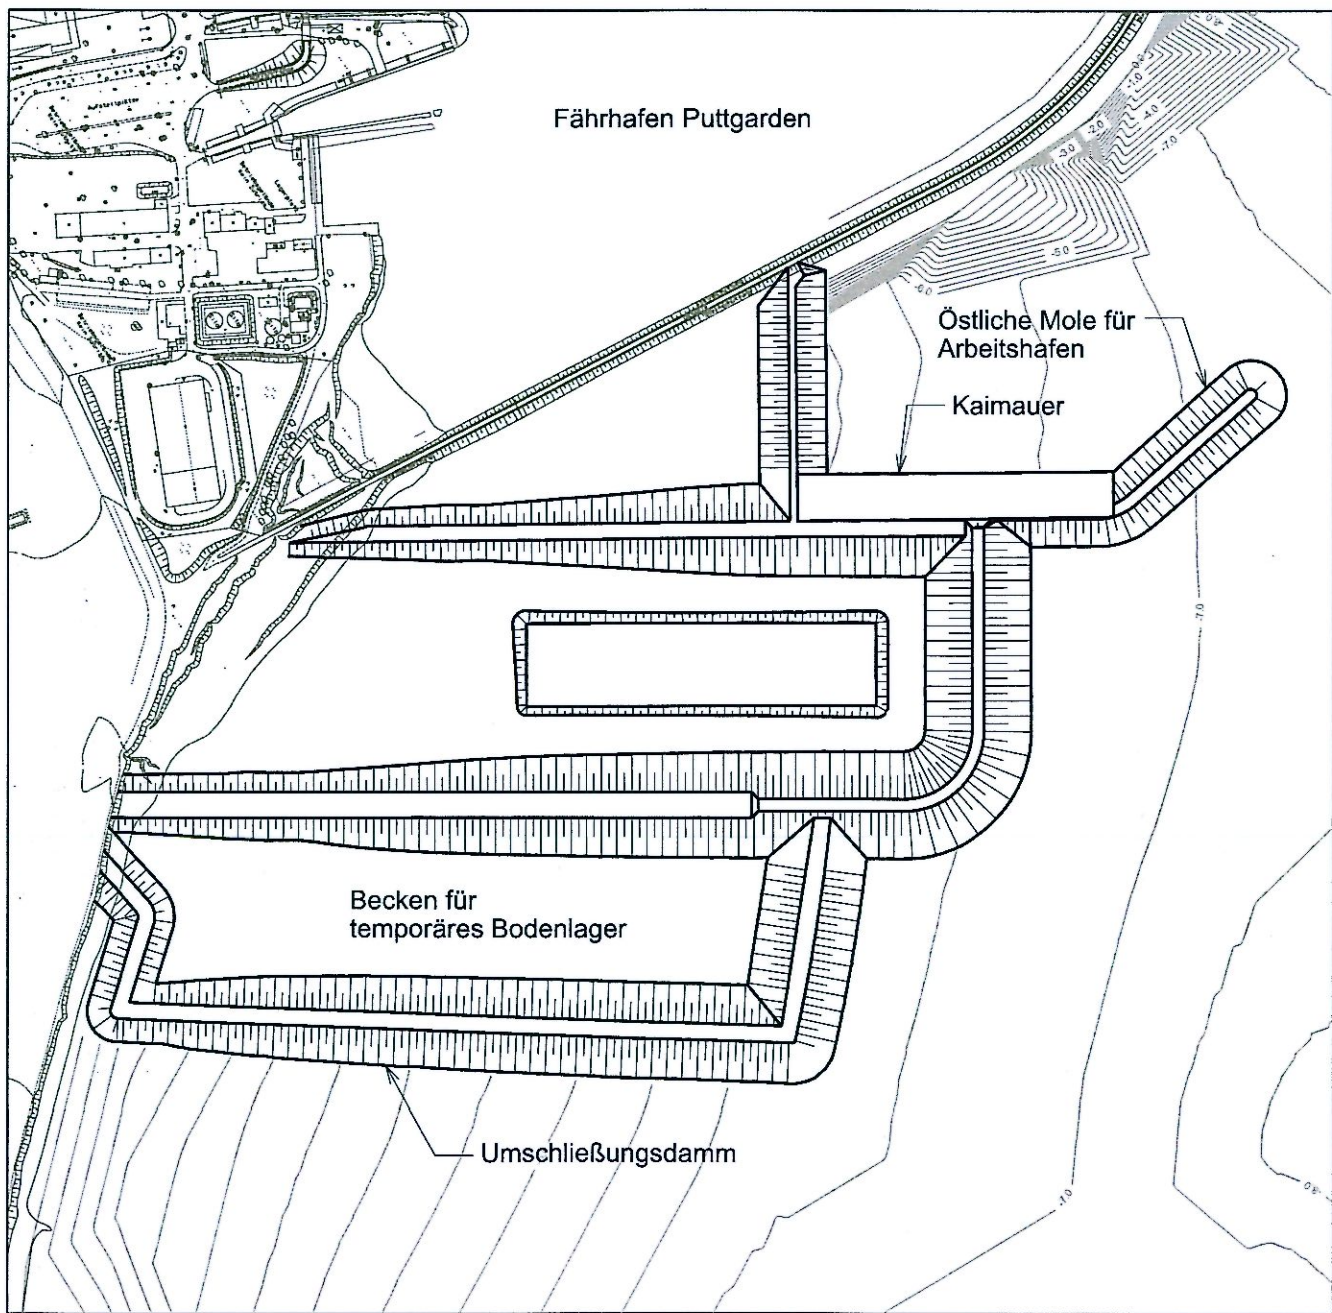


Bauphase 3
Bau Arbeitshafen

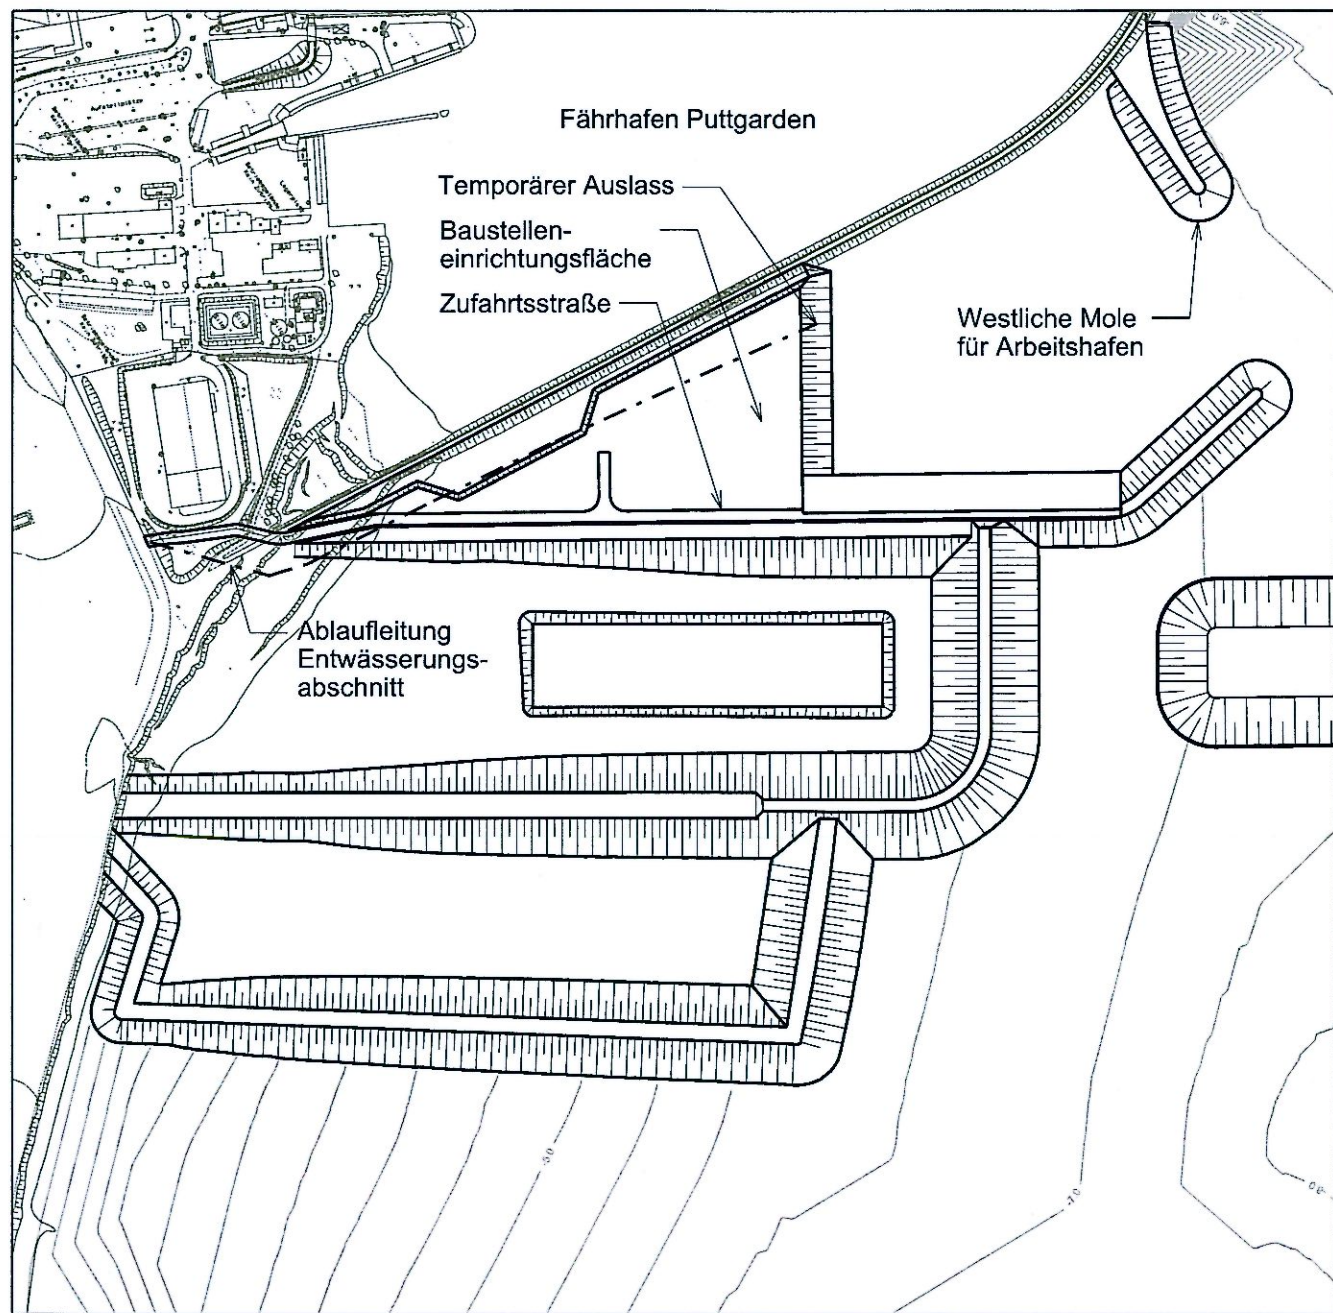

Bauphase 4
Fertigstellung Arbeitshafen (bis Woche 26)
Beginn Grabenaushub (Woche 0 in Anlage 27.2, Blatt 3)

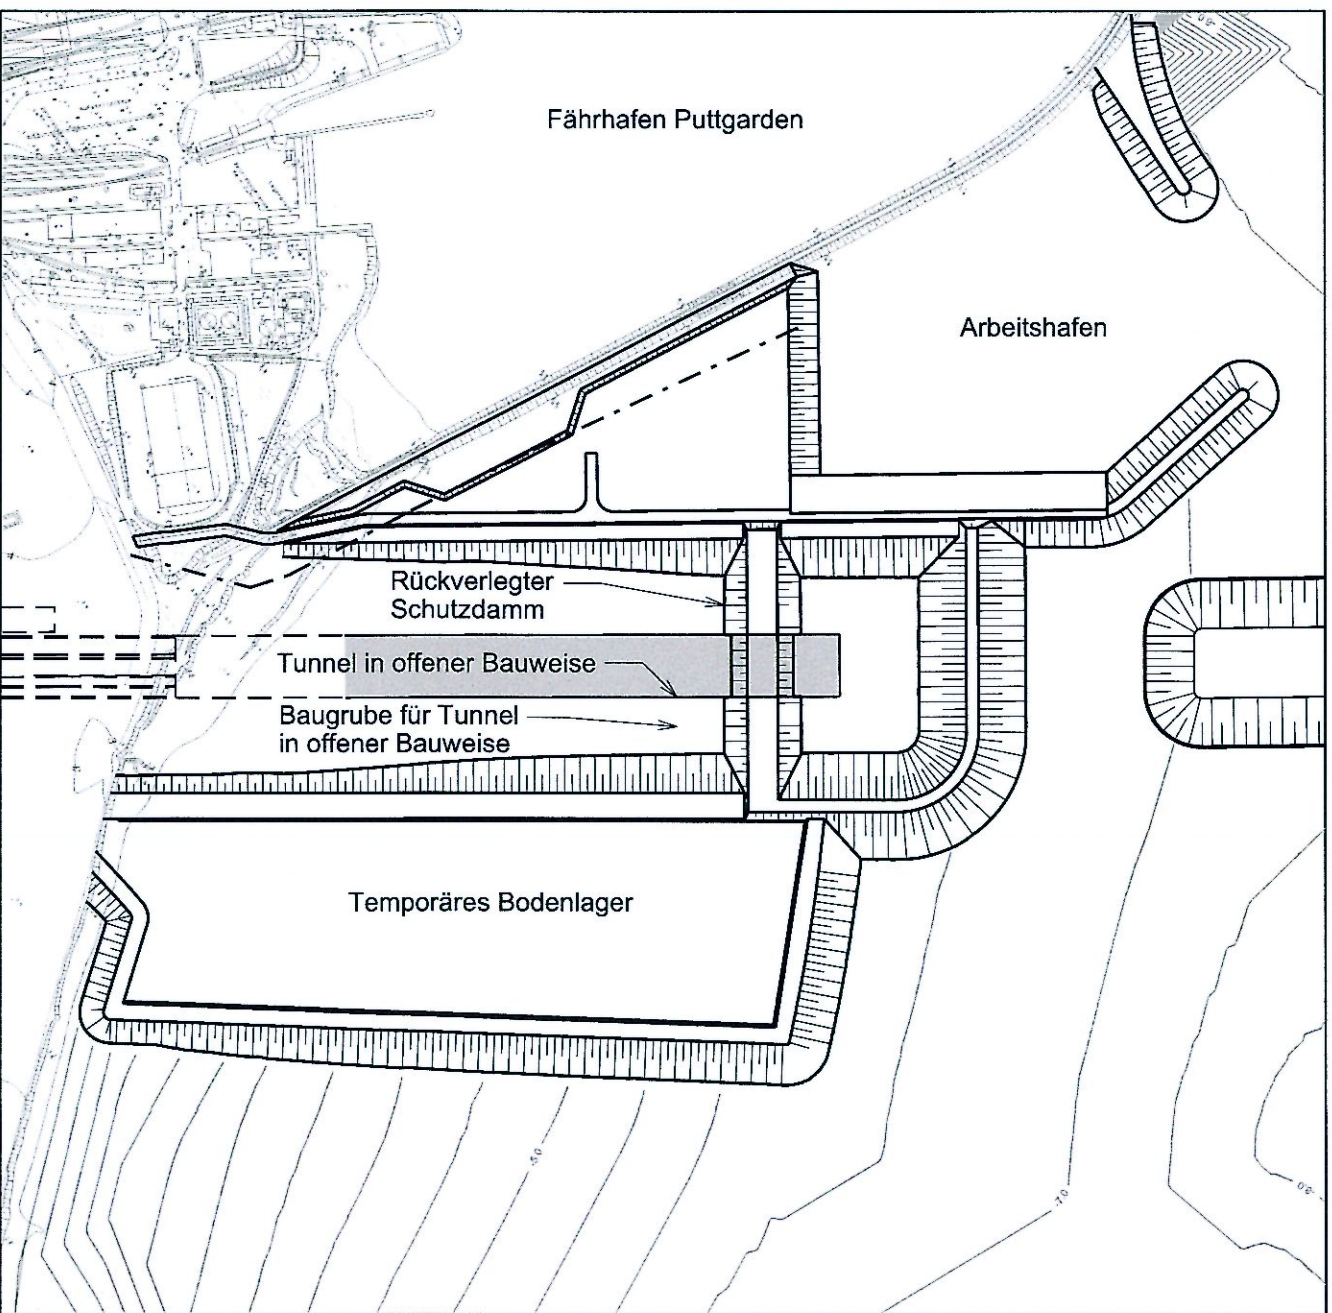


Bauphase 5
Bau Tunnel in offener Bauweise
Fertigstellung rückverlegter Schutzdamm (bis Woche 82)

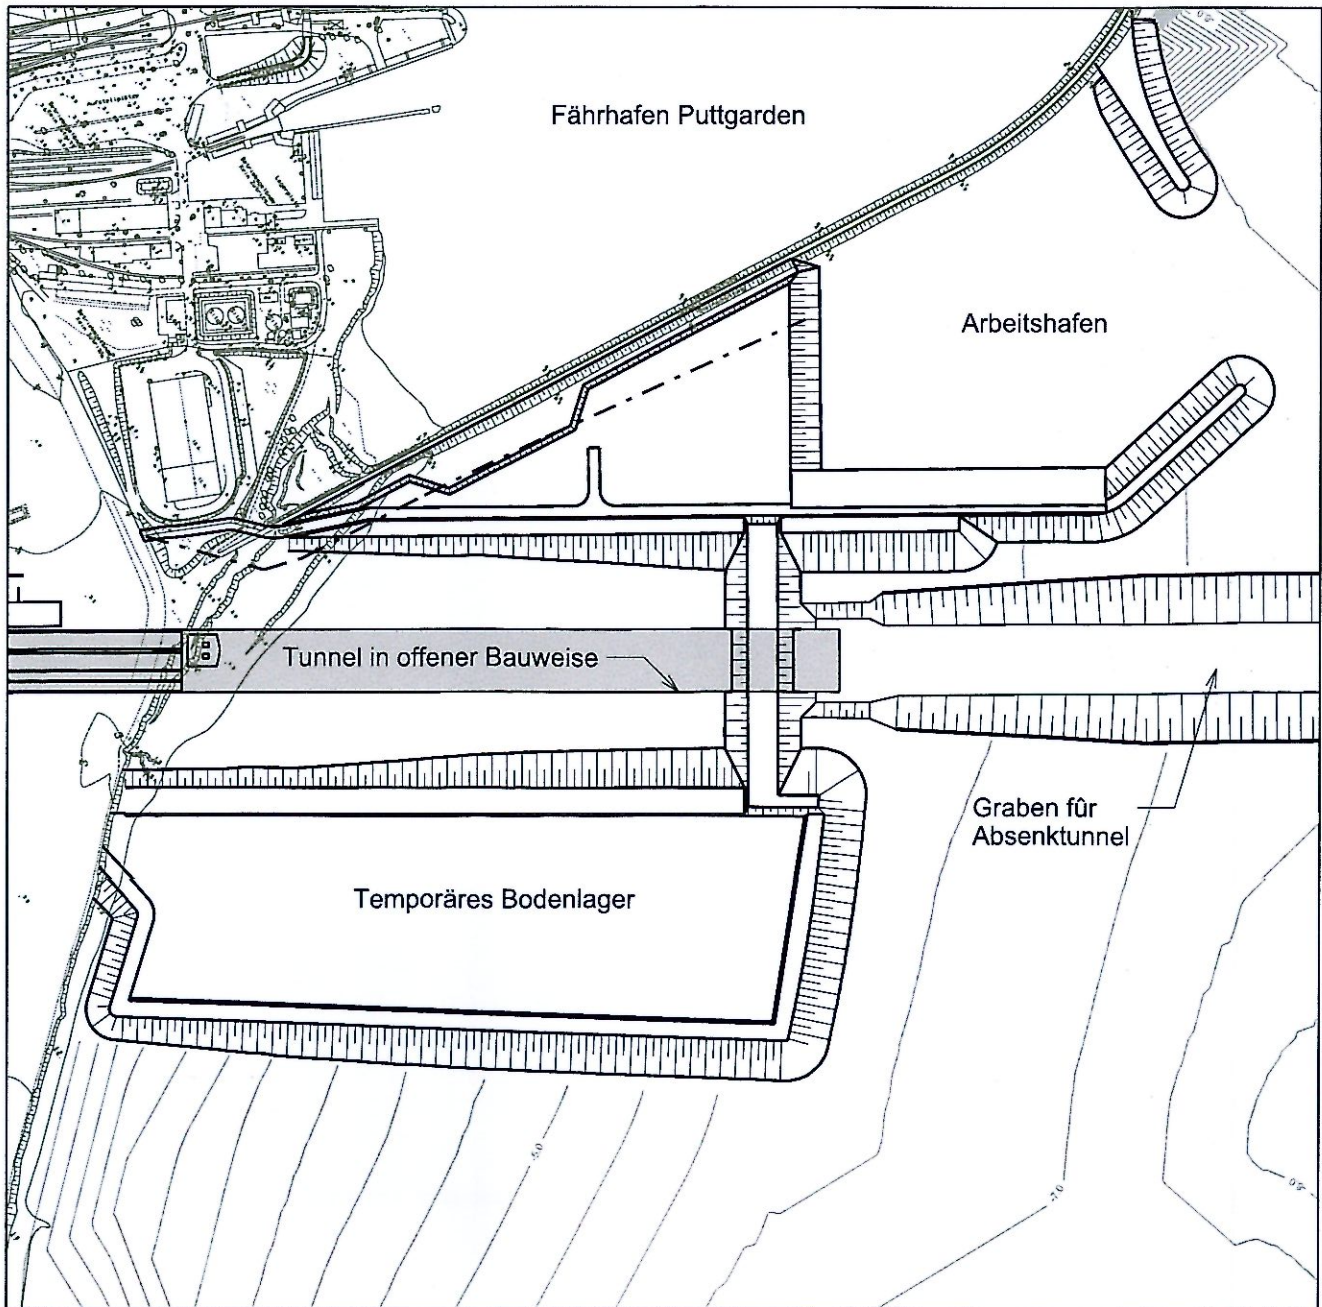


Bauphase 6
Rückbau temporärer Schutzdamm und Grabenaushub für erstes Absenktunnelelement


Fertigstellung Grabenaushub (bis Woche 88)
Fertigstellung Tunnel in offener Bauweise (bis Woche 91)

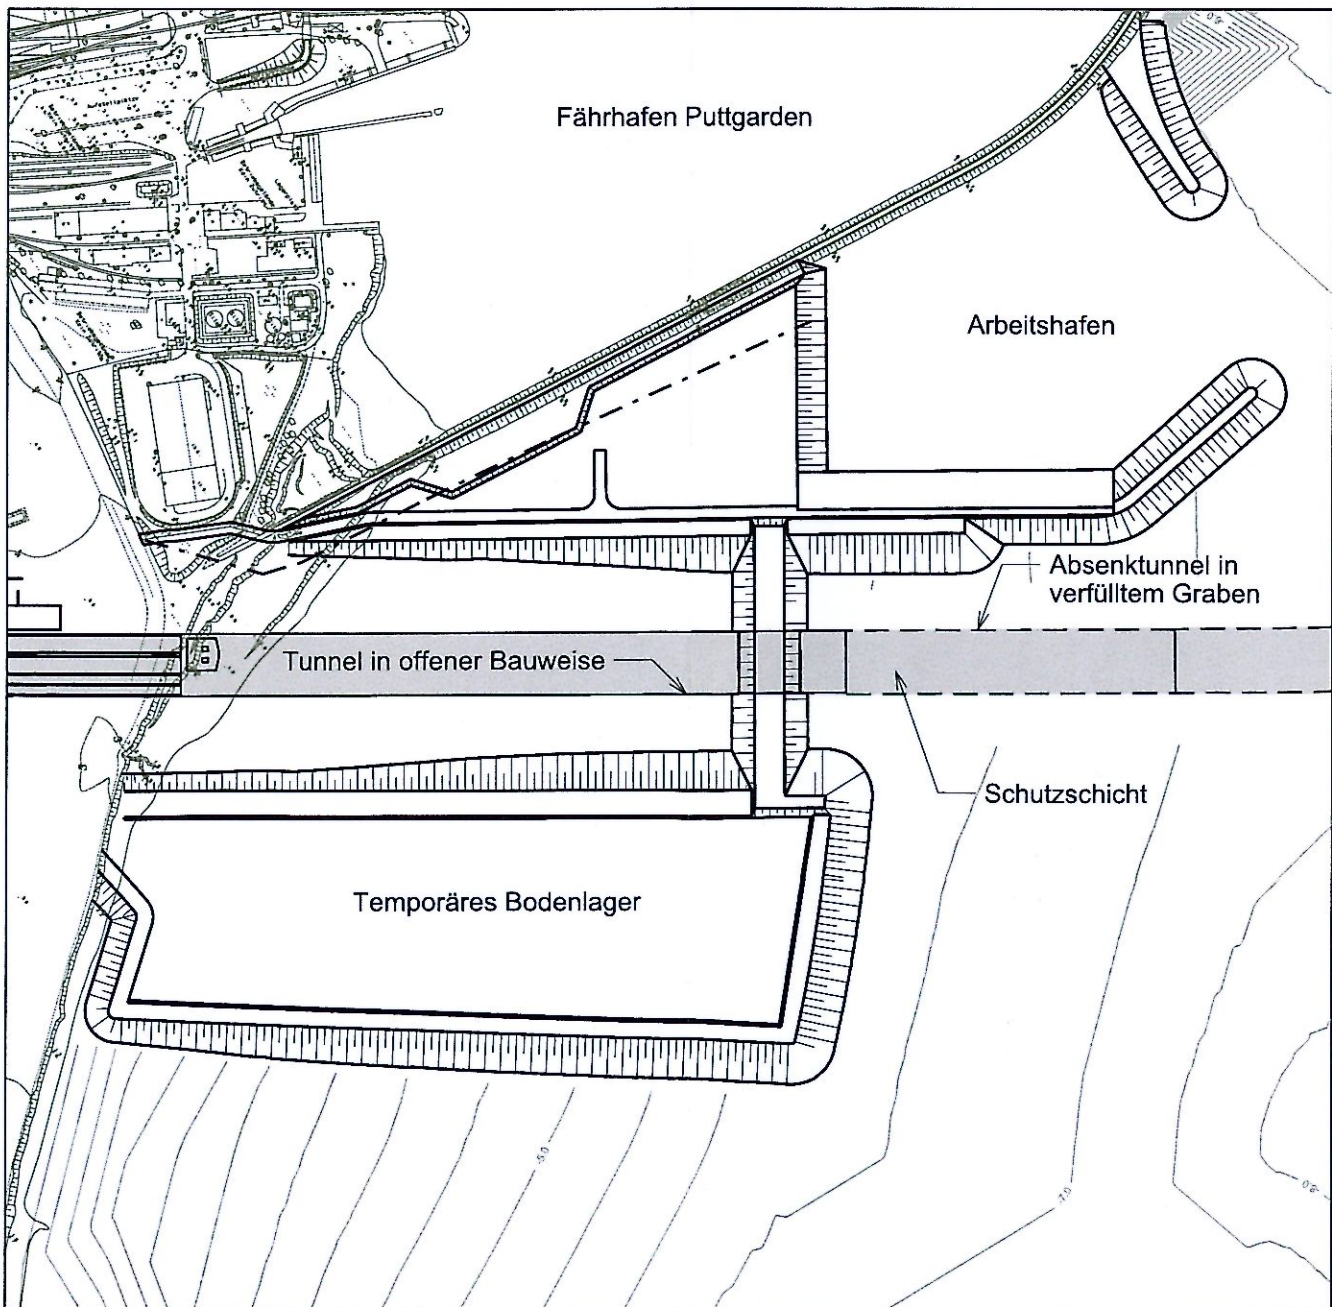


Bauphase 7
Grabenverfüllung
Fertigstellung Schutzschicht (bis Woche 114)

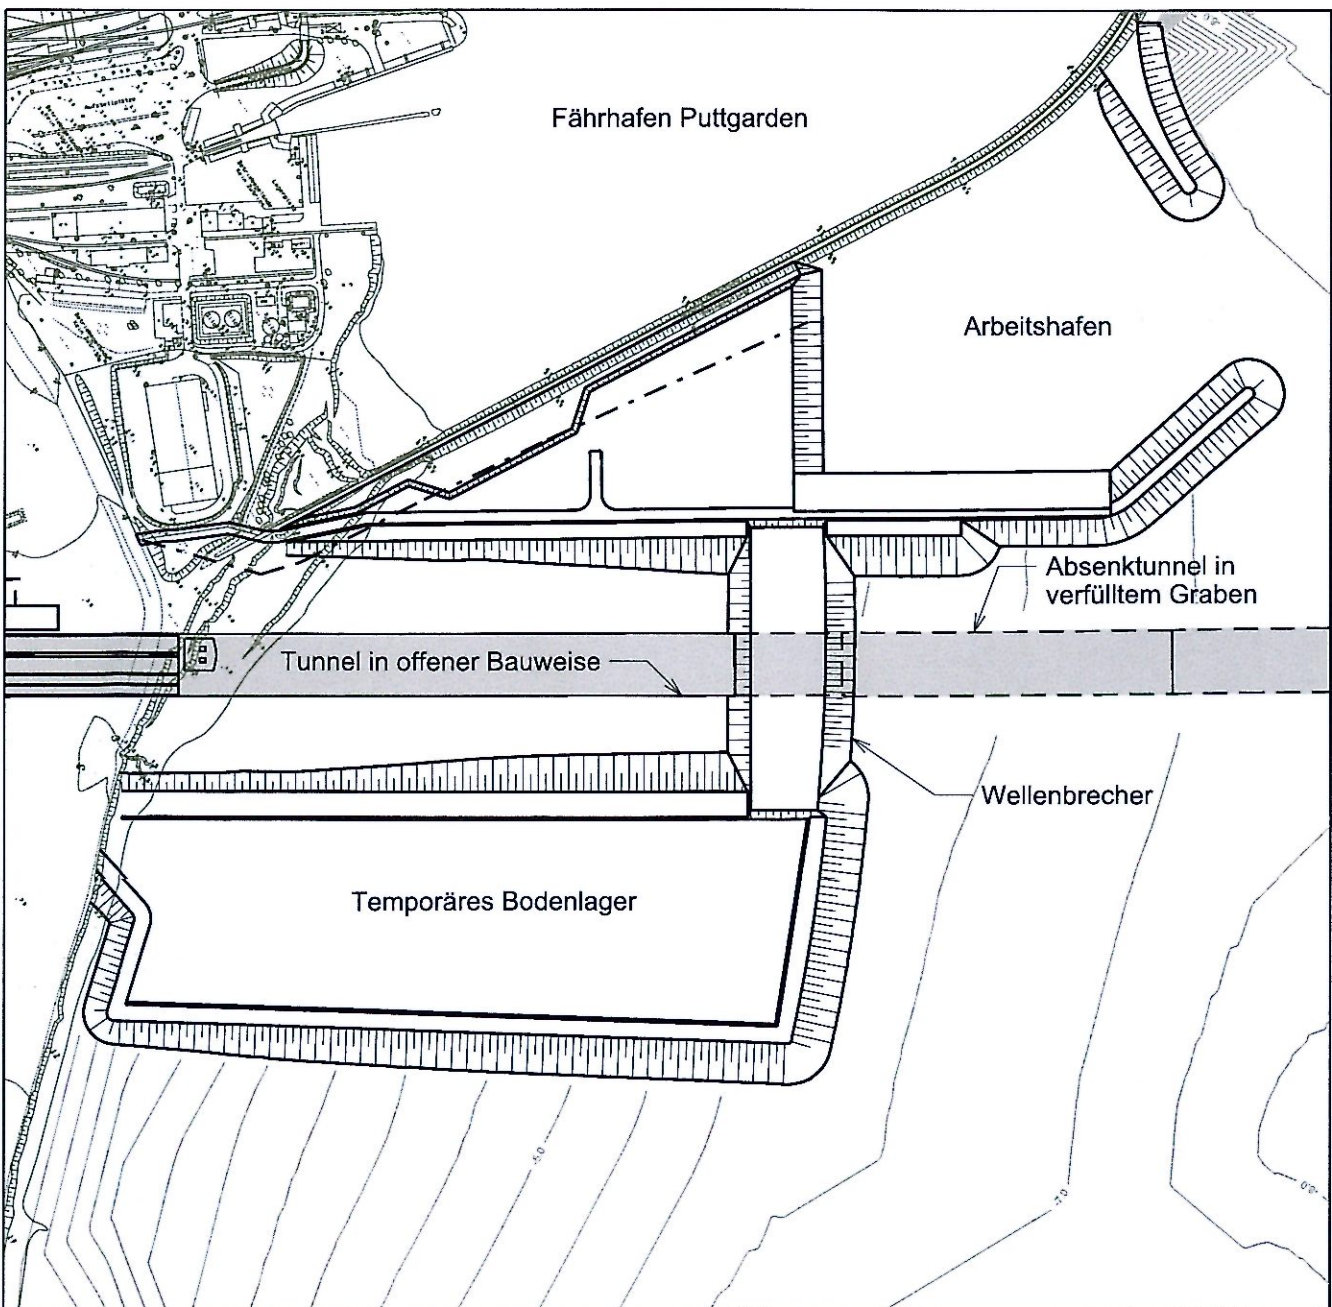

Bauphase 8
Bau Wellenbrecher vor Baugrube Tunnel in offener Bauweise

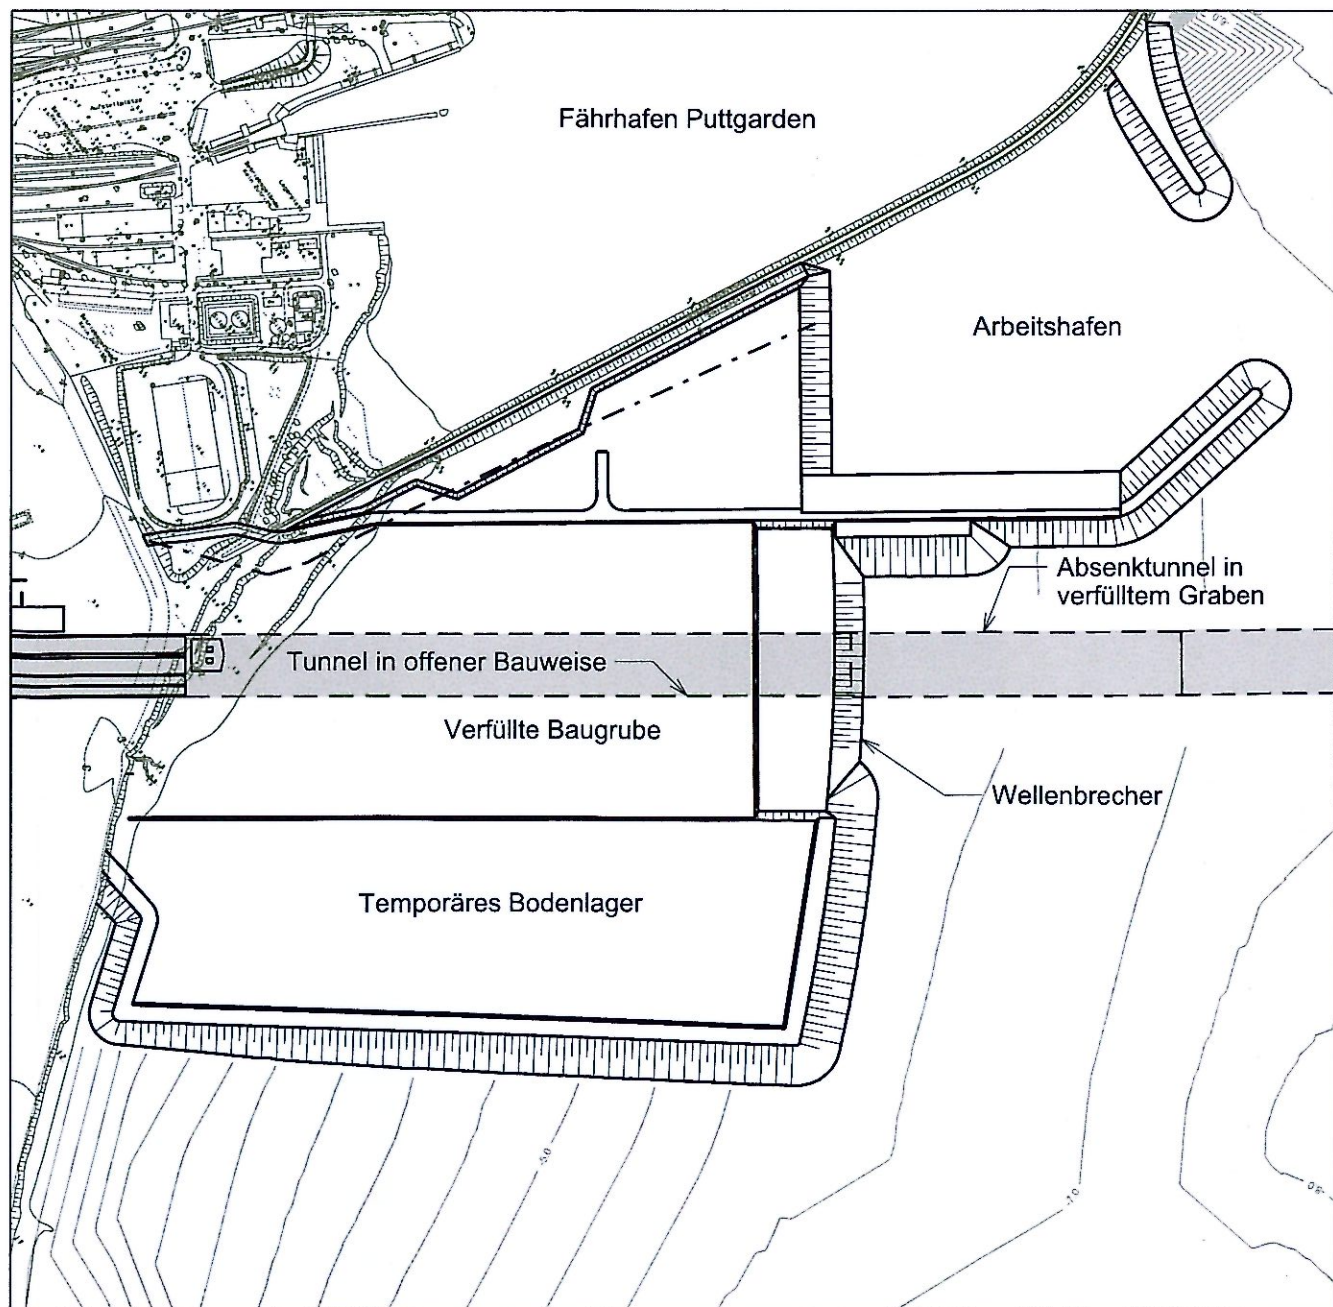

Bauphase 9
Fertigstellung Verfüllung Baugrube für Tunnel in offener Bauweise (bis Woche 204)

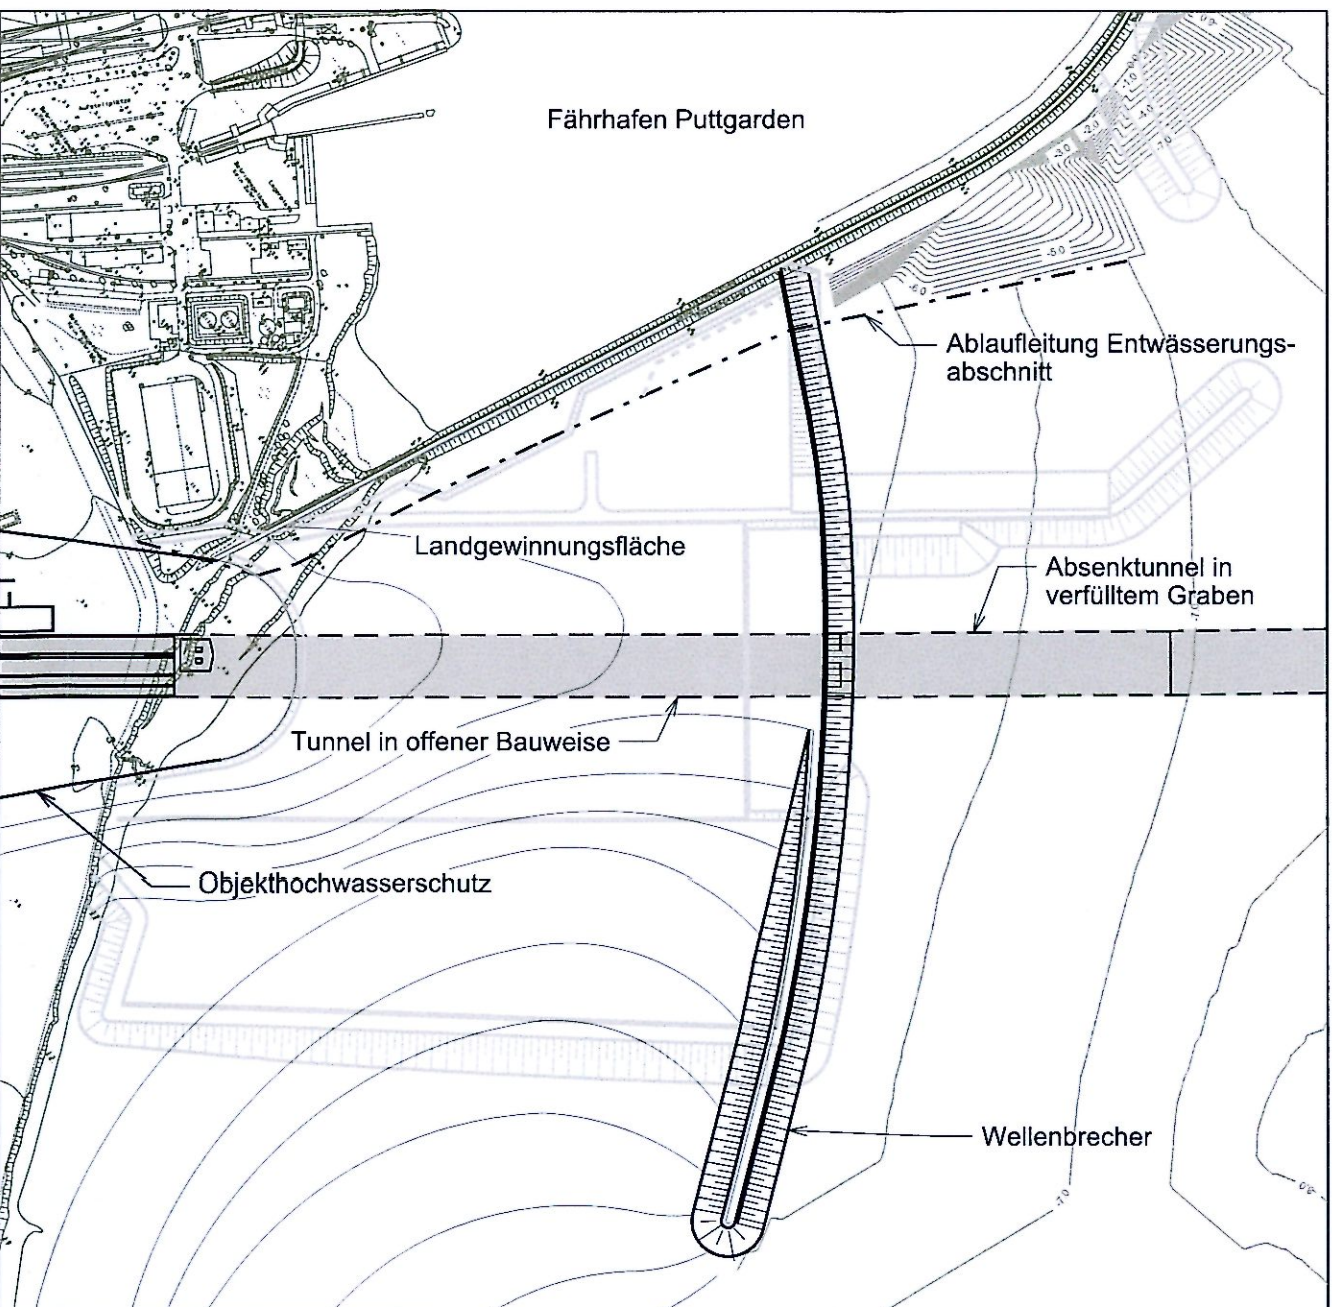


Bauphase 10
Fertigstellung Wellenbrecher und Landgewinnungsfläche (bis Woche 299)

BEMERKUNGEN:
Höhen über NN
Baublauf Grabenerstellung siehe Anlage 27.2, Blatt 3
Baublauf Absenkvorgang und Verfüllung siehe Anlage 27.2, Blatt 4

UNGÜLTIG!
Siehe Deckblatt!

Planfeststellungsunterlage
Anlage 27.2, Blatt 5
Lagepläne
Wasserbau
Baublauf küstennahe Flächen

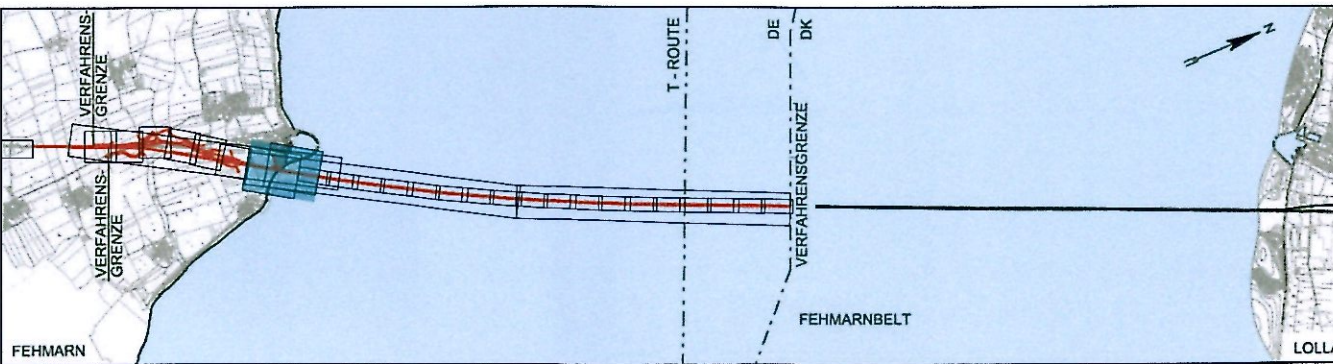

Index	Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Art der Änderung

Fehmarnbelt Fixed Link
Plan Approval Document

Feste Fehmarnbeltquerung
Planfeststellungsunterlage

Femern
Sund & Belt

Landschaftsbau
Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein
Niederlassung Lübeck

gez. Claus Dinesen, 01.10.2013

gez. Torsten Conradt, 01.10.2013

Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Ramboll
2014-02-14	HIL/HNSV		gez. S. Pedersen	ARUP TTC
Projekt Nr. 9594004	Maßstab 1:5000	Format A1 lang	Index Datum 2014-02-14	C/o Ramboll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Lagepläne	Bau-km (Bahn)
Wasserbau	Bau-km (Straße)
Baublauf küstennahe Flächen	Plan-Nr. RAT-N-X11-2725
	Index 4
