



1

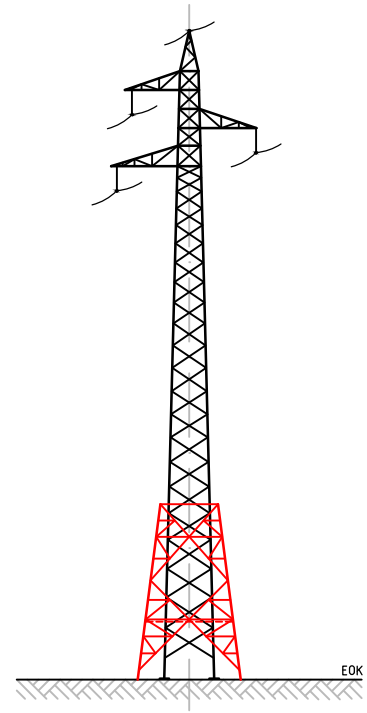


- Gründung der Fundamente vom neuen Mast
- Errichtung der Unterteile vom neuen Mast bis zur gewünschten Höhe

2

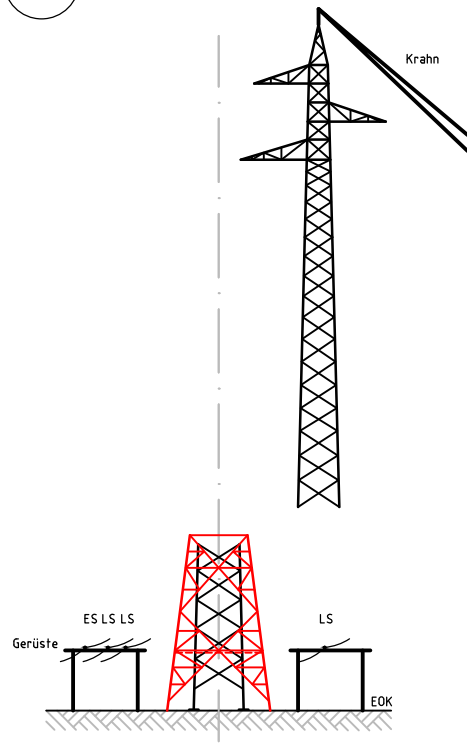


- schleiffreie Seilablage der Bestandsleitung
- Demontage alter Mast/ Mastkopf

3

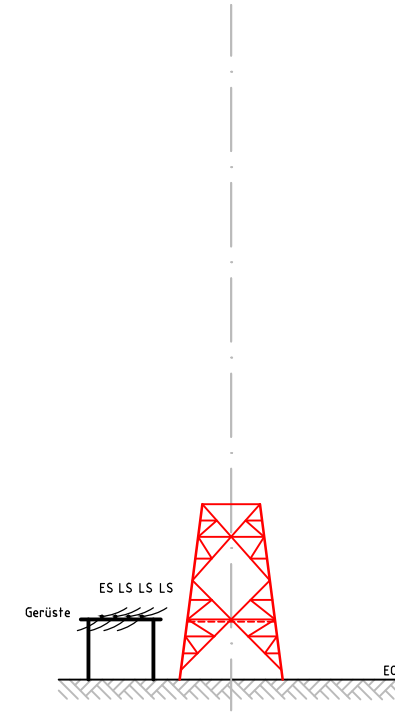


- Demontage alter Mast und Fundament
- schleiffreie Seilablage aller Seile auf der linken Seite

4

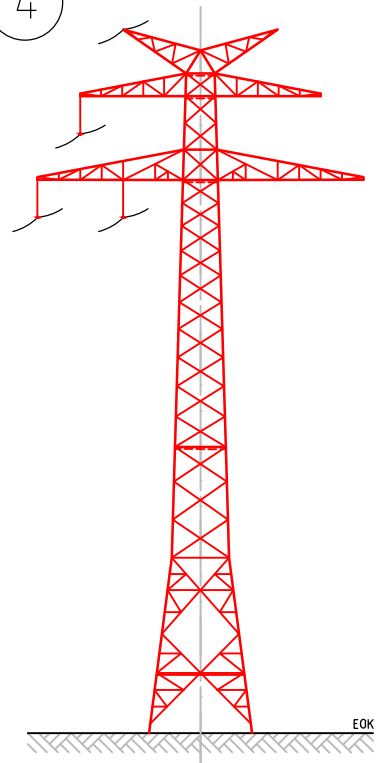


- Montage neuer Mast
- Einhängen der Leiterseile Bestandsleitung und des Erdseiles
- Demontage alter Mast und Montage neuer Mast nach Punkt ②-④ für alle Maste der Leitung

5

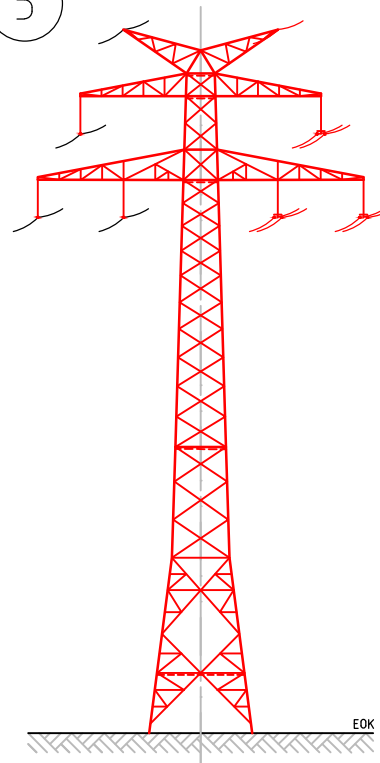


- Montage des neuen rechten Systems und dessen Inbetriebnahme

6

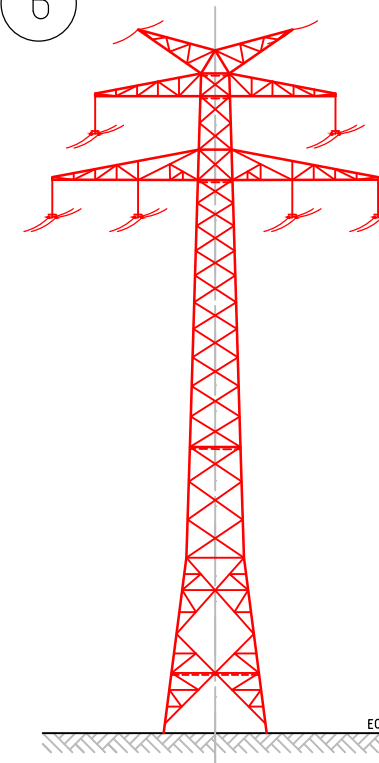


- Abschalten des alten Systems
- Demontage des alten Systems
- Montage des neuen linken Systems

alle Maste der Leitung sind fertig gestellt


Technische Referenz NT-AR	Erstellt durch GA-HLB TZ Planung Wiesenthal	Genehmigt von NT-AR	Erstelldatum 24.11.2014	Status E	Zählteil 2 Blatt 1
		Objektname 110-kV-Leitung Heide - Strübbel			
ID		Klassifikation			
		Titel Baublauf Ersatzneubau ohne Provisorium (ohne Versatz)			

1

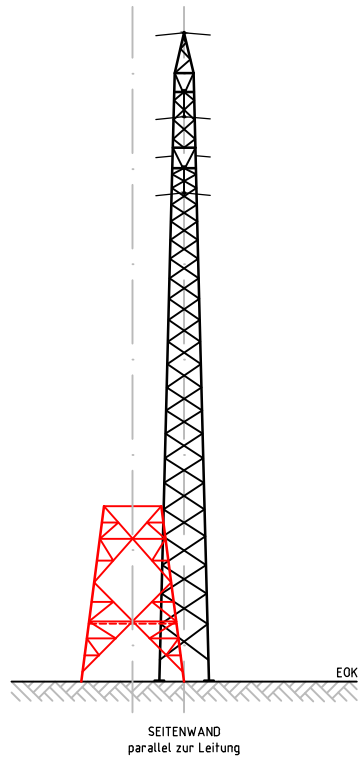


- Gründung der Fundamente vom neuen Mast
- Errichtung der Unterteile vom neuen Mast bis zur gewünschten Höhe

2

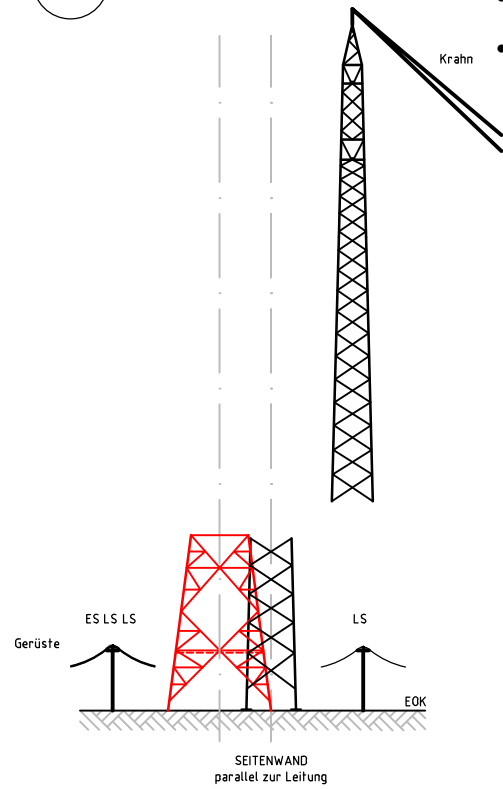


- schleiffreie Seilablage der Bestandsleitung
- Demontage alter Mast/ Mastkopf

3

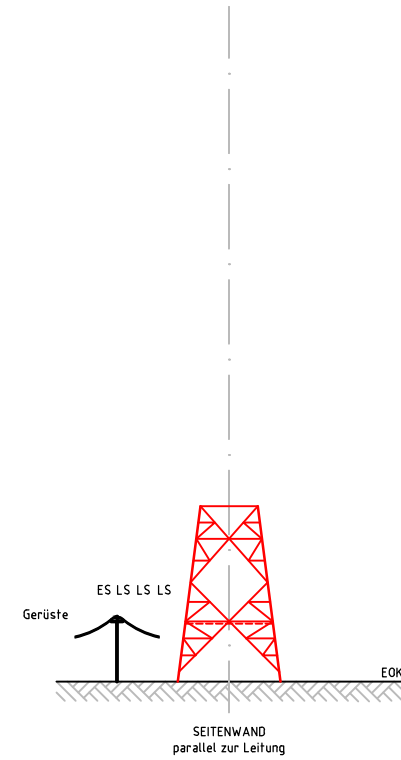


- Demontage alter Mast und Fundament
- schleiffreie Seilablage aller Seile auf der linken Seite

4

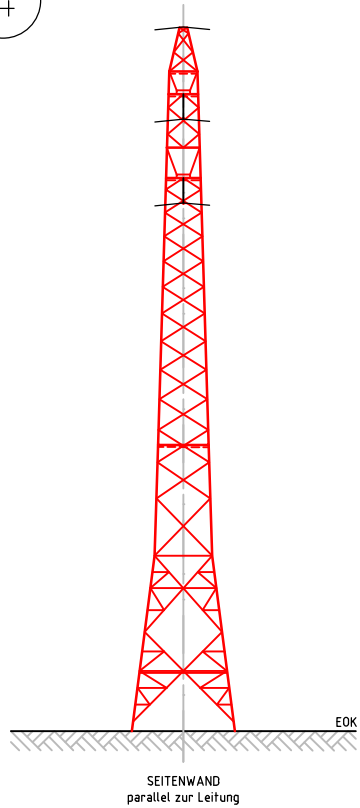


- Montage neuer Mast
- Einhängen der Leiterseile Bestandsleitung und des Erdseiles
- Demontage alter Mast und Montage neuer Mast nach Punkt ②-④ für alle Maste der Leitung

5

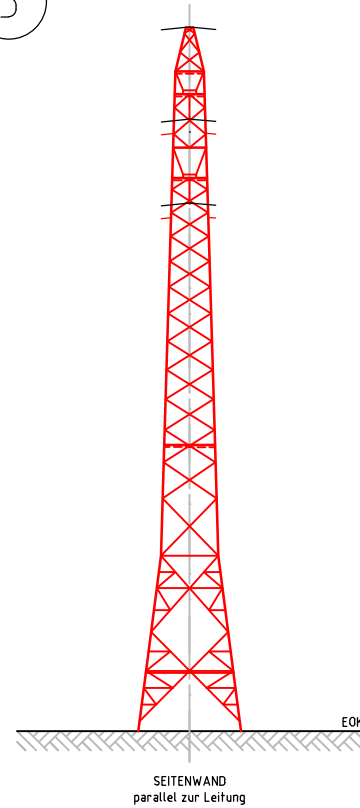


- Montage des neuen rechten Systems und dessen Inbetriebnahme

6

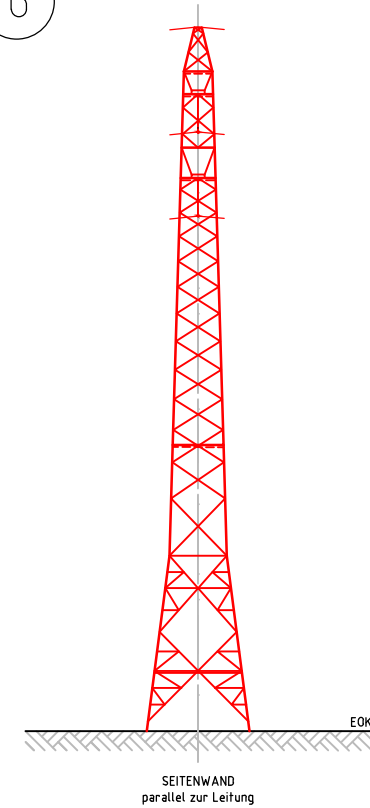

- Abschalten des alten Systems
- Demontage des alten Systems
- Montage des neuen linken Systems

alle Maste der Leitung sind fertig gestellt

Technische Referenz NT-AR	Erstellt durch GA-HLB TZ Planung Wiesenthal	Genehmigt von NT-AR	Erstelldatum 24.11.2014	Status G	Zählteil 2 Blatt 2
		Objektname Ersatzneubau Heide-Heide/West-Strübbel			
ID		Titel Bauablauf Ersatzneubau ohne Provisorium (mit Versatz)			
