Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**A1.1 - Baufeldräumung km 11,1+25 bis 34,4**	**57 Tage**	**Do 01.12.22**	**Fr 24.02.23**
2		1.1 - Baufeldräumung km 11,1+26 - 14,0	8 Tage	Mo 09.01.23	Mi 18.01.23
3		1.2 - Baufeldräumung km 14,0 - 16,8	8 Tage	Do 19.01.23	Mo 30.01.23
4		1.3 - Baufeldräumung km 16,8 - 19,8+25	8 Tage	Di 31.01.23	Do 09.02.23
5		1.4 - Baufeldräumung km 19,8+25 - 20,2+25	8 Tage	Fr 10.02.23	Di 21.02.23
6		1.5 - Baufeldräumung km 20,2+25 - 21,7	22 Tage	Do 01.12.22	Fr 06.01.23
7		1.6 - Baufeldräumung km 21,7 - 22,8	22 Tage	Do 01.12.22	Fr 06.01.23
8		1.7 - Baufeldräumung km 22,8 - 24,0	10 Tage	Mo 09.01.23	Fr 20.01.23
9		1.8 - Baufeldräumung km 24,0 - 25,3+10	5 Tage	Mo 23.01.23	Fr 27.01.23
10		1.9 - Baufeldräumung km 25,3+10 - 27,3	5 Tage	Mo 30.01.23	Fr 03.02.23
11		1.10 - Baufeldräumung km 27,3 - 29,7	5 Tage	Mo 06.02.23	Fr 10.02.23
12		1.11 - Baufeldräumung km 29,7 - 33,0+60	5 Tage	Mo 13.02.23	Fr 17.02.23
13		1.12 - Baufeldräumung km 33,0+60 - 34,4	5 Tage	Mo 20.02.23	Fr 24.02.23

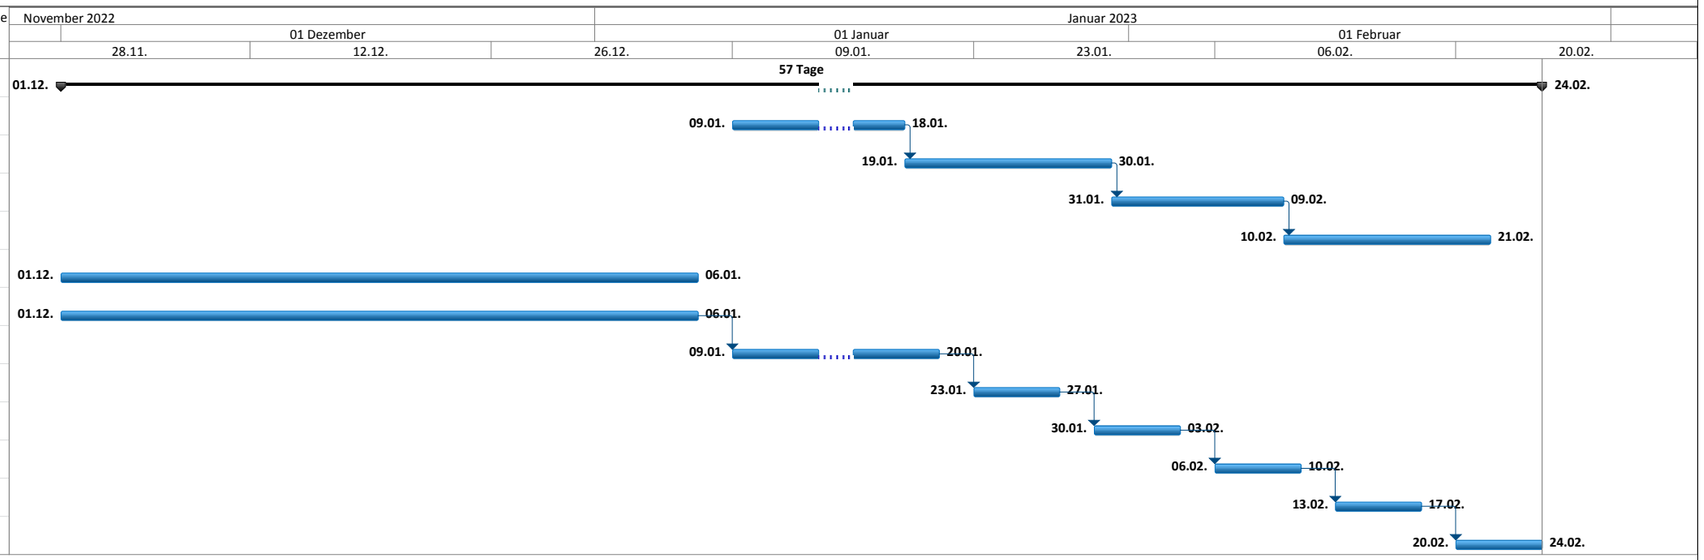

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**B1 - Bahnhof Bönningstedt**	**102 Tage**	**Mo 16.01.23**	**Di 13.06.23**
2		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Ostseite) - keine WE- und Nachtarbeit**	**49 Tage**	**Mo 16.01.23**	**Do 23.03.23**
3		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 16.01.23	Mi 18.01.23
4		1.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Do 19.01.23	Mi 25.01.23
5		1.3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung einschl. neue Rampe Süd; Fundament herstellen; Erdbau	15 Tage	Do 26.01.23	Mi 15.02.23
6		1.4 - Kabeltrassenverlegung und Anfüllung	5 Tage	Do 16.02.23	Mi 22.02.23
7		1.5 - Gründung Oberleitungsmaste im Bahnsteigbereich und Aufbau Oberleitungsmaste	1 Tag	Do 23.02.23	Do 23.02.23
8		1.6 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Fr 24.02.23	Do 09.03.23
9		1.7 - Bahnsteigausrüstung einbauen	10 Tage	Fr 10.03.23	Do 23.03.23
10		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**25 Tage**	**Fr 24.03.23**	**Di 02.05.23**
11		2.1 - 2.2 - Abbruch nördliche Zuwegung einschl. Teilabbruch Bahnsteig; Herstellung neue nördliche Zuwegung	25 Tage	Fr 24.03.23	Di 02.05.23
12		Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - keine WE- und Nachtarbeit	28 Tage	Mi 03.05.23	Di 13.06.23
13		3.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mi 03.05.23	Fr 05.05.23
14		3.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Mo 08.05.23	Fr 12.05.23
15		3.3 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Mo 15.05.23	Di 30.05.23
16		3.4 - Bahnsteigausrüstung einbauen	10 Tage	Mi 31.05.23	Di 13.06.23
17		**B2 - Bahnhof Hasloh**	**107 Tage**	**Mo 16.01.23**	**Mi 21.06.23**
18		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**25 Tage**	**Fr 24.03.23**	**Di 02.05.23**
19		1 - Abbruch nördlicher Zugang einschl. Kabelsicherung	10 Tage	Fr 24.03.23	Do 06.04.23
20		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen (Westseite)	3 Tage	Di 11.04.23	Do 13.04.23
21		2.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen (Westseite)	5 Tage	Fr 14.04.23	Do 20.04.23
22		2.3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung einschl. neuer Rampe Nord; Fundament herstellen; Erdbau	7 Tage	Fr 21.04.23	Di 02.05.23
23		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - keine WE- und Nachtarbeit**	**34 Tage**	**Mi 03.05.23**	**Mi 21.06.23**
24		2.3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung einschl. neue Rampe Nord; Fundament herstellen; Erdbau	8 Tage	Mi 03.05.23	Fr 12.05.23
25		2.4 - Kabeltrassenverlegung und Verfüllung	5 Tage	Mo 15.05.23	Mo 22.05.23
26		2.5 - Gründung Oberleitungsmaste im Bahnsteigbereich und Aufbau Oberleitungsmaste	1 Tag	Di 23.05.23	Di 23.05.23
27		2.6 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Mi 24.05.23	Mi 07.06.23
28		2.7 - Bahnsteigausrüstung einbauen	10 Tage	Do 08.06.23	Mi 21.06.23
29		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Ostseite) - keine WE- und Nachtarbeit**	**48 Tage**	**Mo 16.01.23**	**Mi 22.03.23**
30		3.1 - Abbruch südlicher Zugang einschl. Kabelsicherung	15 Tage	Mo 16.01.23	Fr 03.02.23
31		3.2 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 06.02.23	Mi 08.02.23
32		3.3 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Do 09.02.23	Mi 15.02.23
33		3.4 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Do 16.02.23	Mi 01.03.23
34		3.5 + 3.6 - Bahnsteigausrüstung einbauen und südlichen Bahnsteigzugang herstellen	15 Tage	Do 02.03.23	Mi 22.03.23

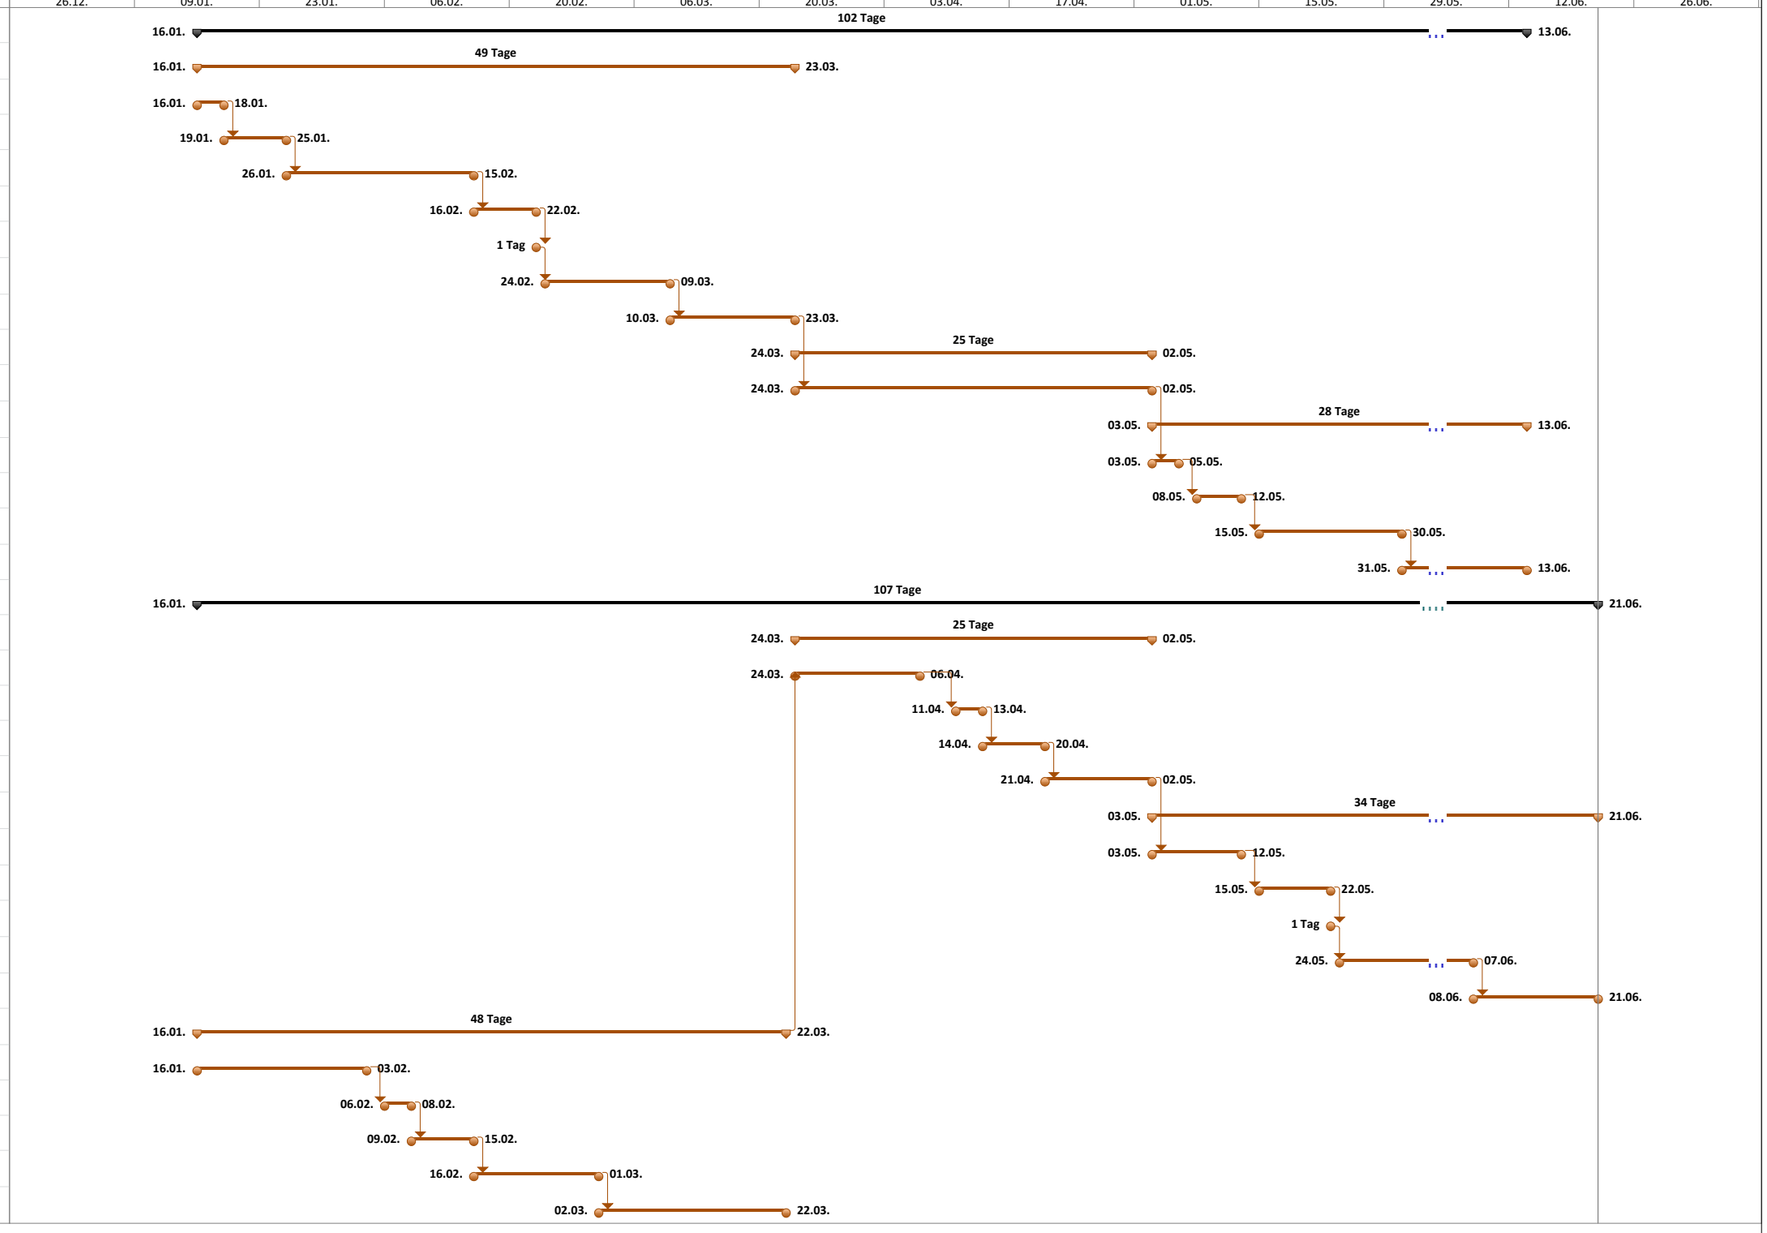

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**B3 - Bahnhof Quickborn Süd**	**130 Tage**	**Do 22.06.23**	**Di 07.12.21**
2		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**19 Tage**	**Do 22.06.23**	**Di 18.07.23**
3		1.1 - 1.3 - Umbau Entwässerungsleitungen im Gleisbereich	12 Tage	Do 22.06.23	Fr 07.07.23
4		1.4 - Umbau Entwässerungsleitungen im Bereich der Bahnsteigverlängerungen	7 Tage	Mo 10.07.23	Di 18.07.23
5		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Bahnsteig (Westseite) komplett gesperrt - keine WE- und Nachtarbeit**	**56 Tage**	**Mi 19.07.23**	**Do 05.10.23**
6		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mi 19.07.23	Fr 21.07.23
7		2.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Mo 24.07.23	Fr 28.07.23
8		2.3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung; Erdbau, einschl. Kabeltrassenanpassung	13 Tage	Mo 31.07.23	Mi 16.08.23
9		2.4 - Teilabbruch Bahnsteig und Abbruch Rampe im nördlichen Bereich	5 Tage	Do 17.08.23	Mi 23.08.23
10		2.5 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein; Herstellung Rampe Nord	15 Tage	Do 24.08.23	Mi 13.09.23
11		2.6 Bahnsteigbelag einschl. Abdeckstein einbauen	5 Tage	Do 14.09.23	Mi 20.09.23
12		2.7 - Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Do 21.09.23	Do 05.10.23
13		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Bahnsteig (Ostseite) komplett gesperrt - keine WE- und Nachtarbeit**	**55 Tage**	**Fr 06.10.23**	**Fr 22.12.23**
14		3.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Fr 06.10.23	Di 10.10.23
15		3.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Mi 11.10.23	Di 17.10.23
16		3.3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung; Erdbau, einschl. Kabeltrassenanpassung	13 Tage	Mi 18.10.23	Do 02.11.23
17		3.4 - Teilabbruch Bahnsteig und Abbruch Rampe im nördlichen Bereich	5 Tage	Di 07.11.23	Do 09.11.23
18		3.5 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein; Herstellung Rampe Nord	15 Tage	Di 14.11.23	Do 30.11.23
19		3.6 Bahnsteigbelag einschl. Abdeckstein einbauen	5 Tage	Di 05.12.23	Do 07.12.23
20		3.7 - Bahnsteigausstattung einbauen	9 Tage	Di 12.12.23	Fr 22.12.23
21		**B4 - Bahnhof Quickborn, einschl. BÜ Querstraße**	**129 Tage**	**Do 22.06.23**	**Do 21.12.23**
22		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**15 Tage**	**Do 22.06.23**	**Mi 12.07.23**
23		1.1+1.2 - Vorrichtung BÜ Querstraße in neuer Lage außerhalb des Gleisbereiches	8 Tage	Do 22.06.23	Mo 03.07.23
24		1.3 - 1.5 - Einbau BÜ in neuer Lage und Abbruch vorhandener BÜ	7 Tage	Di 04.07.23	Mi 12.07.23
25		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Bahnsteig (Ostseite) kompett gesperrt - keine WE- und Nachtarbeit**	**62 Tage**	**Mo 25.09.23**	**Do 21.12.23**
26		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 25.09.23	Mi 27.09.23
27		2.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Do 28.09.23	Do 05.10.23
28		2.3 - südliche und nördliche Rampe ausbauen	5 Tage	Fr 06.10.23	Do 12.10.23
29		2.4 - Bahnsteigverlängerung herstellen, Erdbau	10 Tage	Fr 13.10.23	Do 26.10.23
30		2.5 - Gründung Oberleitungsmaste im Bahnsteigbereich und Aufbau Oberleitungsmaste	1 Tag	Fr 27.10.23	Fr 27.10.23
31		2.6 - Kabeltrassenverlegung und -verfüllung	5 Tage	Mo 30.10.23	Mo 06.11.23
32		2.7 - südlichen und nördlichen Bahnsteigzugang herstellen	5 Tage	Di 07.11.23	Mo 13.11.23
33		2.8 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein, Winkelstützwände	13 Tage	Di 14.11.23	Do 30.11.23
34		3.1 Bahnsteigbelag einbauen	5 Tage	Fr 01.12.23	Do 07.12.23
35		3.2 - Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Fr 08.12.23	Do 21.12.23
36		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**19 Tage**	**Do 22.06.23**	**Mi 12.07.23**
37		4.1 - Baustellensicherung	2 Tage	Do 22.06.23	Fr 23.06.23
38		4.2 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 26.06.23	Mi 28.06.23
39		4.3 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Do 29.06.23	Mi 05.07.23
40		4.4 - südliche und nördliche Rampe ausbauen	5 Tage	Do 06.07.23	Mi 12.07.23
41		4.5 - Rückbau Zaun zwischen den Gleisen	2 Tage	Do 13.07.23	Fr 14.07.23
42		4.6 - Bahnsteigverlängerung einschl. Fundament, Erdbau	2 Tage	Mo 17.07.23	Di 18.07.23
43		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Bahnsteig (Westseite) komplett gesperrt - keine WE- und Nachtarbeit**	**48 Tage**	**Mi 19.07.23**	**Fr 22.09.23**
44		4.6 - Bahnsteigverlängerung einschl. Fundament, Erdbau	8 Tage	Mi 19.07.23	Fr 28.07.23
45		4.7 - Kabeltrassenverlegung und -verfüllung	5 Tage	Mo 31.07.23	Fr 04.08.23
46		4.8 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein, Winkelstützwände	15 Tage	Mo 07.08.23	Fr 25.08.23
47		4.9 - südlichen und nördlichen Bahnsteigzugang herstellen	5 Tage	Mo 28.08.23	Fr 01.09.23
48		5.1 Bahnsteigbelag einbauen	5 Tage	Mo 04.09.23	Fr 08.09.23
49		5.2 - Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Mo 11.09.23	Fr 22.09.23

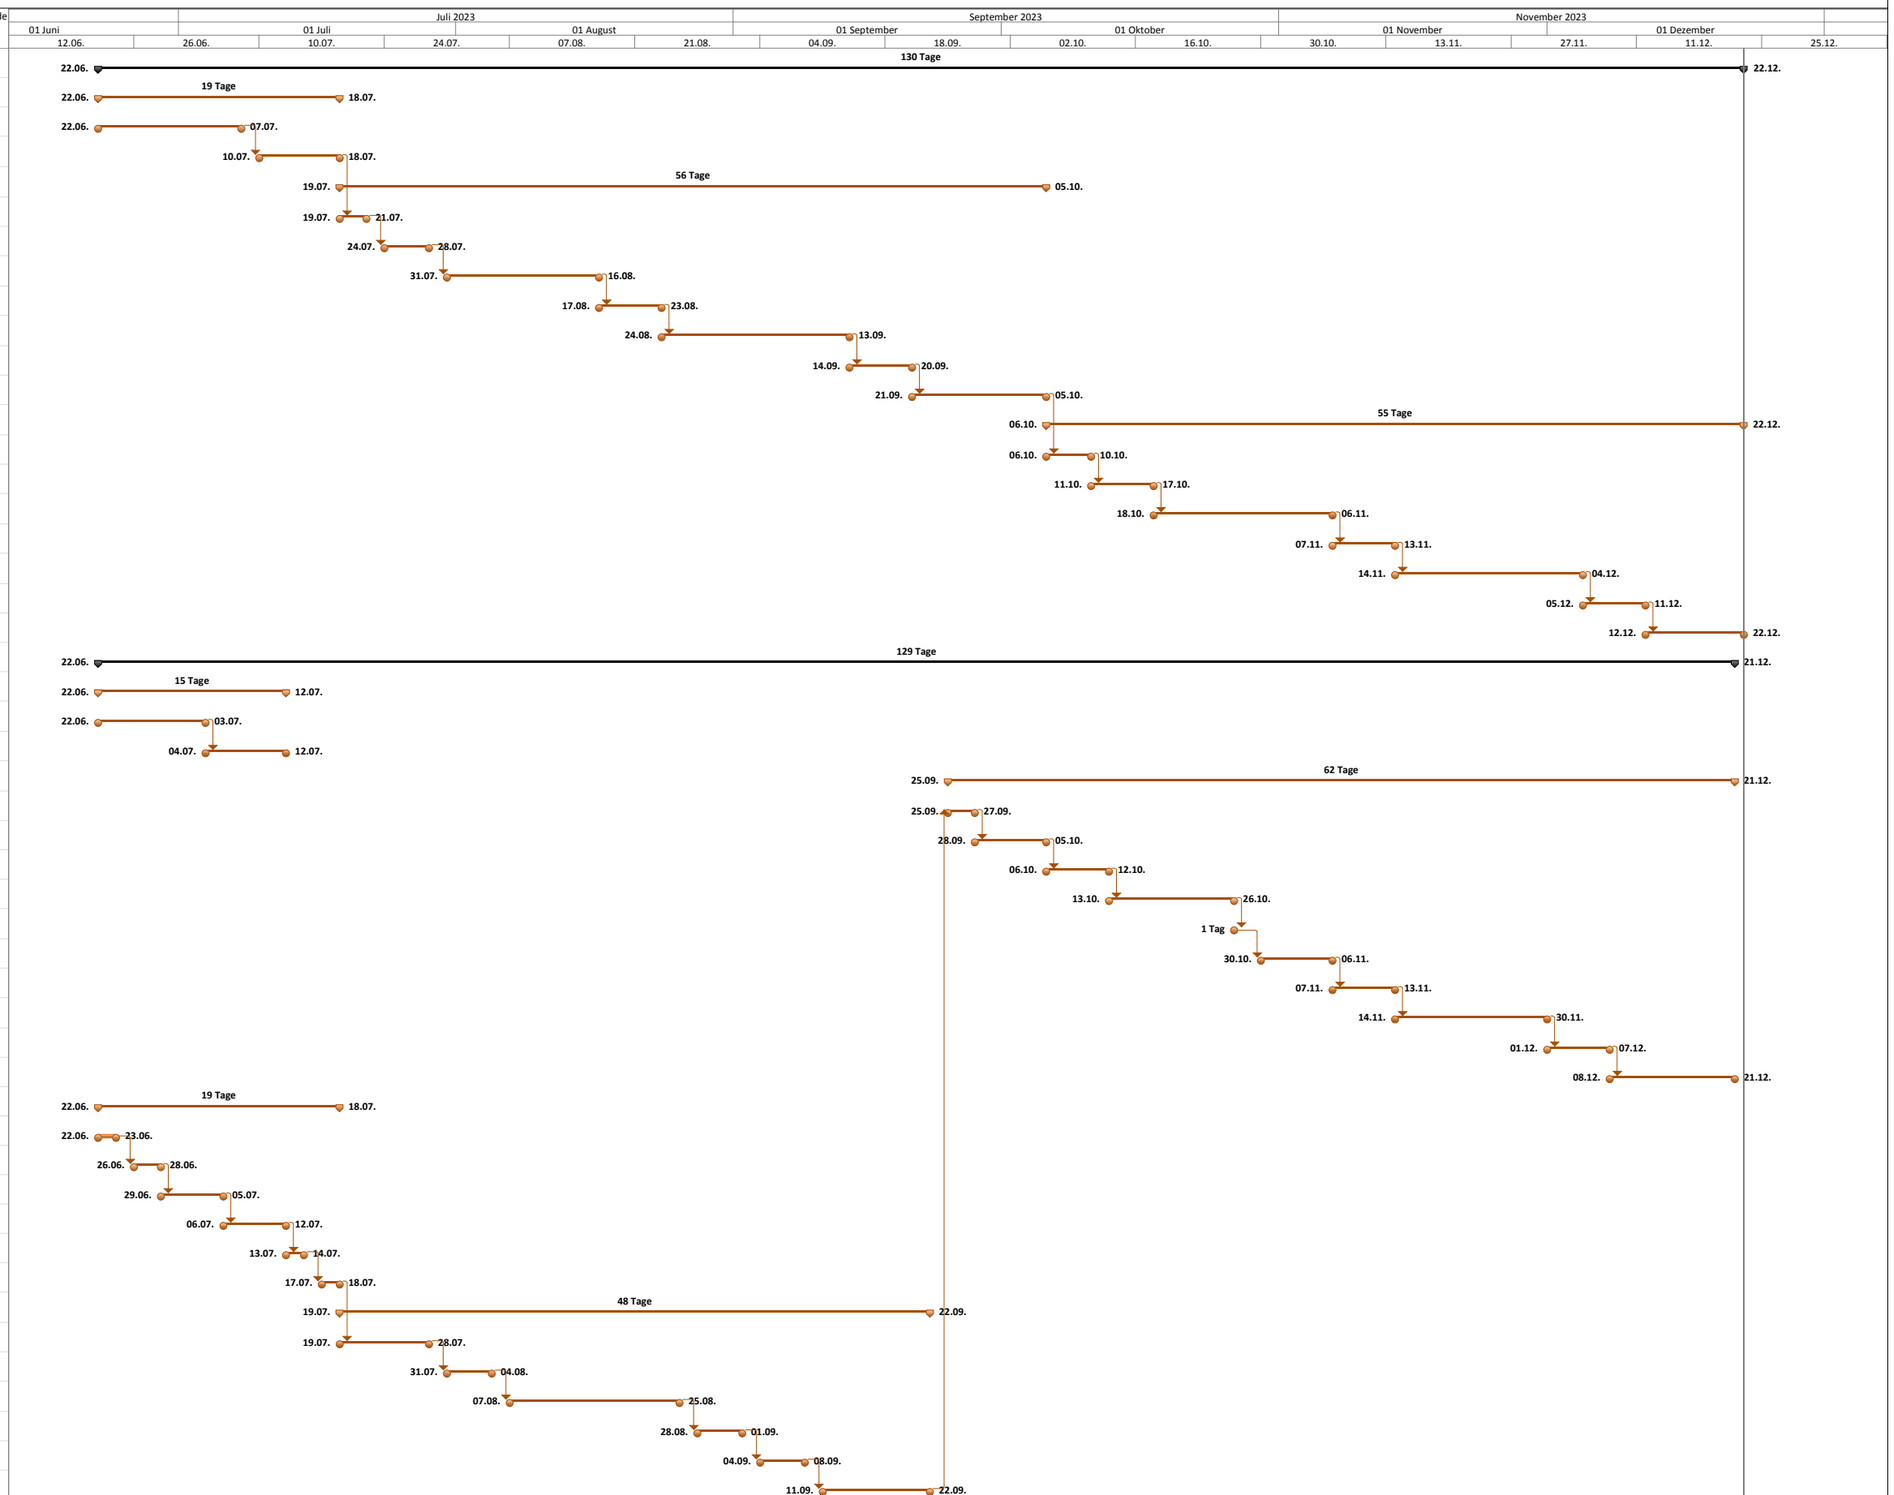

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**B5 - Bahnhof Ellerau**	**86 Tage**	**Do 29.08.24**	**Mi 08.01.25**
2		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Nordseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**48 Tage**	**Do 29.08.24**	**Mi 06.11.24**
3		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Do 29.08.24	Mo 02.09.24
4		1.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Di 03.09.24	Mo 09.09.24
5		1.3 - Gleissicherung im Bahnsteigverlängerungsbereich einbauen	5 Tage	Di 10.09.24	Mo 16.09.24
6		1.4 - Herstellung Bahnsteigverlängerung einschl. Fundament; Erdbau	10 Tage	Di 17.09.24	Mo 30.09.24
7		1.5 - Kabeltrassenverlegung und Verfüllung	5 Tage	Di 01.10.24	Di 08.10.24
8		1.6 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Mi 09.10.24	Di 22.10.24
9		1.7 - Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Mi 23.10.24	Mi 06.11.24
10		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**15 Tage**	**Do 07.11.24**	**Mi 27.11.24**
11		2.1+2.2 - Rückbau Zuwegung und Neubau Zuwegung	15 Tage	Do 07.11.24	Mi 27.11.24
12		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, halbseitige Sperrung des Bahnsteiges (Südseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**23 Tage**	**Do 28.11.24**	**Mo 08.01.24**
13		3.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Do 28.11.24	Mo 02.12.24
14		3.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen	5 Tage	Di 03.12.24	Mo 09.12.24
15		3.3 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungs-, Abdeckstein und Pflasterung	10 Tage	Di 10.12.24	Mo 23.12.24
16		3.4 - Bahnsteigausrüstung einbauen	5 Tage	Do 02.01.25	Mo 08.01.24
17		**B6 - Bahnhof Tanneneck**	**147 Tage**	**Mo 05.08.24**	**Mo 10.03.25**
18		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges - Keine WE- und Nachtarbeit**	**66 Tage**	**Mo 05.08.24**	**Mi 06.11.24**
19		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	8 Tage	Mo 05.08.24	Mi 14.08.24
20		1.2 - Abbruch Bahnsteig einschl. Kabeltrassensicherung	18 Tage	Do 15.08.24	Mo 09.09.24
21		1.3 - Herstellung Bahnsteig einschl. Rampen	40 Tage	Di 10.09.24	Mi 06.11.24
22		**Vollsperrung beider Gleise - keine WE- und Nachtarbeit**	**15 Tage**	**Do 07.11.24**	**Mi 27.11.24**
23		1.4 - Bahnsteigausstattung einbauen (Bahnsteig Richtung Eidelstedt)	8 Tage	Do 07.11.24	Mo 18.11.24
24		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen (Bahnsteig Richtung Kaltenkirchen)	7 Tage	Di 19.11.24	Mi 27.11.24
25		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges - Keine WE- und Nachtarbeit**	**66 Tage**	**Do 28.11.24**	**Mo 10.03.25**
26		2.2 - Abbruch Bahnsteig einschl. Kabeltrassensicherung	18 Tage	Do 28.11.24	Mo 23.12.24
27		2.3 - Herstellung Bahnsteig einschl. Rampen	40 Tage	Do 02.01.25	Mi 26.02.25
28		2.4 - Bahnsteigausstattung einbauen	8 Tage	Do 27.02.25	Mo 10.03.25
29		**B7 - Bahnhof Ulzburg Süd**	**111 Tage**	**Di 11.03.25**	**Di 19.08.25**
30		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Ostseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**55 Tage**	**Di 11.03.25**	**Fr 30.05.25**
31		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Di 11.03.25	Do 13.03.25
32		1.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein im nördlichen Bereich ausbauen	2 Tage	Fr 14.03.25	Mo 17.03.25
33		1.3 - Rampe ausbauen, Teilabbruch Bahnsteig	5 Tage	Di 18.03.25	Mo 24.03.25
34		1.4 - Bahnsteigzugang herstellen	5 Tage	Di 25.03.25	Mo 31.03.25
35		1.5 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein Pflasterung; Entwässerungsanpassungen im nördlichen	10 Tage	Di 01.04.25	Mo 14.04.25
36		1.6 - Herstellung Bahnsteigverlängerung im südlichen Bereich, einschl. Kabeltrassenanpassung	25 Tage	Di 15.04.25	Do 22.05.25
37		1.7 - Bahnsteigausstattung einbauen	5 Tage	Fr 23.05.25	Fr 30.05.25
38		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**56 Tage**	**Mo 02.06.25**	**Di 19.08.25**
39		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 02.06.25	Mi 04.06.25
40		2.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein im nördlichen Bereich ausbauen	2 Tage	Do 05.06.25	Fr 06.06.25
41		2.3 - Gründung Oberleitungsmaste im Bahnsteigbereich und Aufbau Oberleitungsmaste	1 Tag	Di 10.06.25	Di 10.06.25
42		2.4 - Rampe ausbauen, Teilabbruch Bahnsteig	5 Tage	Mi 11.06.25	Di 17.06.25
43		2.5 - Bahnsteigzugang herstellen	5 Tage	Mi 18.06.25	Di 24.06.25
44		2.6 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein Pflasterung im nördlichen Bereich	10 Tage	Mi 25.06.25	Di 08.07.25
45		2.7 - Herstellung Winkelstützwände im südlichen Bereich	5 Tage	Mi 09.07.25	Di 15.07.25
46		2.8 - Herstellung Bahnsteigerhöhung im südlichen Bereich, einschl. Kabeltrassenanpassung	20 Tage	Mi 16.07.25	Di 12.08.25
47		2.9 - Bahnsteigausstattung einbauen	5 Tage	Mi 13.08.25	Di 19.08.25

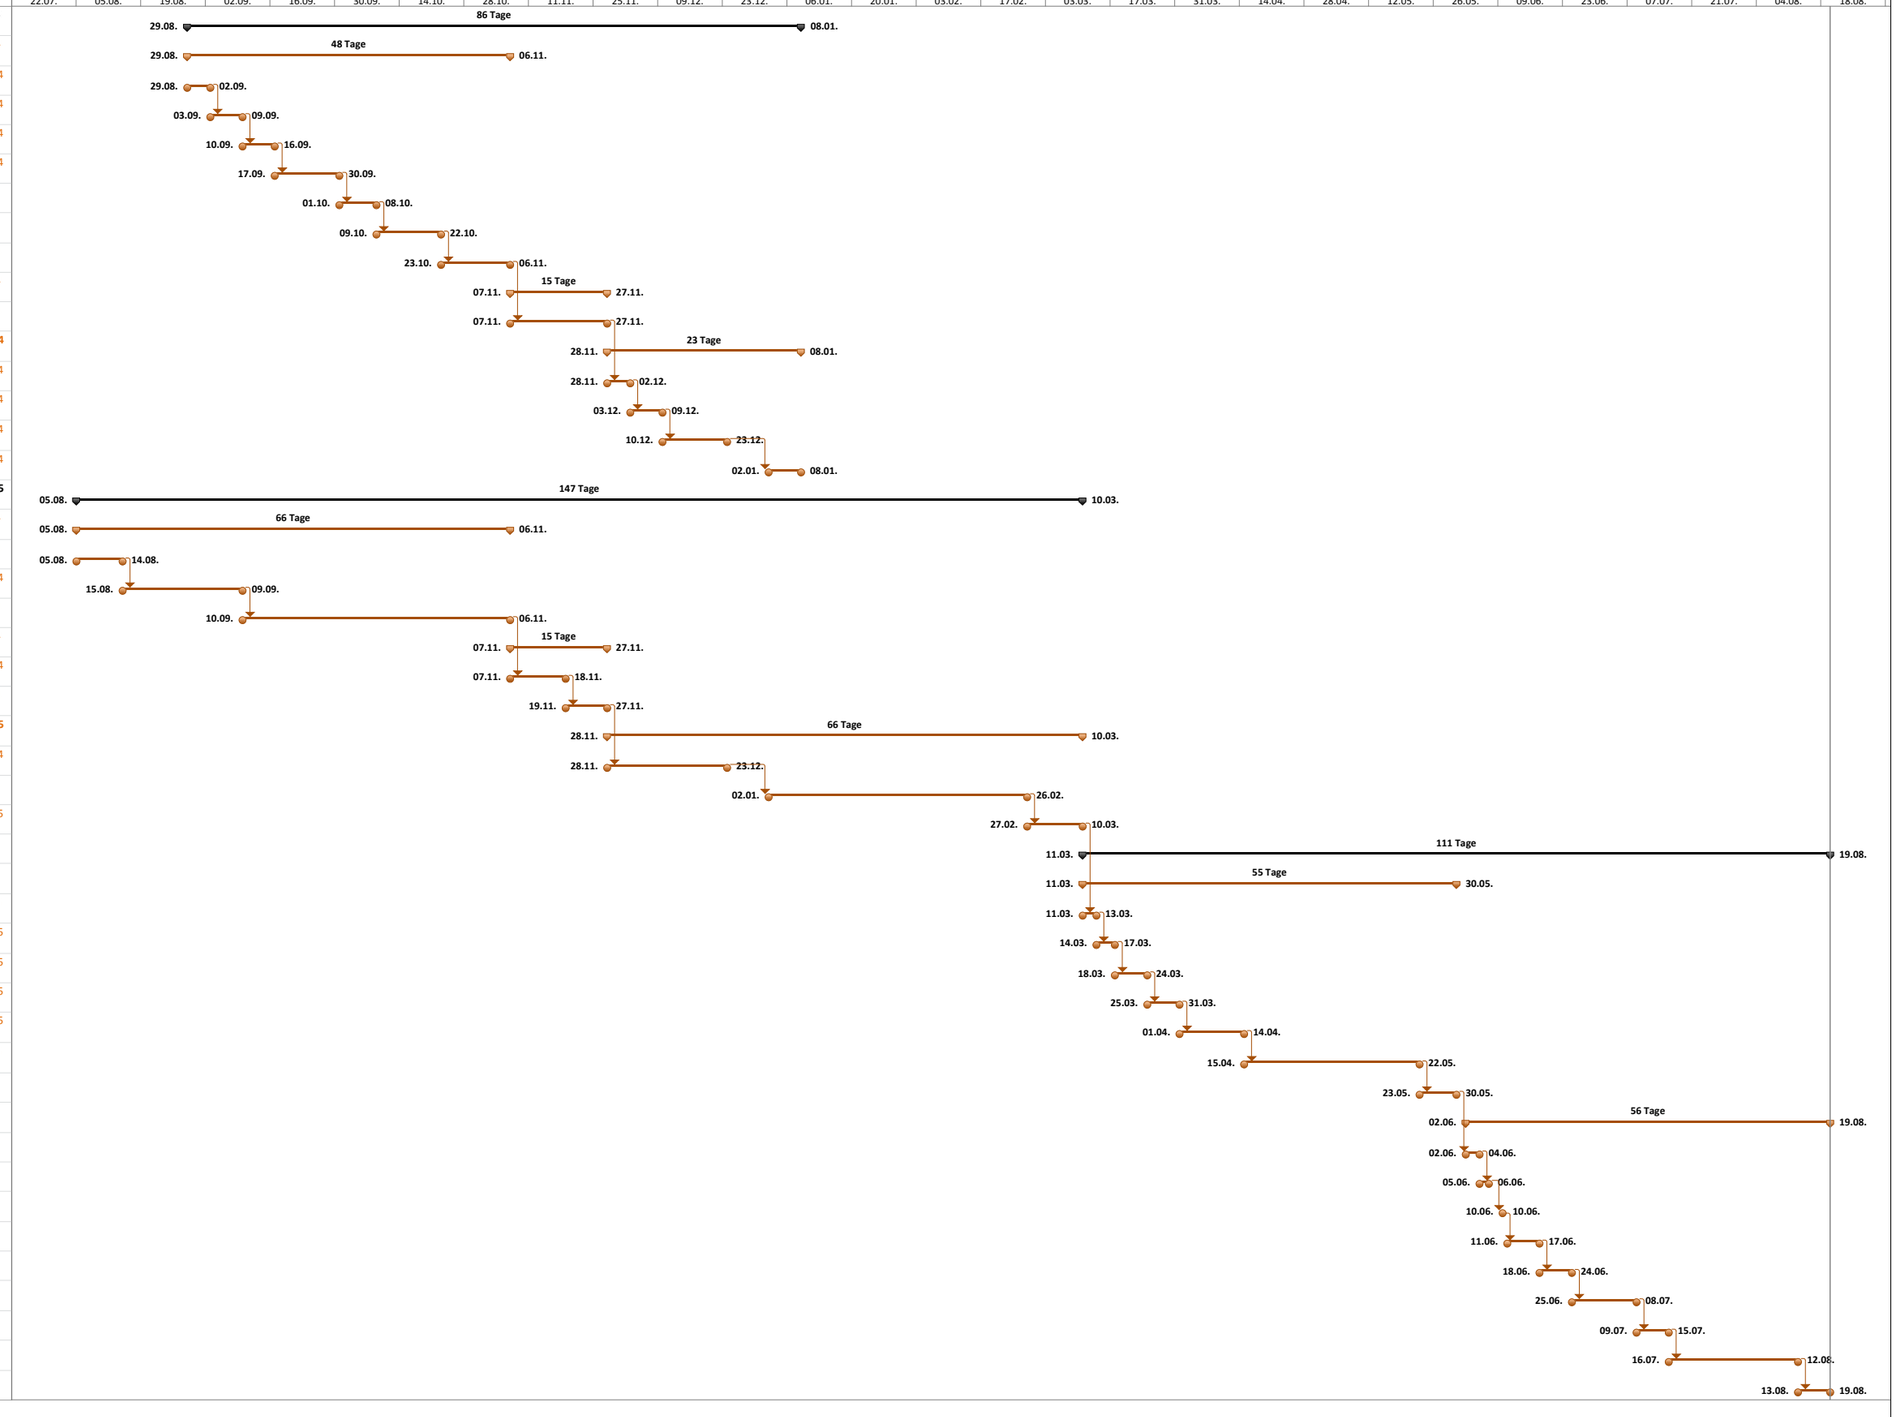

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**B8 - Bahnhof Henstedt Ulzburg**	**218 Tage**	**Mo 13.02.23**	**Fr 22.12.23**
2		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Ostseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**109 Tage**	**Mo 13.02.23**	**Do 20.07.23**
3		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Mo 13.02.23	Mi 15.02.23
4		1.2 - im südlichen Bereich Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen und Bahnsteigerhöhung herstellen	15 Tage	Do 16.02.23	Mi 08.03.23
5		2.1 - Rückbau Wandvorlagen, Rankgitter im Bereich Bahnsteigverlängerung	5 Tage	Mo 13.02.23	Fr 17.02.23
6		2.2 - Herstellung Baugrube einschl. Erdaushub	16 Tage	Mo 20.02.23	Mo 13.03.23
7		2.3 - Herstellung Neue Wand	20 Tage	Di 14.03.23	Mi 12.04.23
8		2.4 - Abbruch vorhandene Wand, einschl. Anpassung Ankerköpfe	30 Tage	Do 13.04.23	Fr 26.05.23
9		2.5 - Rückbau Baugrube, einschl. Verfüllung	10 Tage	Di 30.05.23	Mo 12.06.23
10		3 - Herstellung Bahnsteigverlängerung, einschl. Kabeltrassenanpassung	18 Tage	Di 13.06.23	Do 06.07.23
11		4 - Anbringung Wandfliesen im Bereich Bahnsteigverlängerung, Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Fr 07.07.23	Do 20.07.23
12		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**109 Tage**	**Fr 21.07.23**	**Fr 22.12.23**
13		5.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen	3 Tage	Fr 21.07.23	Di 25.07.23
14		5.2 - im südlichen Bereich Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein ausbauen und Bahnsteigerhöhung herstellen	15 Tage	Mi 26.07.23	Di 15.08.23
15		6.1 - Rückbau Wandvorlagen, Rankgitter im Bereich Bahnsteigverlängerung	5 Tage	Fr 21.07.23	Do 27.07.23
16		6.2 - Herstellung Baugrube einschl. Erdaushub	16 Tage	Fr 28.07.23	Fr 18.08.23
17		6.3 - Herstellung Neue Wand	20 Tage	Mo 21.08.23	Fr 15.09.23
18		6.4 - Abbruch vorhandene Wand, einschl. Anpassung Ankerköpfe	30 Tage	Mo 18.09.23	Mo 30.10.23
19		6.5 - Rückbau Baugrube, einschl. Verfüllung	10 Tage	Mi 01.11.23	Di 14.11.23
20		7 - Herstellung Bahnsteigverlängerung, einschl. Kabeltrassenanpassung	18 Tage	Mi 15.11.23	Fr 08.12.23
21		8 - Anbringung Wandfliesen im Bereich Bahnsteigverlängerung, Bahnsteigausstattung einbauen	10 Tage	Mo 11.12.23	Fr 22.12.23
22		**B8 - Bahnhof Kaltenkirchen Süd**	**138 Tage**	**Mo 08.01.24**	**Fr 26.07.24**
23		**Gleis Richtung Kaltenkirchen durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Ostseite) - Keine WE- und Nachtarbeit**	**69 Tage**	**Mo 08.01.24**	**Mo 15.04.24**
24		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen im südlichen Bereich	3 Tage	Mo 08.01.24	Mi 10.01.24
25		1.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein und Zuwegung im südlichen Bereich ausbauen	8 Tage	Do 11.01.24	Mo 22.01.24
26		1.3 - Bahnsteigzugang herstellen	10 Tage	Di 23.01.24	Mo 05.02.18
27		1.4 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein, Pflasterung und Kabeltrassenanpassung im südlichen	10 Tage	Di 06.02.24	Mo 19.02.24
28		2.1 - Herstellung Bahnsteigverlängerung, einschl. Kabeltrassenanpassung im nördlichen Bereich	33 Tage	Di 20.02.24	Mo 08.04.24
29		2.2 - Bahnsteigausstattung einbauen	5 Tage	Di 09.04.24	Mo 15.04.24
30		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - keine WE- und Nachtarbeit**	**36 Tage**	**Di 16.04.24**	**Fr 07.06.24**
31		3.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen im südlichen Bereich	3 Tage	Di 16.04.24	Do 18.04.24
32		3.2 - Bahnsteigpflaster einschl. Abdeckstein und Zuwegung im südlichen Bereich ausbauen	8 Tage	Fr 19.04.24	Di 30.04.24
33		3.3 - Bahnsteigzugang herstellen	10 Tage	Do 02.05.24	Do 16.05.24
34		3.4 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Erhöhungsstein, Abdeckstein, Pflasterung und Kabeltrassenanpassung im südlichen	10 Tage	Fr 17.05.24	Fr 31.05.24
35		4.1 - Herstellung Bahnsteigverlängerung, einschl. Kabeltrassenanpassung im nördlichen Bereich	5 Tage	Mo 03.06.24	Fr 07.06.24
36		**Beide Gleise gesperrt - Keine WE- und Nachtarbeit**	**28 Tage**	**Mo 10.06.24**	**Mi 17.07.24**
37		4.1 - Herstellung Bahnsteigverlängerung, einschl. Kabeltrassenanpassung im nördlichen Bereich	28 Tage	Mo 10.06.24	Mi 17.07.24
38		**Gleis Richtung Eidelstedt durchgehend gesperrt, Sperrung des Bahnsteiges (Westseite) - keine WE- und Nachtarbeit**	**5 Tage**	**Mo 22.07.24**	**Fr 26.07.24**
39		4.2 - Bahnsteigausstattung einbauen	5 Tage	Mo 22.07.24	Fr 26.07.24
40		**B9 - Bahnhof Kaltenkirchen**	**67 Tage**	**Mo 29.07.24**	**Mi 30.10.24**
41		**Sperrung des Bahnsteiges im östlichen Bereich, Sperrung Zugang Ost**	**26 Tage**	**Mo 29.07.24**	**Mo 02.09.24**
42		1.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen und Ausbau Bahnsteigplattenbelag	8 Tage	Mo 29.07.24	Mi 07.08.24
43		1.2 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Einbau Bahnsteigausstattung	18 Tage	Do 08.08.24	Mo 02.09.24
44		**Sperrung des Bahnsteiges im westlichen Bereich, Sperrung Zugang West**	**41 Tage**	**Di 03.09.24**	**Mi 30.10.24**
45		2.1 - Bahnsteigausstattung ausbauen und Ausbau Bahnsteigplattenbelag	8 Tage	Di 03.09.24	Do 12.09.24
46		2.2 - Herstellung Bahnsteigerhöhung, einschl. Einbau Bahnsteigausstattung	18 Tage	Fr 13.09.24	Mi 09.10.24
47		2.3 - Anpassung Fahrstuhl	15 Tage	Do 10.10.24	Mi 30.10.24

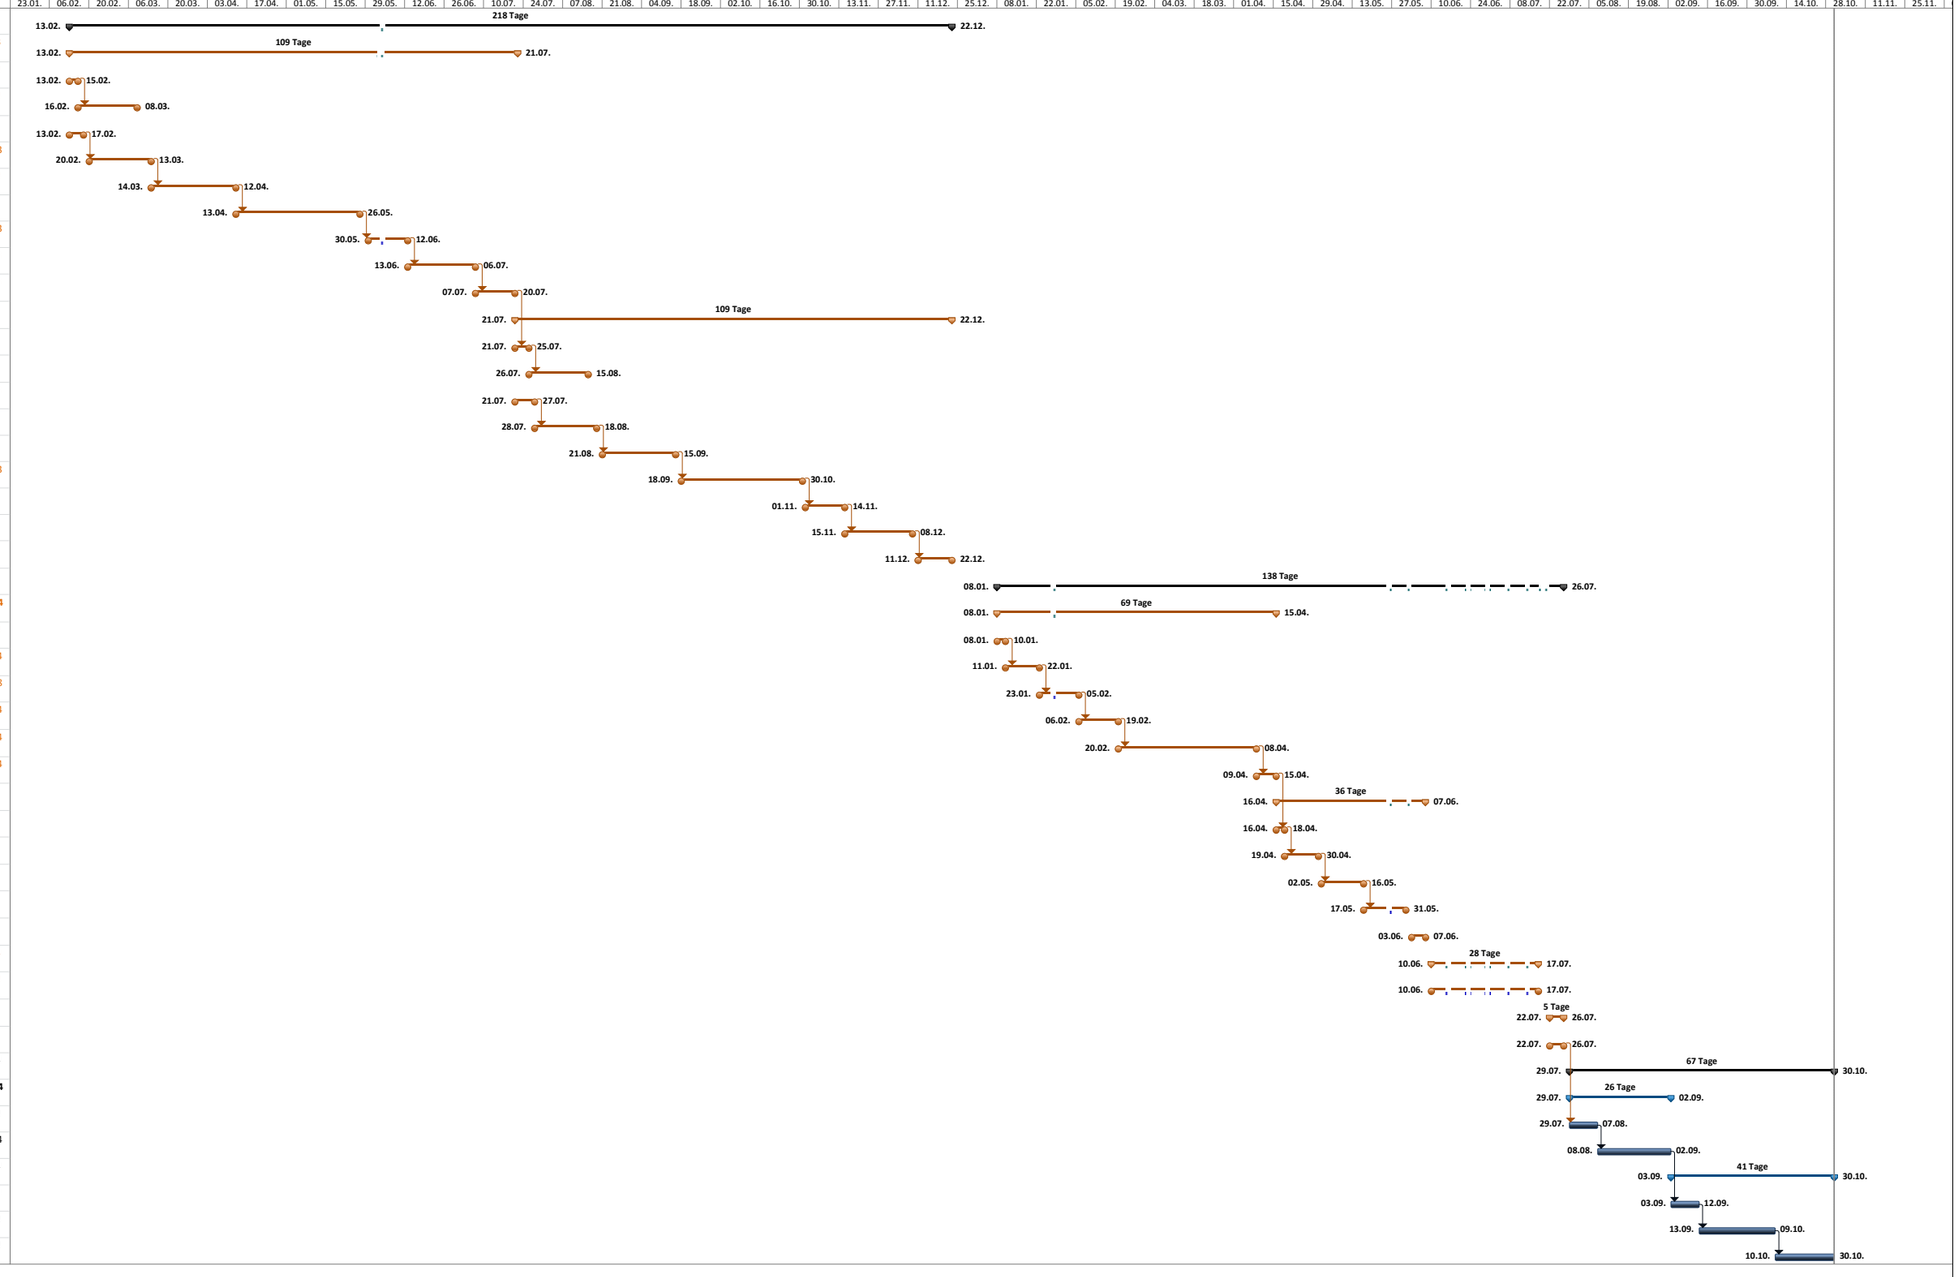

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**C1 - Durchlass Viehtrift, km 21,8 bis 21,9+29**	**84 Tage**	**Fr 13.01.23**	**Di 22.08.23**
2		1 - Einbringen bauzeitliche Spundwand, einschl. Gurtung und Rückverankerung - WOCHENENDSPERRPAUSE (Fr. 22.00 Uhr - Mo. 4.00	4 Tage	Fr 13.01.23	Mo 16.01.23
3		2 - Abtragen Böschung Ost	2 Tage	Di 17.01.23	Mi 18.01.23
4		3 - Herstellen Stahlbetonbauwerk auf östlicher Seite	21 Tage	Do 19.01.23	Do 16.02.23
5		3 - Seitliche Bauwerksabdichtung und Drainage herstellen	5 Tage	Do 02.03.23	Mi 08.03.23
6		4.1 - Herstellung Dammbauwerk für Gleis 2; Einbau Zementverfestigung	2 Tage	Do 09.03.23	Fr 10.03.23
7		4.2 - Temporäre Verfüllung Durchlass mit Sand	2 Tage	Mo 13.03.23	Di 14.03.23
8		4.3 - Rückbau Ankerköpfe und Gurtung; Fertigstellung Wände und Deckenplatte im Bereich des Spundwandkopfes	5 Tage	Mi 15.03.23	Di 21.03.23
9		5 - Rückbau Gleis 1 auf ca. 30 m Länge	1 Tag	Mo 12.06.23	Mo 12.06.23
10		6 - Ziehen der Spundbohlen im Bereich des Durchlasses; Einbau Gurtung am Spundwandkopf, Rückverankerung mit Litzenankern	2 Tage	Di 13.06.23	Mi 14.06.23
11		7 - Rückbau Damm im Bereich Gleis 1	4 Tage	Do 15.06.23	Di 20.06.23
12		8 - Herstellung Stahlbetonbauwerk auf westlicher Seite	20 Tage	Mi 21.06.23	Di 18.07.23
13		8 - Seitliche Bauwerksabdichtung und Drainage herstellen	5 Tage	Di 01.08.23	Mo 07.08.23
14		9.1 - Herstellung Dammbauwerk für Gleis 1; Eibau Zementverfestigung	2 Tage	Di 08.08.23	Mi 09.08.23
15		9.2 - Rückbau Ankerköpfe und Gurtung; Fertigstellung Wände und Deckenplatte im Bereich des Spundwandkopfes	4 Tage	Do 10.08.23	Di 15.08.23
16		9.3 - Spundwand auf ca. NN+21,3 m abtrennen - 2 Nachtsperrpausen von 0:00 bis 4:30 Uhr	2 Tage	Mi 16.08.23	Do 17.08.23
17		10 - Rückbau alter Durchlass im oberen Bereich	3 Tage	Fr 18.08.23	Di 22.08.23

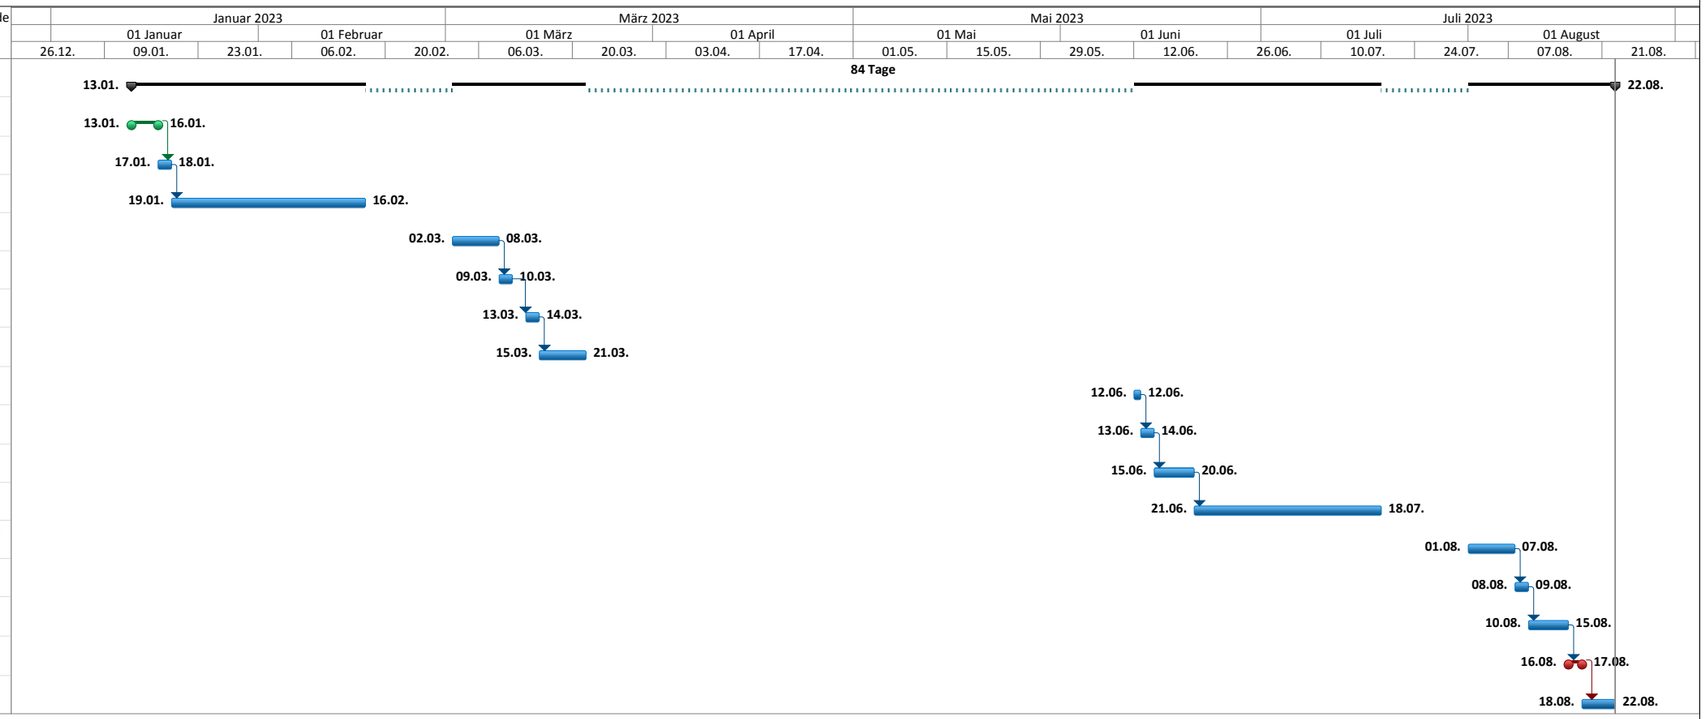

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**C2 - Brücke über die Gronau - km 22,0+17 bis km 22,0+52**	**258 Tage**	**Mo 09.01.23**	**Mi 28.02.24**
2		1 - Baustraßen und BE-Flächen herstellen, Bereich BÜ Feldbehnsweg bis Bahnstraße	10 Tage	Mo 09.01.23	Fr 20.01.23
3		2.1 - Absteifung Uferwand; Neubau Uferwand (Spundwand) östlich und westlich der alten Wand; Bauzeitliche Querung einrichten	5 Tage	Mo 23.01.23	Fr 27.01.23
4		2.2 - Rückbau existierender Trägerbohlverbau auf der Ostseite; Abtragen Mutterboden Böschung Ost	5 Tage	Mo 30.01.23	Fr 03.02.23
5		3.1 - Einbringung Spundwände im Bereich Gleis 2, südlich und nördlich der Gronau (einschl. 16 Nachtschichten von 0:30 bis 4:30)	20 Tage	Mo 06.02.23	Fr 03.03.23
6		3.2 - Montage Gurtung und Verankerung für den Fangedamm, einschl. Verfüllung bis UK Holm; Herstellen Stahlbetonholm und Auflagerbereich für das Widerlager, südlich und nördlich der Gronau	20 Tage	Mo 06.03.23	Fr 31.03.23
7		3.3 - Herstellung WIB-Brücke Ostseite	10 Tage	Mo 03.04.23	Di 18.04.23
8		3.4 - Verfüllung Widerlager mit Sand und zementverfestigung	2 Tage	Mo 24.04.23	Di 25.04.23
9		3.5 - Herstellen Abdichtung und Schutzbeton auf Brücke	5 Tage	Do 04.05.23	Mi 10.05.23
10		3.6 - Herstellung Sockel für Gleisbefestigung auf der Brücke	10 Tage	Do 11.05.23	Do 25.05.23
11		4 - Rückbau Gleis 1 und Aushub vorhandene Stahlbrücke, in ca. 4 Segmente teilen, verladen und entsorgen	5 Tage	Mi 07.06.23	Di 13.06.23
12		5.1 Bodenaushub (Bahndamm) und Rückbau Widerlager Nord bis Geländeoberkante, ca. NN+17,3 m	8 Tage	Mi 14.06.23	Fr 23.06.23
13		5.2 - Entfernen der temporären Aussteifung der alten Uferwände; Temporäre Spundwand im Bereich der Gronau einbringen	5 Tage	Mo 26.06.23	Fr 30.06.23
14		5.1 - Rückbau alte Uferwand (Stahlbeton)	3 Tage	Mo 03.07.23	Mi 05.07.23
15		5.2 - Lückenschluss neue Uferwand herstellen (Einbringen Spundwand)	3 Tage	Do 06.07.23	Mo 10.07.23
16		5.2 - Rückbau temporäre Spundwand an der Gronau; Ergänzung temporäre Spundwand auf der Nordseite	5 Tage	Di 11.07.23	Mo 17.07.23
17		5.1 - Bodenaushub unter Wasser; Rückbau Widerlager Nord	3 Tage	Di 18.07.23	Do 20.07.23
18		5.1 - Verfüllung Baugrube	2 Tage	Fr 21.07.23	Mo 24.07.23
19		6 - Bauzeitliche Querung der Gronau auf der Westseite einrichten	5 Tage	Di 25.07.23	Mo 31.07.23
20		5.1 Bodenaushub (Bahndamm) und Rückbau Widerlager Süd bis Geländeoberkante, ca. NN+17,3 m	8 Tage	Di 01.08.23	Do 10.08.23
21		5.2 - Rückbau temporäre Spundwand auf der Nordseite; Ergänzung temporäre Spindwand auf der Südseite	8 Tage	Fr 11.08.23	Di 22.08.23
22		5.1 - Bodenaushub; unter Wasser; Rückbau Widerlager Süd	3 Tage	Mi 23.08.23	Fr 25.08.23
23		5.1 - Verfüllung Baugrube	2 Tage	Mo 28.08.23	Di 29.08.23
24		5.2 - Rückbau temporäre Spundwände auf Südseite	3 Tage	Mi 30.08.23	Fr 01.09.23
25		7.1 - Einbringung Spundwände im Bereich Gleis 2, südlich und nördlich der Gronau	20 Tage	Mo 04.09.23	Fr 29.09.23
26		7.2 - Montage Gurtung und Verankerung für den Fangedamm, einschl. Verfüllung bis UK Holm; Herstellung Stahlbetonholm und und Auflagerbereich für das Widerlager, südlich und nördlich der Gronau	20 Tage	Mo 02.10.23	Mo 30.10.23
27		7.3 - Herstellung WIB-Brücke Westseite, einschl. 1 Nachtschicht von 0:30 bis 4:30 für Pagelverguß Betonierfuge Brücke	10 Tage	Mi 01.11.23	Di 14.11.23
28		7.4 - Verfüllung Widerlager mit Sand und Zementverfestigung; Herstellen Kappe Westseite	12 Tage	Mo 27.11.23	Di 12.12.23
29		7.5 - Herstellen Abdichtung und Schutzbeton auf Brücke	5 Tage	Mi 13.12.23	Di 19.12.23
30		7.6 - Herstellung Sockel für Gleisbefestigung auf der Brücke	10 Tage	Di 02.01.24	Mo 15.01.24
31		8 - Rückbau der bauzeitlichen Querung über die Gronau	3 Tage	Di 16.01.24	Do 18.01.24
32		9 - Abbruch bauzeitliche Schienenauflager, Herstellung Kappe und Herstellung endgültige Schienenauflagerung	28 Tage	Mo 29.01.24	Mi 06.03.24

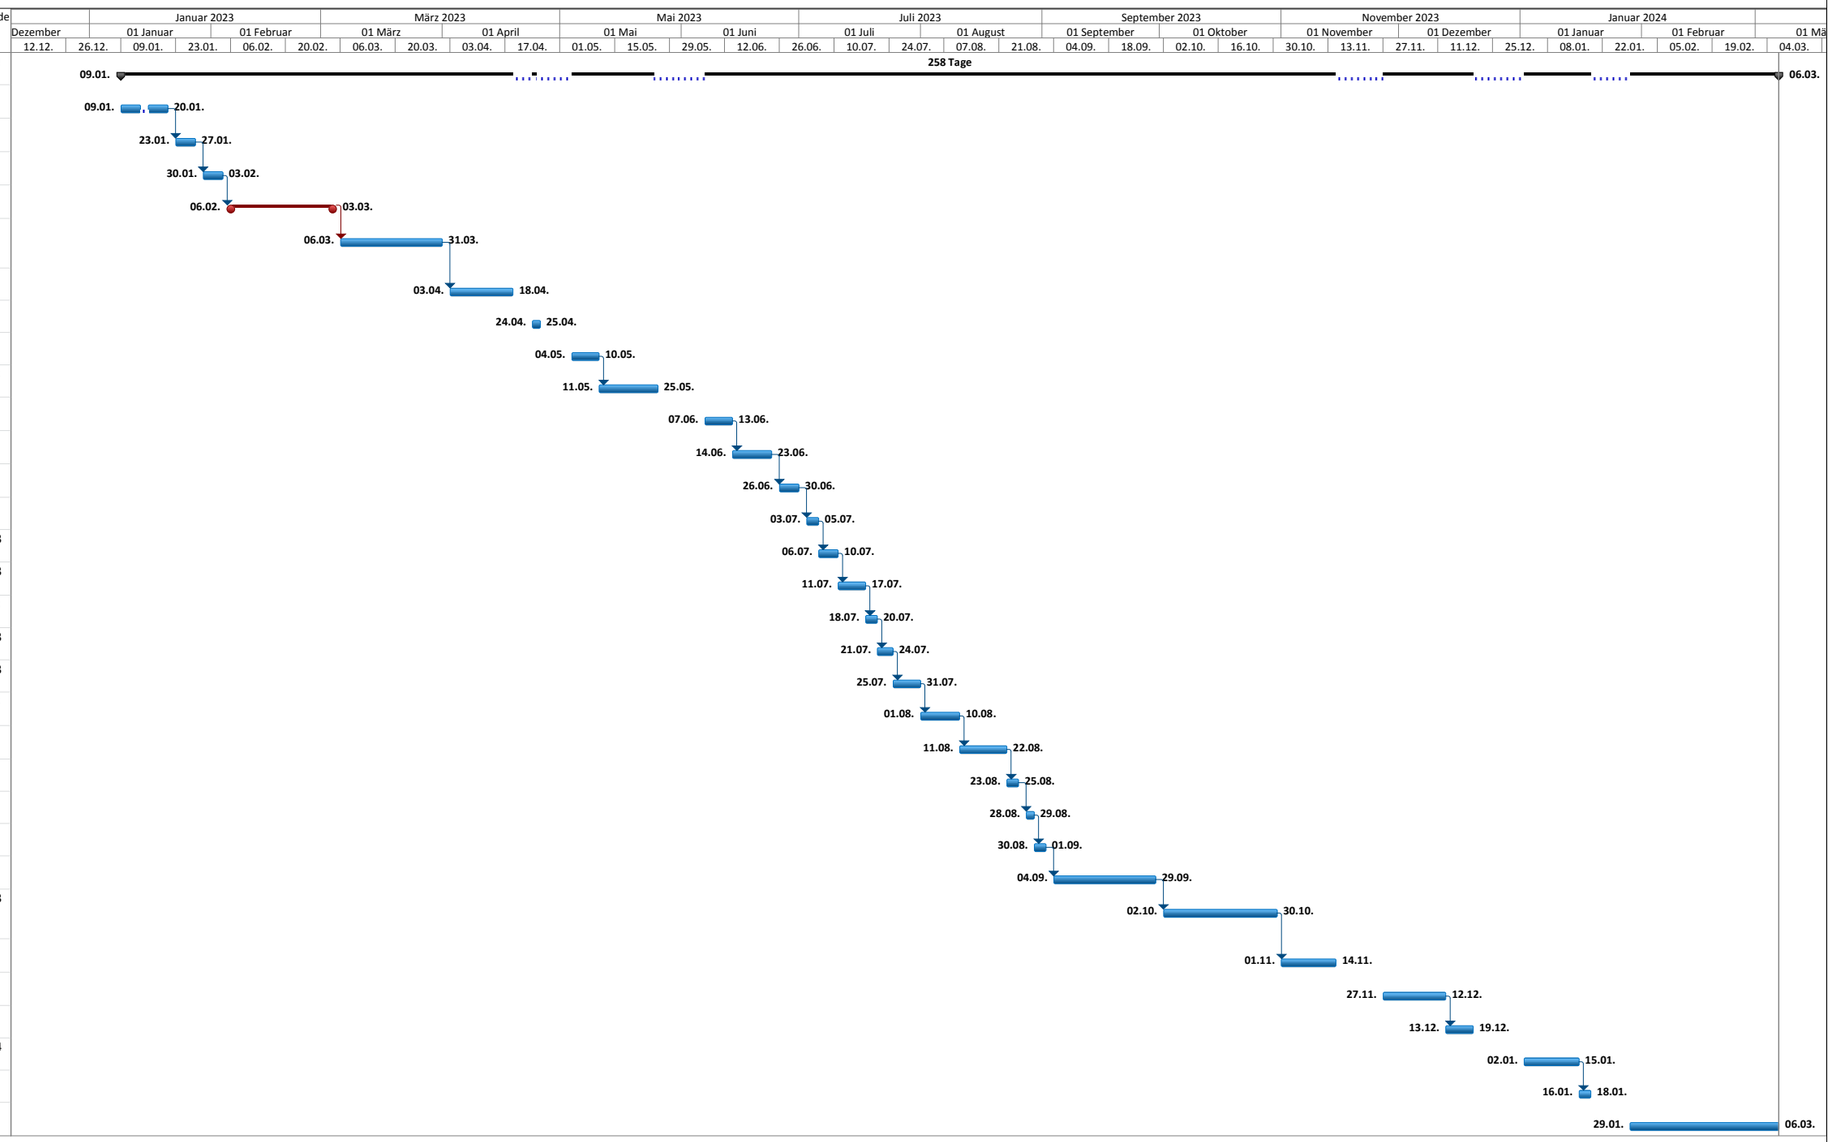

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**C3 - Fußgängertunnel Bahnstraße, km 22,3+99 - 22,4+83**	**146 Tage**	**Do 28.09.23**	**Di 14.05.24**
2		1 - Herstellung BE-Fläche Privatanlieger	2 Tage	Do 28.09.23	Fr 29.09.23
3		2 - Abbruch Tunnelportal und Wandbereiche sowie Herstellung Wände und neues Tunnelportal	56 Tage	Mo 02.10.23	Mi 20.12.23
4		3 - Erdaushub und Herstellung Baugrube (Spundwand)	10 Tage	Mo 08.01.24	Fr 19.01.24
5		4. Abbruch Rampe - 1. Teil	10 Tage	Mo 22.01.24	Fr 02.02.24
6		5 - Herstellung Rampe - Erdbau, Sauberkeitsschicht, Sohle, Wand	30 Tage	Mo 05.02.24	Fr 15.03.24
7		6 - Rückbau Gehweg - 1. Teil	4 Tage	Mo 18.03.24	Do 21.03.24
8		7 - Herstellung Gehweg in neuer Lage - 1. Teil	10 Tage	Fr 22.03.24	Mo 08.04.24
9		4 - Abbruch Rampe - 2. Teil	10 Tage	Di 09.04.24	Mo 22.04.24
10		6 - Rückbau Gehweg - 2. Teil	6 Tage	Di 23.04.24	Di 30.04.24
11		7 - Herstellung Gehweg - 2. Teil	4 Tage	Do 02.05.24	Di 07.05.24
12		8 - Spundwand ausbauen; Verfüllen; Geländerarbeiten	4 Tage	Mi 08.05.24	Di 14.05.24

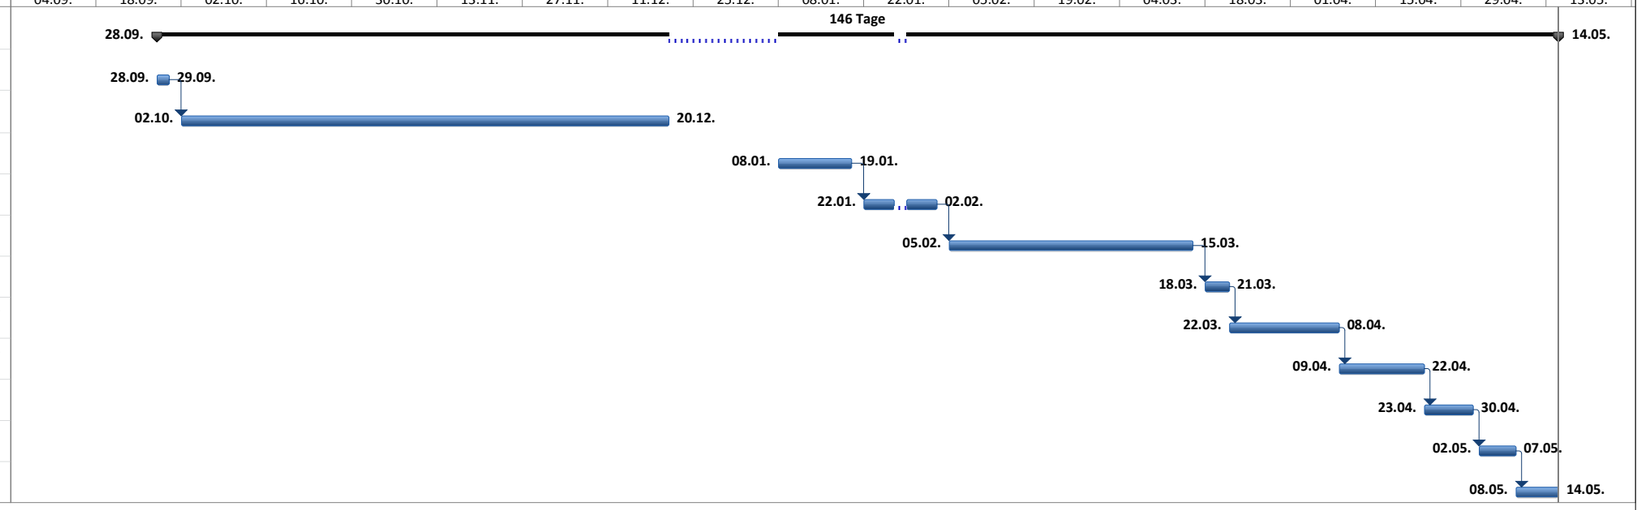

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**E - Neue Weichenverbindungen und Verschiebung Weiche 807**	**28 Tage**	**Do 22.06.23**	**Fr 15.11.24**
2		**E1 - Neue Weichenverbindung Quickborn, km 19,5+72 - 19,6+43, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr**	**7 Tage**	**Do 22.06.23**	**Fr 30.06.23**
3		1.1 - Gleise und Schotter ausbauen, Schotter neu einbauen	2 Tage	Do 22.06.23	Fr 23.06.23
4		1.2 - Weiche einbauen, Gleis montieren	2 Tage	Mo 26.06.23	Di 27.06.23
5		1.3 - Beschottern, Stopfen, Schweißen	3 Tage	Mi 28.06.23	Fr 30.06.23
6		**E2 - Neue Weichenverbindung Ellerau/Quickborn, km 25,1+38 - 25,2+35, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr**	**7 Tage**	**Do 07.11.24**	**Fr 15.11.24**
7		1.1 - Gleise und Schotter ausbauen, Schotter neu einbauen	2 Tage	Do 07.11.24	Fr 08.11.24
8		1.2 - Weiche einbauen, Gleis montieren	2 Tage	Mo 11.11.24	Di 12.11.24
9		1.3 - Beschottern, Stopfen, Schweißen	3 Tage	Mi 13.11.24	Fr 15.11.24
10		**E3 - Verschiebung Weiche 807, km 33,0+60 - 33,3+26, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr**	**7 Tage**	**Mo 10.06.24**	**Mo 17.06.24**
11		1 - Gleise, Schotter und Boden ausbauen	3 Tage	Mo 10.06.24	Mi 12.06.24
12		1 - Einbau PSS und Schotter	1 Tag	Do 13.06.24	Do 13.06.24
13		1 - Weiche einbauen und Gleis montieren	1 Tag	Fr 14.06.24	Fr 14.06.24
14		1 - Beschottern, Stopfen, Schweißen	2 Tage	So 16.06.24	Mo 17.06.24
15		**E4 - Verschiebung Weiche 701, km 23,8+69 - 24,0+24, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr**	**7 Tage**	**Mo 18.11.24**	**Di 26.11.24**
16		1 - Gleise, Schotter und Boden ausbauen	3 Tage	Mo 18.11.24	Mi 20.11.24
17		1 - Einbau PSS und Schotter	1 Tag	Do 21.11.24	Do 21.11.24
18		1 - Weiche einbauen und Gleis montieren	1 Tag	Fr 22.11.24	Fr 22.11.24
19		1 - Beschottern, Stopfen, Schweißen	2 Tage	Mo 25.11.24	Di 26.11.24

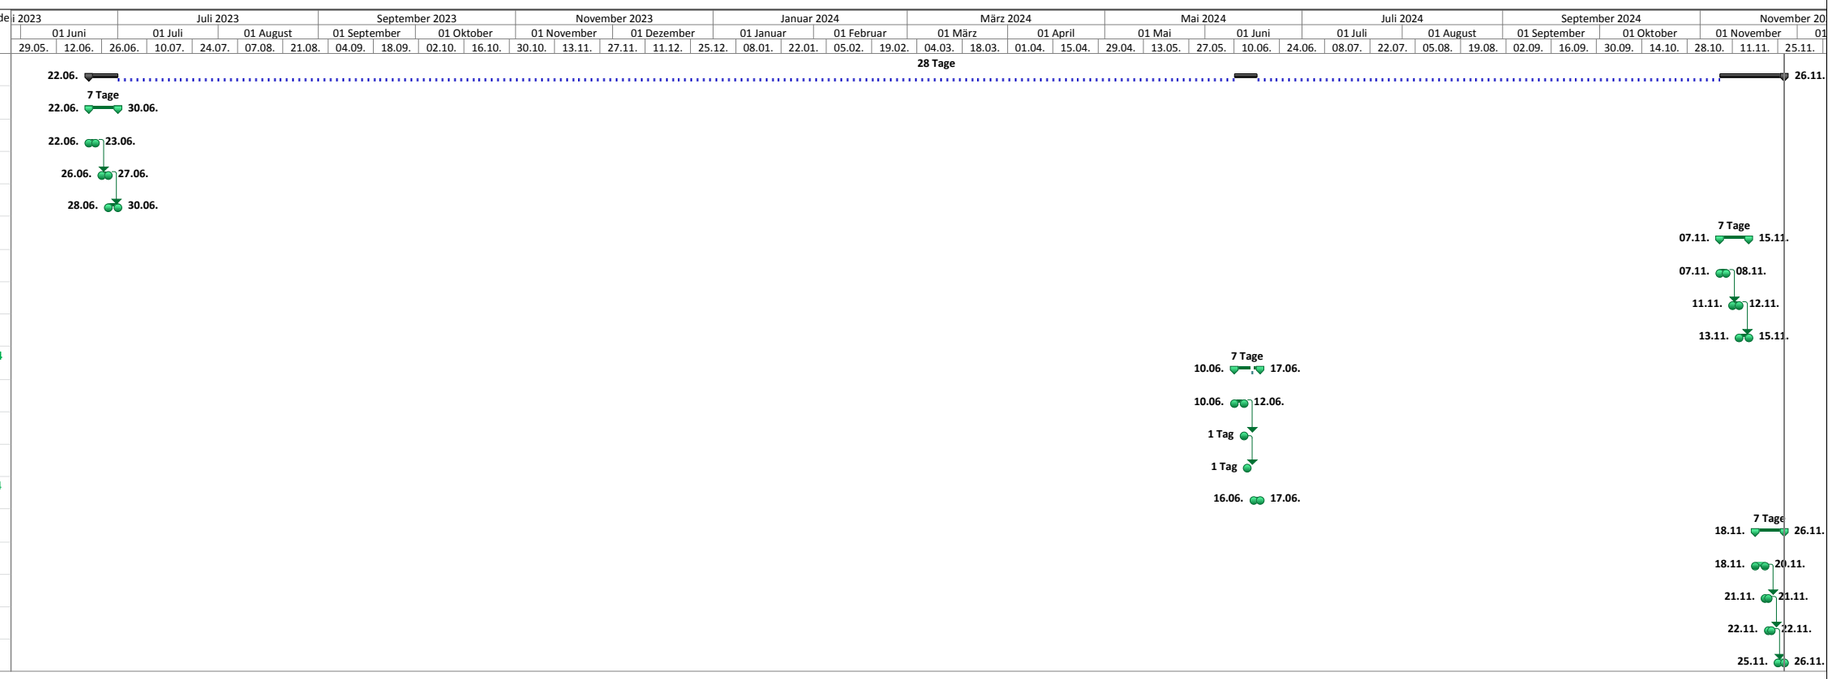

AKN

Entwurf

Stand: 23.07.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**F - Zweigleisiger Ausbau km 20,4+30 bis km 24,0+25**	**196 Tage**	**Mo 23.01.23**	**Mo 23.10.23**
2		**F1 - Zweigleisiger Ausbau km 21,7 bis km 22,3+50 (Bauzustand 1)**	**83 Tage**	**Mo 23.01.23**	**Mo 17.05.21**
3		1.1+1.2 - Oberboden ausbauen, Herstellung Verbreiterung Bahndamm (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	48 Tage	Mo 23.01.23	Mi 29.03.23
4		1.3 - PSS einbauen (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	1 Tag	Di 14.02.23	Di 14.02.23
5		1.3 - PSS einbauen (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	1 Tag	Fr 24.02.23	Fr 24.02.23
6		1.3 - PSS einbauen (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	1 Tag	Mi 08.03.23	Mi 08.03.23
7		1.3 - PSS einbauen (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	1 Tag	Mo 20.03.23	Mo 20.03.23
8		1.3 - PSS einbauen (Arbeitszeit 7:00 bis 20:00)	1 Tag	Mo 03.04.23	Mo 03.04.23
9		1.4 - Schotter einbauen (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	5 Tage	Di 04.04.23	Mi 12.04.23
10		1.5 - Böschung andecken	5 Tage	Do 13.04.23	Mi 19.04.23
11		1.6 - Schienen entladen (2 Nachtschichten 0:30 bis 4:30)	2 Tage	Do 20.04.23	Fr 21.04.23
12		1.7+1.8 - Schwellen anliefern, entladen, einbauen; Gleis montieren	10 Tage	Mo 24.04.23	Mo 08.05.23
13		5 - Weichen liefern und abladen (3 Nachtschichten 0:30 bis 4:30)	3 Tage	Di 09.05.23	Do 11.05.23
14		6 - Weichen vormontieren	5 Tage	Fr 12.05.23	Fr 19.05.23
15		7 - Herstellung und Inbetriebnahme Bauzustand 1 (Sperrpause Fr. 14:00 Uhr bis Mo. 14:00 Uhr)	4 Tage	Fr 02.06.23	Mo 05.06.23
16		**F2 - Zweigleisiger Ausbau km 21,7 bis km 22,2 (Bauzustand 2)**	**7 Tage**	**Mo 22.01.24**	**Mo 29.01.24**
17		1.6 - Schienen entladen (2 Nachtschichten 0:30 bis 4:30)	2 Tage	Mo 22.01.24	Di 23.01.24
18		1.1-1.5+1.7-1.11 - Herstellung und Inbetriebnahme Bauzustand 2, einschl. Rückbau Gleis 1 im Bereich Brücke Gronau (Sperrpause Do. 2:00 Uhr bis Mo. 1:00 Uhr)	5 Tage	Do 25.01.24	Mo 29.01.24
19		**F3 - Zweigleisiger Ausbau km 20,5 bis km 21,7 (nur Vorbau, keine Inbetriebnahme)**	**92 Tage**	**Mo 12.06.23**	**Fr 22.09.23**
20		1 - Baustraßen und BE-Flächen herstellen, km 20,5 bis km 21,7	15 Tage	Mo 12.06.23	Fr 30.06.23
21		2.1 - Erdbau; Aushub und Profilierung km 20,5 - 21,1	50 Tage	Mo 03.07.23	Fr 08.09.23
22		2.1 - Erdbau; Aushub und Profilierung km 21,1 - 21,7	50 Tage	Mo 03.07.23	Fr 08.09.23
23		2.2 - PSS einbauen km 20,5 - 21,1 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mo 17.07.23	Mo 17.07.23
24		2.2 - PSS einbauen km 21,1 - 21,7 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mi 19.07.23	Mi 19.07.23
25		2.2 - PSS einbauen km 20,5 - 21,1 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mo 31.07.23	Mo 31.07.23
26		2.2 - PSS einbauen km 21,1 - 21,7 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mi 02.08.23	Mi 02.08.23
27		2.2 - PSS einbauen km 20,5 - 21,1 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mo 14.08.23	Mo 14.08.23
28		2.2 - PSS einbauen km 21,1 - 21,7 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mi 16.08.23	Mi 16.08.23
29		2.2 - PSS einbauen km 20,5 - 21,1 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mo 28.08.23	Mo 28.08.23
30		2.2 - PSS einbauen km 21,1 - 21,7 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mi 30.08.23	Mi 30.08.23
31		2.2 - PSS einbauen km 20,5 - 21,1 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mo 11.09.23	Mo 11.09.23
32		2.2 - PSS einbauen km 21,1 - 21,7 (Arbeitszeit 7:00 - 20:00)	1 Tag	Mi 13.09.23	Mi 13.09.23
33		2.3 - Schotter einbauen km 20,5 - 21,1	5 Tage	Mo 18.09.23	Fr 22.09.23
34		2.3 - Schotter einbauen, km 21,1 - 21,7	5 Tage	Mo 18.09.23	Fr 22.09.23
35		2.4 - Bahnseitengraben herstellen, Mutterboden andecken, km 20,5 - 21,1	7 Tage	Mo 25.09.23	Mi 04.10.23
36		2.4 - Bahnseitengraben herstellen, Mutterboden andecken, km 21,1 - 21,7	7 Tage	Mo 25.09.23	Mi 04.10.23
37		2.5 - Schienen entladen (4 Nachtschichten 0:30 bis 4:30), km 20,5 - 21,7	4 Tage	Do 05.10.23	Di 10.10.23
38		2.6+2.7 - Schwellen anliefern, einbauen; Gleis montieren, km 20,5 - 21,1	9 Tage	Mi 11.10.23	Mo 23.10.23
39		2.6+2.7 - Schwellen anliefern, einbauen; Gleis montieren, km 21,1 - 21,7	9 Tage	Mi 11.10.23	Mo 23.10.23
40		**F4 - Zweigleisiger Ausbau km 22,3+50 - 22,5+90 (Ostgleis) und km 22,2+90 - 22,6+40 (Westgleis), einschl. Umbau BÜ Bahnstraße (Vollsperrung Straße/Schiene; Arbeitszeit 7.00 - 20.00, einschl.**	**14 Tage**	**Di 21.05.24**	**Mo 03.06.24**
41		1.1 - Bodan-Platten im BÜ Bereich ausbauen, Asphalt fräsen, Verkehrsinsel abbrechen	2 Tage	Di 21.05.24	Mi 22.05.24
42		1.2 - Ausbau Bestandsgleis, einschl. W601, Ausbau Schotter, Bodenaushub, Planum herstellen	3 Tage	Do 23.05.24	Sa 25.05.24
43		2 - Herstellung Gleis - Einbau PSS, Schotter, Gleismontage, Stopfen, Schweißen	6 Tage	So 26.05.24	Fr 31.05.24
44		3 - Gründung LSW km 22,1+57 bis km 22,4+14	3 Tage	Sa 01.06.24	Mo 03.06.24
45		4 - Herstellung Straße, einschl. Einbau Bodan-Platten	3 Tage	Sa 01.06.24	Mo 03.06.24
46		**F5 - Herstellung Endzustand km 20,3+98 bis km 22,6+40 (Vollsperrung der Gleise; Arbeitszeit täglich 7:00 - 20.00 Uhr einschl. Wochenenden)**	**11 Tage**	**Di 21.05.24**	**Mo 03.06.24**
47		1.1 - 1.7 - Gleisumbau km 20,4+30 bis km 20,5+25, einschl. Weiche 525	4 Tage	Di 21.05.24	Fr 24.05.24
48		2.1 - Lieferung Weiche (1 Nachtschicht 0:30 - 4:30) im Bereich Gronau	1 Tag	Di 21.05.24	Di 21.05.24
49		2.2 - Weiche , Gleis montieren im Bereich Gronau	2 Tage	Mi 22.05.24	Do 23.05.24
50		3.1 - Einbau Schotter, km 20,4 - 21,7 Ostgleis, km 20,5+15-20,5+85 Westgleis, Weichenbereich Gronau	5 Tage	Fr 24.05.24	Di 28.05.24
51		3.2 - Stopfen der Bereiche Punkt 3.1	3 Tage	Sa 01.06.24	Mo 03.06.24
52		3.2 - Schienen schweißen	2 Tage	So 02.06.24	Mo 03.06.24

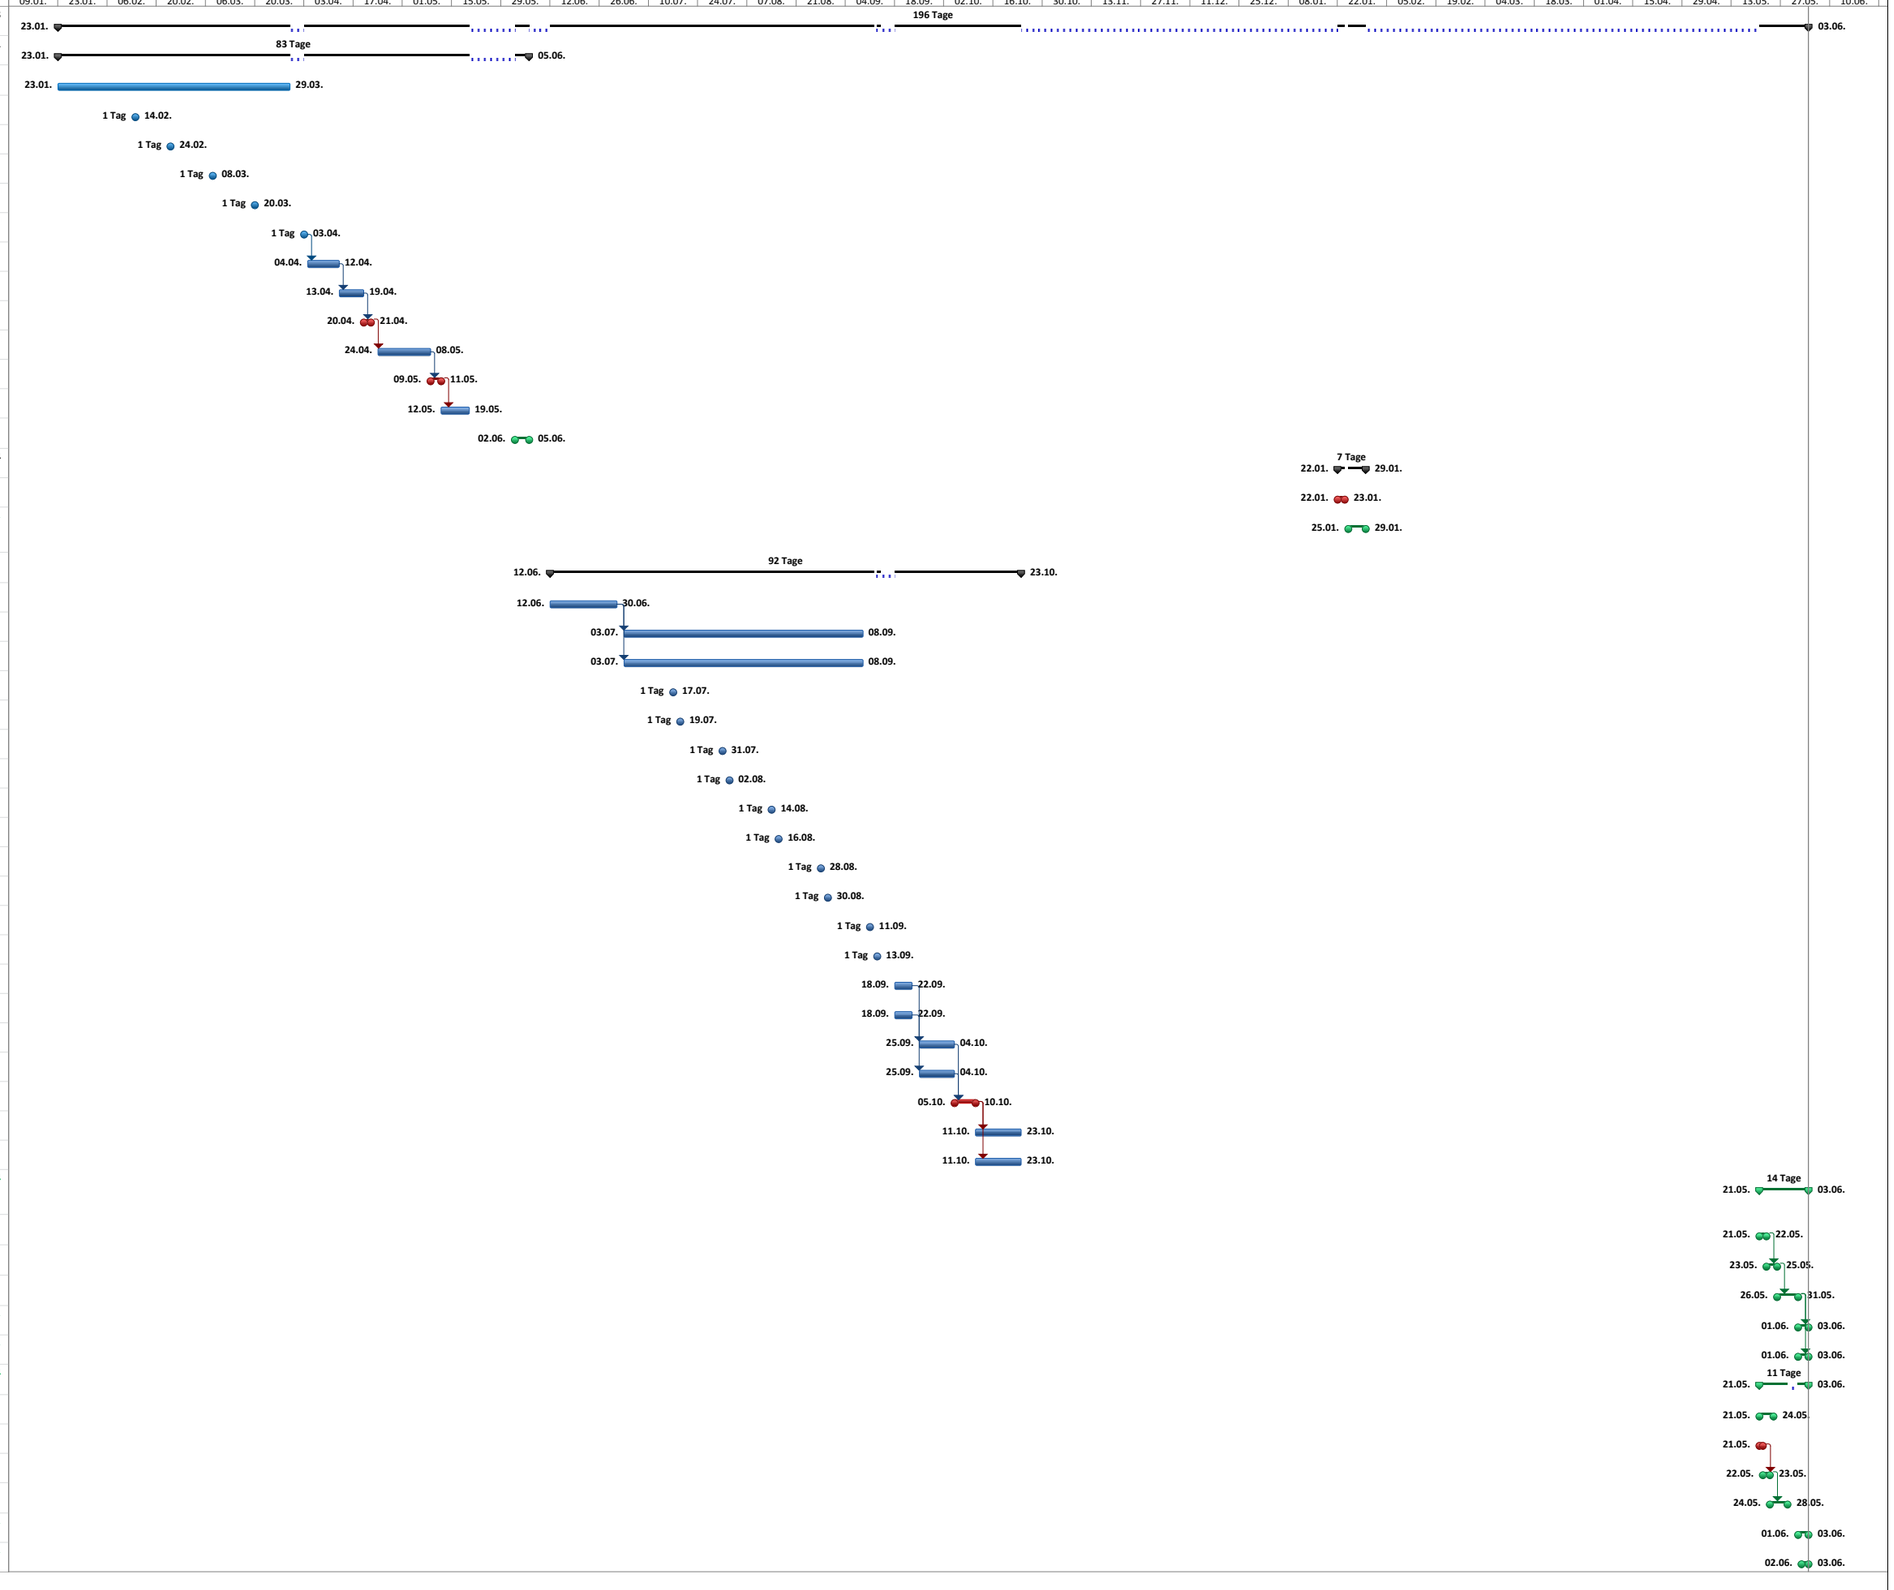

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**G - Absenkung der Gleise**	**42 Tage**	**Mo 10.06.24**	**So 21.07.24**
2		**G1 - Absenkung Gleise Tunnel Ulzburg, km 28,6+52 bis 29,5+19, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr mit Wochenende**	**21 Tage**	**Mo 10.06.24**	**So 30.06.24**
3		1.1 - Rückbau Gleis Ostseite	2 Tage	Mo 10.06.24	Di 11.06.24
4		1.2 - Kabeltiefbau, Einbau Schotter, Gleis Ostseite	1 Tag	Mi 12.06.24	Mi 12.06.24
5		1.3 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Ostseite	6 Tage	Do 13.06.24	Di 18.06.24
6		2.1 - Rückbau Gleis Westseite	2 Tage	Mi 19.06.24	Do 20.06.24
7		1.2 - Kabeltiefbau, Einbau Schotter, Gleis Westseite	1 Tag	Fr 21.06.24	Fr 21.06.24
8		1.3 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Westseite	6 Tage	Sa 22.06.24	Do 27.06.24
9		3 - Anpassung Kabelkanal	3 Tage	Fr 28.06.24	So 30.06.24
10		**G2 - Absenkung der Gleise SÜ Am Bahnbogen, km 29,8+58 bis 30,1+70, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr mit Wochenende**	**28 Tage**	**Mo 10.06.24**	**So 07.07.24**
11		1.1 - 1.2 - Rückbau Gleis Ostseite, Schotterausbau, Erdaushub	8 Tage	Mo 10.06.24	Mo 17.06.24
12		1.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Ostseite	2 Tage	Di 18.06.24	Mi 19.06.24
13		1.4 - 1.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Ostseite	4 Tage	Do 20.06.24	So 23.06.24
14		2.1 - 2.2 - Rückbau Gleis Westseite, Schotterausbau, Erdaushub	8 Tage	Mo 24.06.24	Mo 01.07.24
15		2.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Westseite	2 Tage	Di 02.07.24	Mi 03.07.24
16		2.4 - 2.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Westseite	4 Tage	Do 04.07.24	So 07.07.24
17		**G3 - Absenkung der Gleise SÜ B433, km 31,7+98 - 32,0+35, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr mit Wochenende**	**16 Tage**	**Mo 01.07.24**	**Di 16.07.24**
18		1 - BE-Fläche einrichten	2 Tage	Mo 01.07.24	Di 02.07.24
19		2.1 - 2.2 - Rückbau Gleis Ostseite, Schotterausbau, Erdaushub	4 Tage	Mi 03.07.24	Mo 22.04.24
20		2.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Ostseite	1 Tag	So 07.07.24	So 07.07.24
21		2.4 - 2.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Ostseite	2 Tage	Mo 08.07.24	Di 09.07.24
22		3.1 - 3.2 - Rückbau Gleis Westseite, Schotterausbau, Erdaushub	4 Tage	Mi 10.07.24	Sa 13.07.24
23		3.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Westseite	1 Tag	So 14.07.24	So 14.07.24
24		3.4 - 3.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Westseite	2 Tage	Mo 15.07.24	Di 16.07.24
25		**G4 - Absenkung der Gleise SÜ Feldstraße, km 32,1+40 - 32,3+53, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr mit Wochenende**	**14 Tage**	**Mo 08.07.24**	**So 21.07.24**
26		1.1 - 1.2 - Rückbau Gleis Ostseite, Schotterausbau, Erdaushub	4 Tage	Mo 08.07.24	Do 11.07.24
27		1.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Ostseite	1 Tag	Fr 12.07.24	Fr 12.07.24
28		1.4 - 1.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Ostseite	2 Tage	Sa 13.07.24	So 14.07.24
29		2.1 - 2.2 - Rückbau Gleis Westseite, Schotterausbau, Erdaushub	4 Tage	Mo 15.07.24	Do 18.07.24
30		2.3 - Einbau PSS, Schotter Gleis Westseite	1 Tag	Fr 19.07.24	Fr 19.07.24
31		2.4 - 2.5 - Gleisbau mit Stopfarbeiten, Gleis Westseite	2 Tage	Sa 20.07.24	So 21.07.24

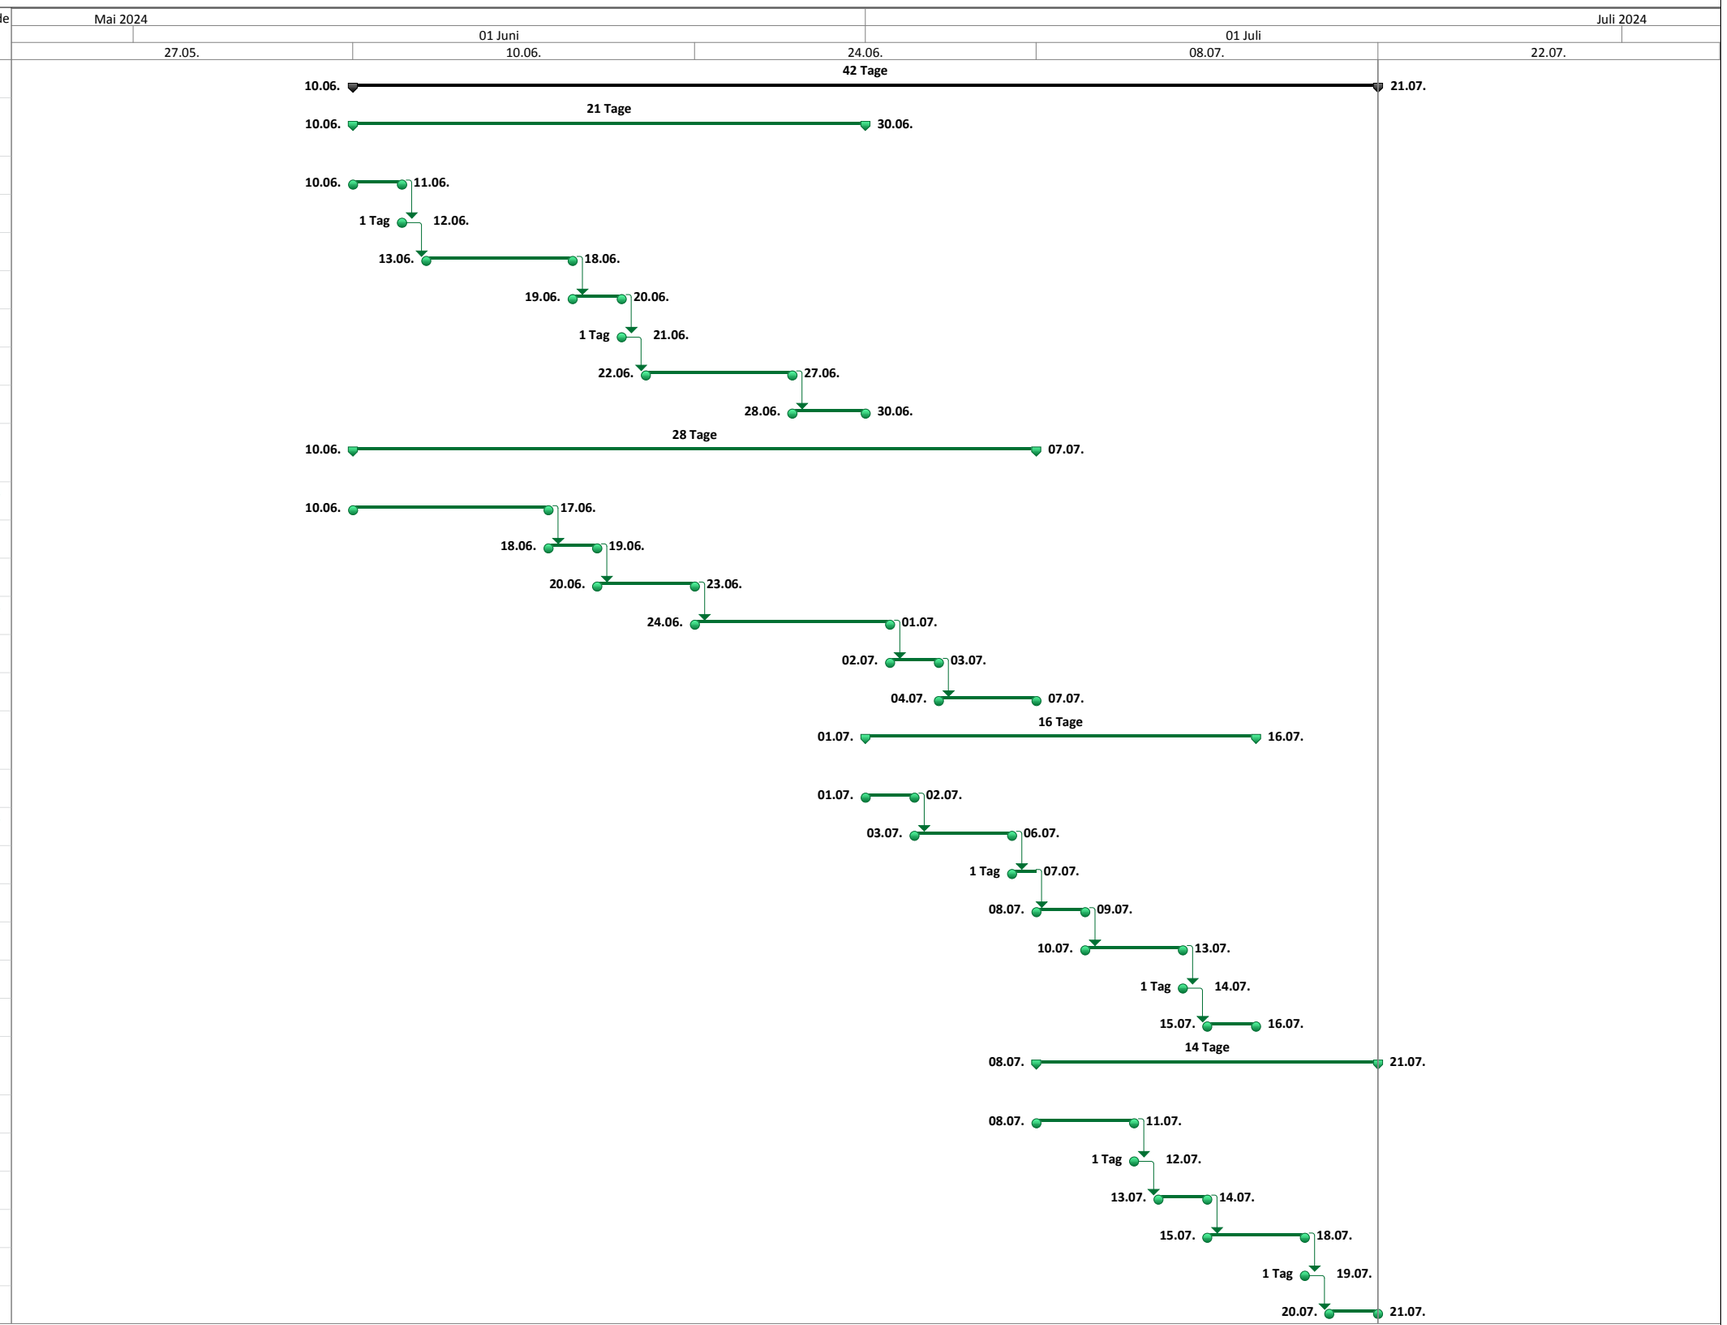

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsnr	Bezeichnung	Dauer	Anfang	Geplantes Ende
1		**H - Gründung OL-Masten und Stellung OL-Masten**	**190 Tage**	**Do 12.01.23**	**Mi 05.03.25**
2		1.1 - km 13,1+25 - 12,2, Ostseite, Sperrung Gleis Richtung Kaltenkirchen, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	3 Tage	Do 12.01.23	Mo 16.01.23
3		1.1 - km 11,1+25 - 12,2, Westseite, Sperrung Gleis Richtung Edelstedt, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	4 Tage	Mi 03.05.23	Mo 08.05.23
4		1.2 - km 12,4 -15,8+40 Ostseite, Sperrung Gleis Richtung Kaltenkirchen, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	10 Tage	Di 17.01.23	Mo 30.01.23
5		1.2 - km 12,4 -15,8+40 Westseite, Sperrung Gleis Richtung Edelstedt, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	10 Tage	Di 09.05.23	Di 23.05.23
6		1.3 - km 16,05+51 - 18,8+80 Ostseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	10 Tage	Fr 24.03.23	Do 06.04.23
7		1.3 - km 16,05+51 - 18,8+80 Westseite , Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	9 Tage	Di 11.04.23	Fr 21.04.23
8		1.3 - km 18,2+40 - 20,0+50 Ostseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	6 Tage	Do 22.06.23	Do 29.06.23
9		1.3 - km 20,5+30 - 22,6+59 Ostseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	7 Tage	Do 07.11.24	Fr 15.11.24
10		1.3 - km 18,8+80 - 22,6+59 Westseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	12 Tage	Fr 30.06.23	Mo 17.07.23
11		1.4 - km 22,6+59 - 24,6 Nord (West)- und Süd (Ost) - Vollsperrung beider Gleise (bzw. eingleisiger Abschnitt), Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne	8 Tage	Mo 18.11.24	Mi 27.11.24
12		1.4 - km 24,6 - 28,8 Ostseite - Sperrung Gleis Richtung Kaltenkirchen, Arbeitszeit 7.00 - 17.20 Uhr ohne Wochenende	13 Tage	Mo 06.01.25	Mi 22.01.25
13		1.4 - km 24,6 - 28,8 Westseite - Sperrung Gleis Richtung Edelstedt, Arbeitszeit 7.00 - 17.20 Uhr ohne Wochenende	15 Tage	Do 23.01.25	Mi 12.02.25
14		1.5 - km 28,8 - 30,0+50 Ost, Sperrung Gleis Richtung Kaltenkirchen, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr ohne Wochenende	10 Tage	Mi 24.05.23	Mi 21.06.23
15		1.5 - km 28,8 - 30,0+50 West, Sperrung Gleis Richtung Edelstedt, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 Uhr ohne Wochenende	20 Tage	Fr 21.07.23	Do 03.08.23
16		1.6 - km 30,0+50 - 33,1+50 Ostseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	13 Tage	Mo 10.06.24	Mi 26.06.24
17		1.6 - km 30,0+50 - 33,1+50 Westseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	13 Tage	Do 27.06.24	Mo 15.07.24
18		1.6 - km 33,1+50 - 34,2+26 Ost- und Westseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	11 Tage	Do 13.02.25	Do 27.02.25
19		1.7 - km 34,2+26 - 34,3+70 Ost- und Westseite, Vollsperrung beider Gleise, Arbeitszeit 7.00 - 17.00 Uhr ohne Wochenende	6 Tage	Fr 28.02.25	Fr 07.03.25

AKN

Entwurf

Stand: 30.10.2018

Nr.	Vorgangsm	Bereichsnummer	Dauer	Anfang	Geplantes Ende	Vorgänger
1		**I - Montage der Oberleitung**	**106 Tage**	**Mo 10.03.25**	**Mo 11.08.25**	
2		1.1 - 1.17 - Montage der Oberleitung, Gleis Ost, km 11,1+25 - 34,3+72, Arbeitsrichtung Landesgrenze Richtung Kaltenkirchen, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 ohne Wochenende, Sperrung des Gleises im jeweiligen	53 Tage	Mo 10.03.25	Mo 26.05.25	
3		2.1 - 2.17 - Montage der Oberleitung, Gleis West, km 11,1+25 - 34,3+72, Arbeitsrichtung Kaltenkirchen Richtung Landesgrenze, Arbeitszeit 7.00 - 20.00 ohne Wochenende, Sperrung des Gleises im jeweiligen	53 Tage	Di 27.05.25	Mo 11.08.25	2
