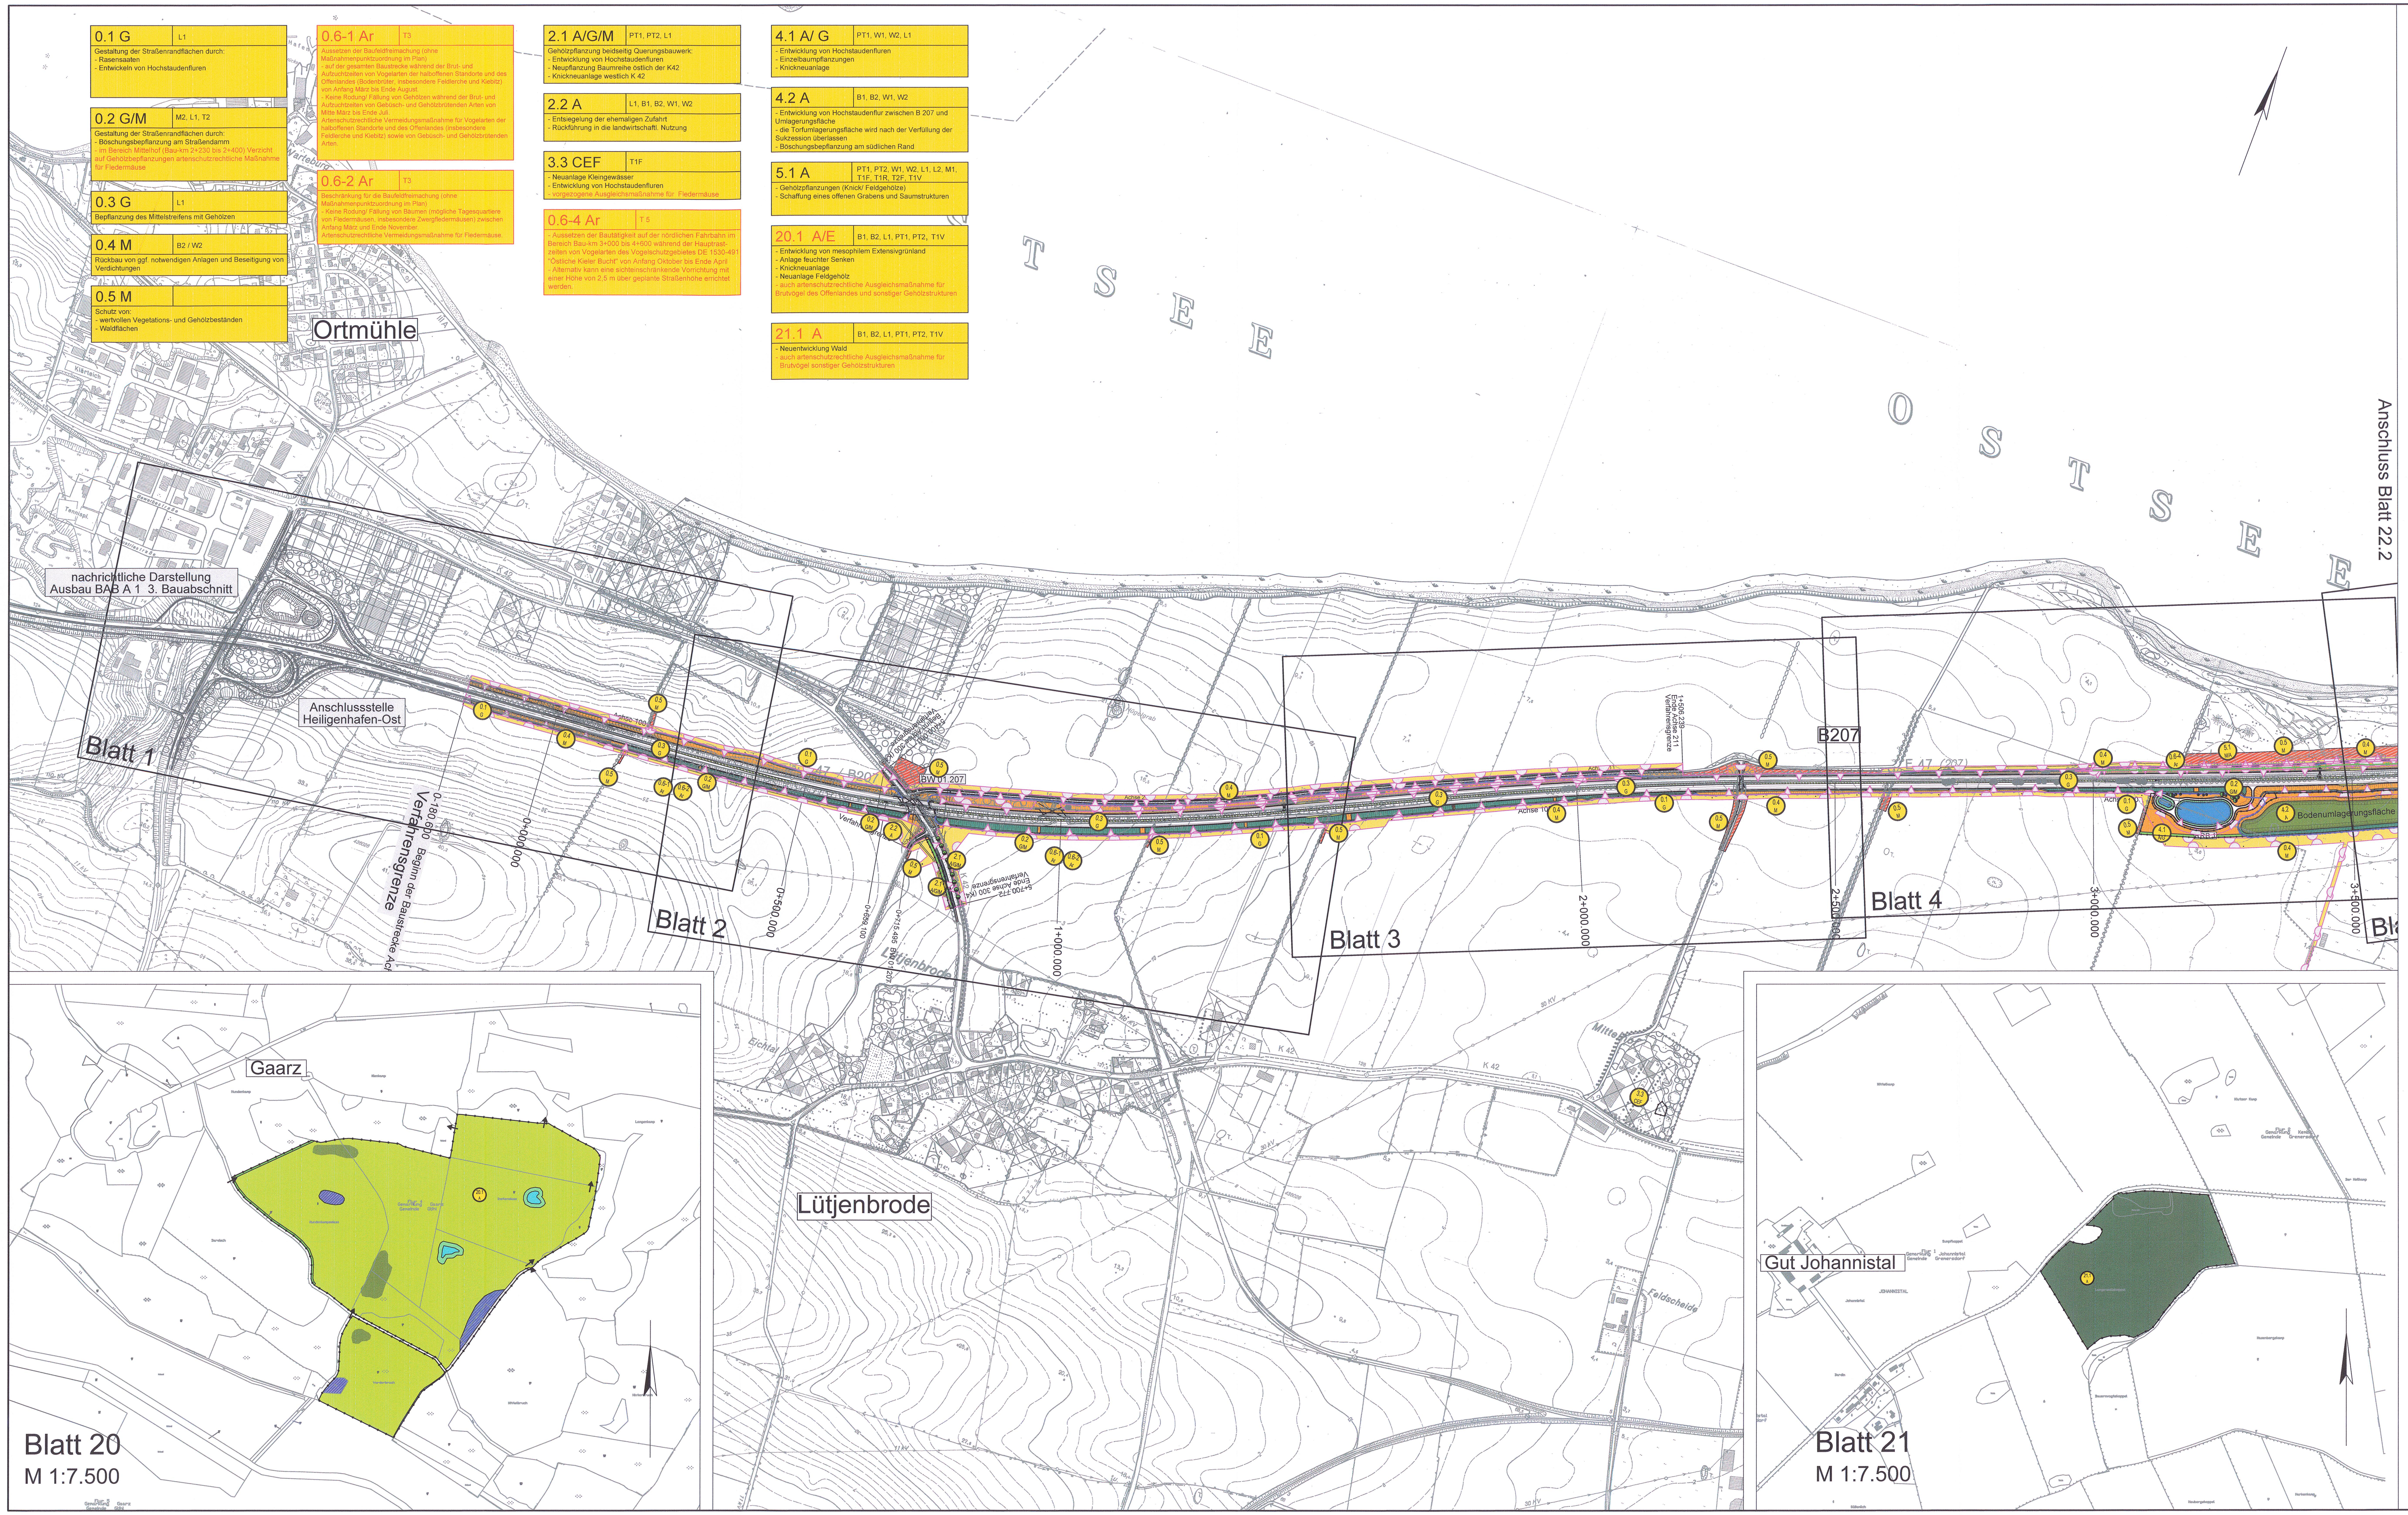

0.1 G	L1
Gestaltung der Straßenrandflächen durch: - Rasensaaten - Entwickeln von Hochstaudenfluren	

0.2 G/M	M2, L1, T2
Gestaltung der Straßenrandflächen durch: - Böschungsbepflanzung am Straßendamm - im Bereich Mittelhof (Bau-km 2+230 bis 2+400) Verzicht auf Gehölzbepflanzungen artenschutzrechtliche Maßnahme für Fledermäuse	

0.3 G	L1
Bepflanzung des Mittelstreifens mit Gehölzen	

0.4 M	B2 / W2
Rückbau von ggf. notwendigen Anlagen und Beseitigung von Verdichtungen	

0.5 M	
Schutz von: - wertvollen Vegetations- und Gehölzbeständen - Waldflächen	

0.6-1 Ar	T3
Aussetzen der Baufeldfreimachung (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan) - auf der gesamten Baustrecke während der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vogelarten der halboffenen Standorte und des Offenlandes (Bodenbrüter, insbesondere Feldlerche und Kiebitz) von Anfang März bis Ende August. - Keine Rodung/ Fällung von Gehölzen während der Brut- und Aufzuchtzeiten von Gebüsch- und Gehölzbrütenden Arten von Mitte März bis Ende Juli. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für Vogelarten der halboffenen Standorte und des Offenlandes (insbesondere Feldlerche und Kiebitz) sowie von Gebüsch- und Gehölzbrütenden Arten.	

0.6-2 Ar	T3
Beschränkung für die Baufeldfreimachung (ohne Maßnahmenpunktzuordnung im Plan) - Keine Rodung/ Fällung von Bäumen (mögliche Tagesquartiere von Fledermäusen, insbesondere Zwergfledermäusen) zwischen Anfang März und Ende November. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme für Fledermäuse.	

2.1 A/G/M	PT1, PT2, L1
Gehölzpflanzung beidseitig Querungsbauwerk: - Entwicklung von Hochstaudenfluren - Neupflanzung Baumreihe östlich der K42 - Knickneuanlage westlich K 42	

2.2 A	L1, B1, B2, W1, W2
- Entsiegelung der ehemaligen Zufahrt - Rückführung in die landwirtschaftl. Nutzung	

3.3 CEF	T1F
- Neuanlage Kleingewässer - Entwicklung von Hochstaudenfluren - vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Fledermäuse	

0.6-4 Ar	T5
- Aussetzen der Bautätigkeit auf der nördlichen Fahrbahn im Bereich Bau-km 3+000 bis 4+600 während der Hauptrast-zeiten von Vogelarten des Vogelschutzgebietes DE 1530-491 "Östliche Kieler Bucht" von Anfang Oktober bis Ende April - Alternativ kann eine sichteinschränkende Vorrichtung mit einer Höhe von 2,5 m über geplante Straßenhöhe errichtet werden.	

4.1 A/ G	PT1, W1, W2, L1
- Entwicklung von Hochstaudenfluren - Einzelbaumpflanzungen - Knickneuanlage	

4.2 A	B1, B2, W1, W2
- Entwicklung von Hochstaudenflur zwischen B 207 und Umlagerungsfläche - die Torfumlagerungsfläche wird nach der Verfüllung der Sukzession überlassen - Böschungsbepflanzung am südlichen Rand	

5.1 A	PT1, PT2, W1, W2, L1, L2, M1, T1F, T1R, T2F, T1V
- Gehölzpflanzungen (Knick/ Feldgehölze) - Schaffung eines offenen Grabens und Saumstrukturen	

20.1 A/E	B1, B2, L1, PT1, PT2, T1V
- Entwicklung von mesophilem Extensivgrünland - Anlage feuchter Senken - Knickneuanlage - Neuanlage Feldgehölz - auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Brutvögel des Offenlandes und sonstiger Gehölzstrukturen	

21.1 A	B1, B2, L1, PT1, PT2, T1V
- Neuentwicklung Wald - auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Brutvögel sonstiger Gehölzstrukturen	

Zeichenerklärung

Maßnahmen

2.1 G — Maßnahmen-Nr.

- M Minimierungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme
- Ar Artenschutzmaßnahme

- Abgrenzung der Kompensationsfläche
- Entwicklung von Wald
- Entwicklung von Sumpf- bzw Moorwald/ Feuchtwald
- Feldhecke/ Gehölzpflanzung
- Gehölzsukzession
- Knickneuanlage
- Pflanzung von Baumreihen / Einzelbäumen Hochstammpflanzung / Sträucher
- Gehölzpflanzung (Straßenbegleitgrün)
- Mittelstreifenbepflanzung (Straßenbegleitgrün)
- Entwicklung von Hochstaudenflur / Krautsaum
- Entwicklung von feuchter Hochstaudenflur / Uferstauden / Uferrandstreifen / Brackwasserröhricht
- Entwicklung von mesophilem Extensivgrünland
- Bankett (Rasen) mit Mulde (Straßenbegleitgrün)
- AB RRB Absatz- / Regenrückhaltebecken
- naturnahe Neugestaltung von verlegten Fließgewässerabschnitten
- Neuanlage von Kleingewässern / Wasserflächen
- Rückbau vorhandener Wege und Straßen
- Wiederherstellung vorübergehend in Anspruch genommener Flächen / Rückführung Landwirtschaft
- Biotopstrukturen in Ausgleichsflächen ohne ökologische Aufwertung, Pflege entsprechend des Biotoptyps, Schutz angrenzender Flächen während der Bauphase
- Schutz und Erhalt von angrenzenden wertvollen Biotopstrukturen während der Bauphase
- Einzelbaumschutz

geplantes Vorhaben

- geplante Trasse im Einschnitt
- geplante Trasse im Dammlage
- Wildleiteinrichtung
- temporäre Amphibienschutzeinrichtung
- Überwinterungshabitate temporär / dauerhaft
- Amphibienschutzeinrichtung
- Lärmschutzwand
- Irritationsschutzwand / Fledermausüberflughilfe
- Blendschutzeinrichtung
- Schutzwand für Rastvögel
- geplante/ umverlegte Leitungen
- Eingriffsgrenze
- Grenze baubedingter Flächeninanspruchnahme

Sonstiges

- 10 Gewässernummer (Bioplan, 2009)

Zeichenerklärung der Biotop- und Nutzungstypen siehe Anlage 12.1 Blatt 1.1 bis 1.5 (Bedingt durch die Bearbeitung mit GIS sind die Schraffuren nach Norden ausgerichtet)

Kartengrundlage	
Kartengrundlage: DGK5,© LVermA-SH 2006 Koordinatensystem: Gauß-Krüger LS 210, Bessel, PD	Rasterdaten der Deutschen Grundkarte 1:5.000 Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein -432024 -436024 -440026 -442026 -442034 -444036 -446038 -448040 -432026 -436026 -440028 -442028 -444030 -446034 -448036 -450038 -434024 -438024 -440030 -442030 -444032 -446036 -448038 -450040 -434026 -438026 -440032 -442032 -444034

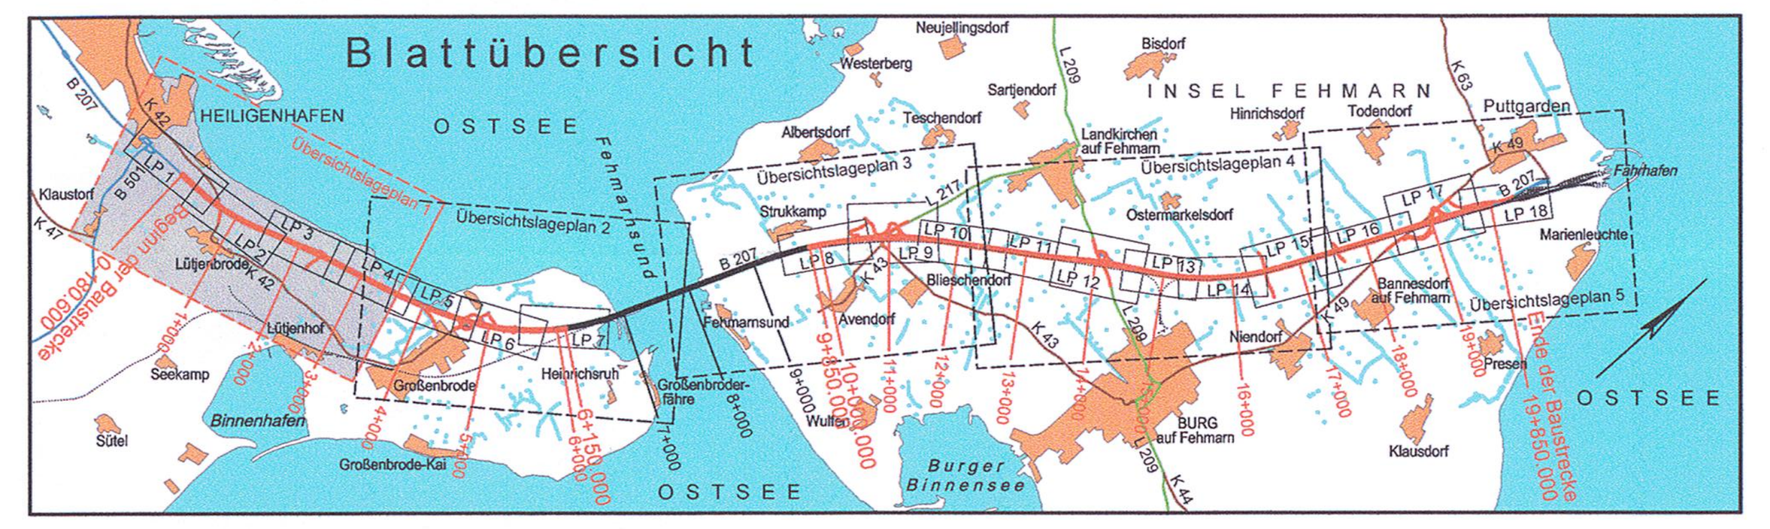

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
4	Ergänzung Maßnahme 0.2 für Bereich Mittelhof (Blatt 3) und neue Maßnahme 0.6-4	08/2014	Pahl / Haas
3	Ergänzung Maßnahme 3.3 (12.2 Blatt 3)	02/2014	Haas
2	Änderungen Maßnahmen (ausführliche Beschreibung siehe12.2 Blatt 2 bis 16, 19)	02/2013	Pahl / Haas
1	Anpassung Planung an geänderte technische Planung	02/2013	Pahl / Haas

TRÜPER GONDESEN PARTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
AN DER UNTERTRAVE 17, 23552 LÜBECK
FON : 0451/79882-0 , FAX : 0451/79882-22

TGP

TGP_1226	Datum	Name
bearbeitet	08/2011	Steinlein/ Haas
gezeichnet	08/2011	Pahl
geprüft	08/2011	Hermanns

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin
Telefon: 0385/39960 Telefax: 0385/3977127
Geschäftsführer

F:\ZEICHNER\STRATIS\286335_PF_11_BER_B207

	Datum	Zeichen
Bearb.:	08/11	Deuringer
Gez.:	08/11	Pasch
Gepr.:	08/11	Krabbe

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig - Holstein

Straße : B 207
Nächster Ort: Fehmarn

von Abschnitt 580 Betriebsstation 0.475 bis
Abschnitt 590 Betriebsstation 1.372
von Abschnitt 590 Betriebsstation 5.070 bis
Abschnitt 610 Betriebsstation 5.769

Unterlage Nr. 12.2
Blatt Nr. 22.1
Bau-km

Vierstreifiger Ausbau der B 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden

Bau-km: 0-180.600 bis 19+850.000

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	08/11	Heß

Landschaftspflegerische Maßnahmen Übersicht

Maßstab 1 : 5.000

Aufgestellt:
Landesbetrieb Straßenbau und Ver[illegible]
Schleswig-Holstein
Niederlassung Lübeck

gez. Lüth

Lübeck, den 26.08.2011

Festgestellt mit Planfeststellungsbeschluss vom 31.08.2015, Az. 408 - 553.32 - B 207-176.
Dieser festgestellte Plan ist Bestandteil des vorbezeichneten Beschlusses. Für die Angabe der Rechtsgrundlagen und deren Fundstellen wird auf den Planfeststellungsbeschluss verwiesen.
Kiel, den 31.08.2015
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein - Planfeststellungsbehörde -
(Thiel)

Planfeststellungsunterlage

vom 26.08.2011

Deckblatt

Anlage: 12.2
Blatt: 22.1
